
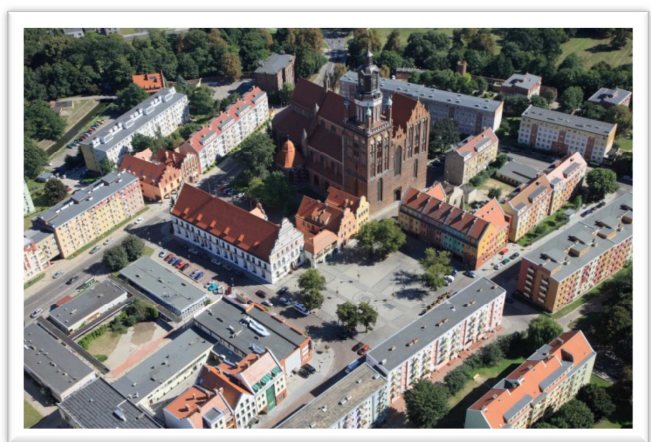
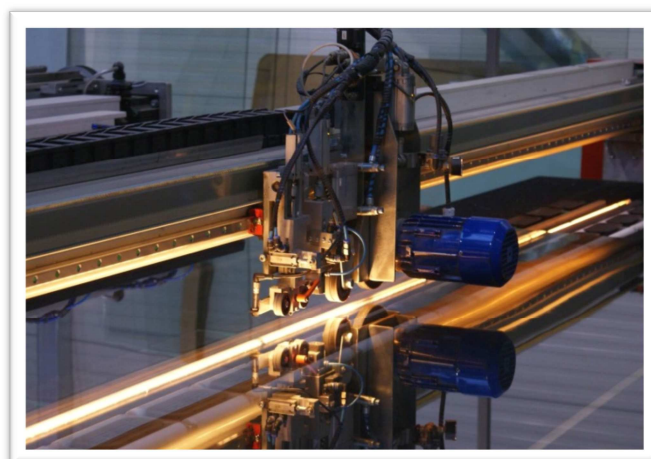


Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2015 r.

z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013

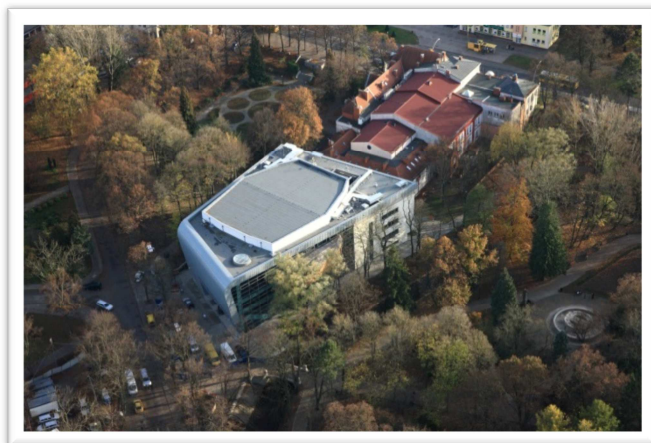

Szczecin 2015

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE WSTĘPNE	3
II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM	3
1. Realizacja i analiza postępów	3
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego	3
1.2 Informacje finansowe	3
1.3 Analiza jakościowa	4
1.3.1 Nabory wniosków w ramach RPO WZ 2007-2013 w I półroczu 2015 r.	4
1.3.2 Grupy docelowe	5
1.3.3 Postęp wdrażania RPO WZ 2007 – 2013	6
1.3.3.1 Postęp wdrażania priorytetu 1 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	11
1.3.3.2 Postęp wdrażania priorytetu 2 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	17
1.3.3.3 Postęp wdrażania priorytetu 3 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	22
1.3.3.4 Postęp wdrażania priorytetu 4 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	27
1.3.3.5 Postęp wdrażania priorytetu 5 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	32
1.3.3.6 Postęp wdrażania priorytetu 6 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	33
1.3.3.7 Postęp wdrażania priorytetu 7 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	42
1.3.4 Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE	46
1.3.5 Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA	49
1.3.6 Zmiany wytycznych oraz procedur w ramach programu	53
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych	54
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym	56
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu	56
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych	57
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	58
5. Informacja o realizacji dużych projektów	58
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej	58
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji	61
8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej	62
SPIS TABEL	63
SPIS WYKRESÓW	64
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	65

I. INFORMACJE WSTĘPNE

PROGRAM OPERACYJNY	Cel:	<i>Konwergencja</i>
	Kwalifikowany obszar:	<i>Polska – województwo zachodniopomorskie</i>
	Okres programowania:	<i>2007-2013</i>
	Numer programu (CCI):	<i>2007PL161PO016</i>
	Nazwa programu:	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013</i>
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania:	<i>I/2015/RPO/32</i>
	Okres sprawozdawczy:	<i>01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.</i>

II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Informację na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego przedstawiono w *Załączniku nr 1* do niniejszego sprawozdania.

W przypadku gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13), a w przypadku różnic w wartościach wskaźniki w załączniku zostały opatrzone komentarzem wyjaśniającym. Pozostałe osiągnięte wartości wskaźników podano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym.

1.2 Informacje finansowe

Informacje na temat postępu finansowego Programu przedstawiają Tabele finansowe, które stanowią *Załącznik nr 2* do przedmiotowego sprawozdania.

W sprawozdaniu przyjęto alokacje w PLN ustalone zgodnie z pkt. 4.7 Wytocznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości NSRO, który stanowi, że w przypadku prezentowania określonych wartości finansowych w odniesieniu do alokacji środków UE należy wykorzystywać alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla ostatniego miesiąca okresu, za jakie są prezentowane dane.

W przypadku przeliczania w sprawozdaniu, innych niż alokacja wartości, zastosowano kurs1 EUR = 4,1289 PLN.

Instytucja Zarządzająca w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków w ramach Programu skorzystała z możliwości zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” o którym mowa w art. 77 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 pozwalającego na przeniesienia wolnych środków

między Ośmi Priorytetowymi Programu. Łączna kwota wkładu unijnego przekraczającego kwotę alokacji środków unijnych przewidzianej dla danej osi w dokumentach programowych nie może przekroczyć 10% wspomnianej alokacji. Alokacje (w PLN) przeznaczone na poszczególne Osie Priorytetowe przedstawia poniżej tabela:

Tabela 1 Alokacja RPO WZ w podziale na Osie Priorytetowe w PLN

Oś priorytetowa	Alokacja EFRR (w EUR) (bez zastosowania mechanizmu elastyczności)	zmiana	Alokacja EFRR (w EUR) (uwzględniająca przesunięcia wynikające z zastosowania mechanizmu elastyczności)
1	1 042 474 623,73	↑	1 080 137 111,76
2	931 661 569,10	↓	927 768 858,70
3	174 464 798,53	↓	134 879 646,92
4	254 377 044,45	↓	231 652 227,09
5	309 565 885,79	↑	318 493 670,00
6	483 204 643,75	↓	478 671 247,80
7	241 204 027,00	↑	265 349 830,07
8	139 074 160,92	-	139 074 160,92
Razem	3 576 026 753,25	-	3 576 026 753,25

Źródło: Arkusz MF – Alokacja na lata 2007-2013 (ogółem - 05.06.2015 r.)

1.3 Analiza jakościowa

1.3.1 Nabory wniosków w ramach RPO WZ 2007-2013 w I półroczu 2015 r.

Od uruchomienia programu w ramach RPO WZ 2007-2013 zostało przeprowadzonych 70 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w procedurze konkursowej. Łącznie, do końca I półroczu 2015 r. alokacja na ogłoszone nabory wyniosła **1 655 834 635,98 PLN**, co stanowi **46,30%** środków Programu.

Tabela 2 Ogłoszone nabory w trybie konkursowym w podziale na osie priorytetowe¹

Oś priorytetowa	Nabory w I półroczu 2015 r.		Nabory od uruchomienia Programu	
	Liczba	Wartość alokacji EFRR (PLN)	Liczba	Wartość alokacji EFRR (PLN)
Oś 1 - Gospodarka - Innowacje - Technologie	0	-	19	454 023 900,00
Oś 2 - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej	0	-	7	254 498 948,12
Oś 3 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0	-	3	166 000 000,00
Oś 4 - Infrastruktura ochrony środowiska	0	-	12	327 458 070,00
Oś 5 - Turystyka, kultura i rewitalizacja	0	-	9	133 796 502,00
Oś 6 - Rozwój funkcji metropolitalnych	0	-	13	239 557 726,00
Oś 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	0	-	7	80 499 489,86

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.rpo.wzp.pl

Informacje na temat Projektów indywidualnych oraz naborów w trybie systemowym znajdują się w punkcie III Postęp wdrażania RPO WZ 2007 - 2013 niniejszego sprawozdania.


¹ Tabelę sporządzono wg dat ogłoszenia naboru w ramach poszczególnych osi priorytetowych. Nie uwzględnia Inicjatyw Wspólnotowych.

1.3.2 Grupy docelowe

Rozkład projektów i grupy docelowe

Od uruchomienia Programu podpisano **1 730** umów o dofinansowanie, których ogólna wartość dofinansowania z EFRR wynosi **3 502 186 158,25 PLN**. Procentowy udział zawartych umów w ramach poszczególnych osi od uruchomienia Programu przedstawia poniższy wykres.


Wykres 1 Procentowy podział podpisanych umów w ramach poszczególnych osi RPO WZ według wartości dofinansowania z EFRR od uruchomienia Programu

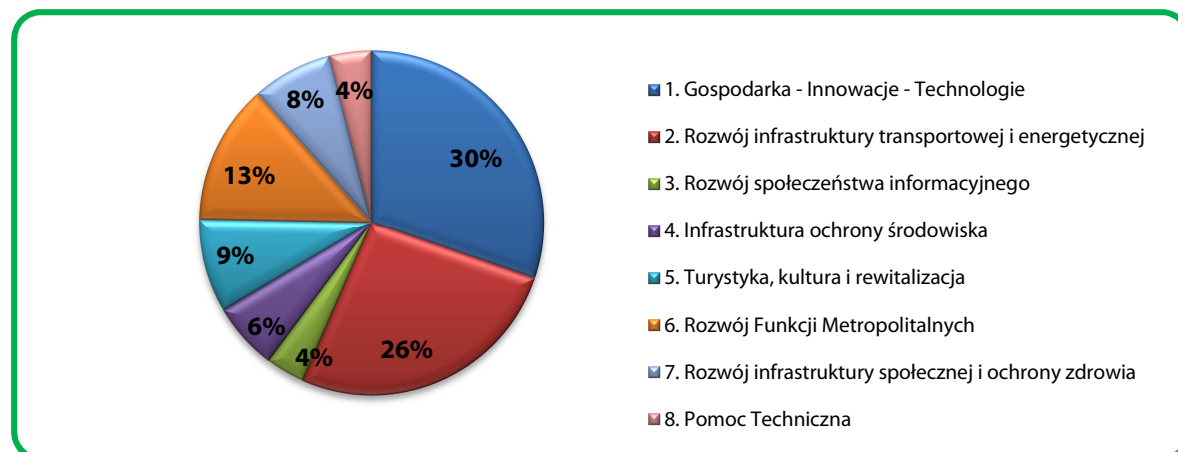

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

W I półroczu 2015 roku podpisano **38** umów o dofinansowanie, których ogólna wartość dofinansowania z EFRR wynosi **49 618 948,21 PLN**. Liczba podpisanych umów w ramach poszczególnych osi priorytetowych przedstawia się następująco: w ramach 1. i 2. osi podpisano **5** umów, w ramach osi 3. podpisano **2** umowy, w ramach osi 4. zostało podpisanych **12** umów, w ramach osi 5. podpisano **8** umów, natomiast w ramach osi 6. w okresie sprawozdawczym podpisano **6** umów. W ramach osi 7 nie podpisano umów o dofinansowanie. Podział na poszczególne osie priorytetowe według wartości dofinansowania przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2 Wartość dofinansowania umów podpisanych w ramach RPO WZ w I półroczu 2015 r. w podziale na poszczególne osie priorytetowe (środki EFRR w PLN)

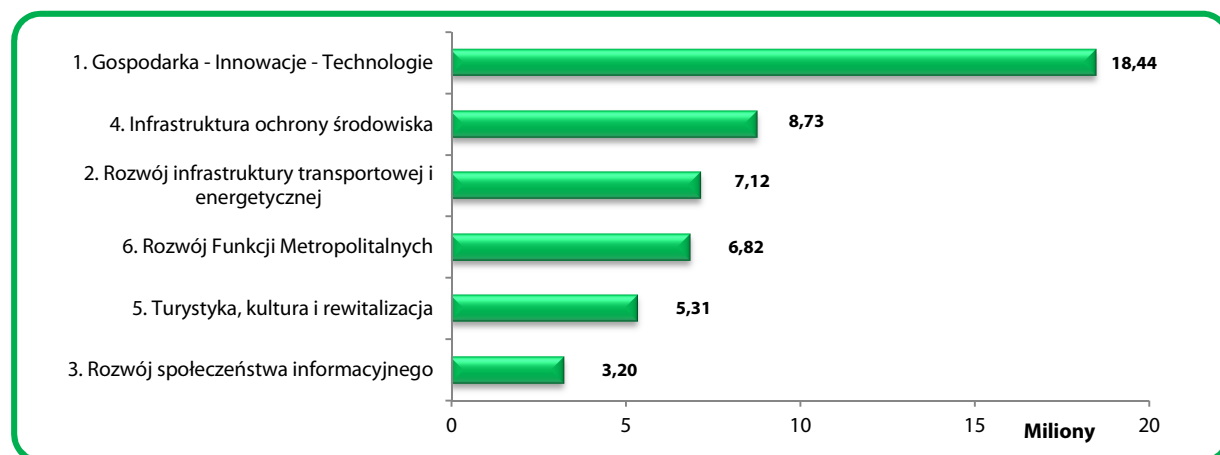

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

W I półroczu 2015 r. nie zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie, natomiast nabory ogłoszone w ubiegłych latach zostały rozstrzygnięte do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego.

1.3.3 Postęp wdrażania RPO WZ 2007 – 2013



POSTĘP WDRAŻANIA RPO WZ 2007-2013

w I półroczu 2015 r.

- **10** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o łącznej wartości dofinansowania równej **32 904 959,47 PLN**, co stanowi **0,85 %** alokacji przeznaczonej na Program (EFRR + BP),
- **38** - liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **49 618 948,21 PLN**, co stanowi **1,39%** alokacji EFRR przeznaczonej na Program,
- **166 624 134,14 PLN** – kwota EFRR wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **4,66%** alokacji EFRR przeznaczonej na Program,*
- **159 672 231,84 PLN**- płatności EFRR przekazane na rzecz Beneficjentów, co stanowi **4,47%** alokacji EFRR przeznaczonej na Program.

* Wartość nie jest zgodna z raportem udostępnionym w KSI SIMIK (raport nie uwzględnia kwot wycofanych). W związku z powyższym, IZ RPO WZ wylicza wartość wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym odejmując wartość od uruchomienia programu w roku 2014 od wartości od uruchomienia w I półroczu 2015. Raporty od uruchomienia programu uwzględniają kwoty wycofane.

Tabela 3 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 1-8

Postęp finansowy od uruchomienia programu dla osi -1-8									
Oś	Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
	Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR		Wartość EFRR	
1	2199	1 915 142 740,53	1066	1 059 638 549,64	98,10	909 978 061,16	84,25	894 946 240,69	82,85
2	183	1 214 552 412,26	139	921 155 905,98	99,29	824 181 592,03	88,83	814 994 370,85	87,84
3	46	305 459 909,85	33	127 546 262,53	94,56	82 547 848,87	61,20	76 436 534,25	56,67
4	220	506 590 831,31	155	219 833 831,18	94,90	140 489 211,51	60,65	136 492 885,63	58,92
5	205	472 494 695,74	124	309 269 855,97	97,10	257 482 378,63	80,84	246 060 623,76	77,26
6	145	606 515 076,92	117	460 499 457,89	96,20	321 941 202,04	67,26	305 726 579,36	63,87
7	89	318 945 831,46	67	265 353 844,22	100,00	243 219 839,19	91,66	235 044 386,88	88,58
8	0	-	29	138 888 450,84	99,87	115 143 230,99	82,79	111 057 412,57	79,85
Σ	3087	5 339 701 498,07	1730	3 502 186 158,25	97,94	2 894 983 364,42	80,96	2 820 759 033,99	78,88


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Analizując poziom kontraktacji poszczególnych osi priorytetowych można zauważyć, że wysoki jej poziom został osiągnięty w osiach 1, 2, 5 i 7. Natomiast najniższa kontraktacja występuje w osiach 3 i 4.

Wnioski aplikacyjne

Do 30 czerwca 2015 r. złożono **3 087** wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania **5 339 701 498,07 PLN** (EFRR + BP), co stanowi **138,68 %** alokacji przeznaczonej na realizację Programu (EFRR + BP). Podział na poszczególne osie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3 Ujęcie procentowe wartości wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR + BP; od uruchomienia Programu)

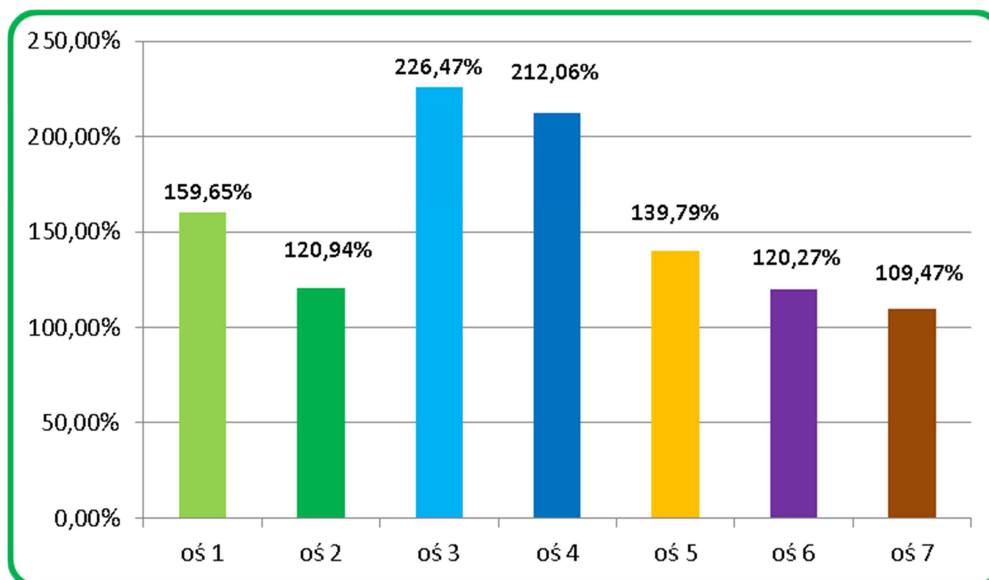


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Umowy/decyzje o dofinansowaniu

Do 30 czerwca 2015 r. podpisano **1 730** umów/decyzji o dofinansowanie na łączną wartość **3 502 186 158,25 PLN** ze środków EFRR, co stanowi **97,94 %** alokacji EFRR przeznaczonej na realizację Programu. Podział na poszczególne osie przedstawia poniższy wykres.


Wykres 4 Ujęcie procentowe wartości podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu)

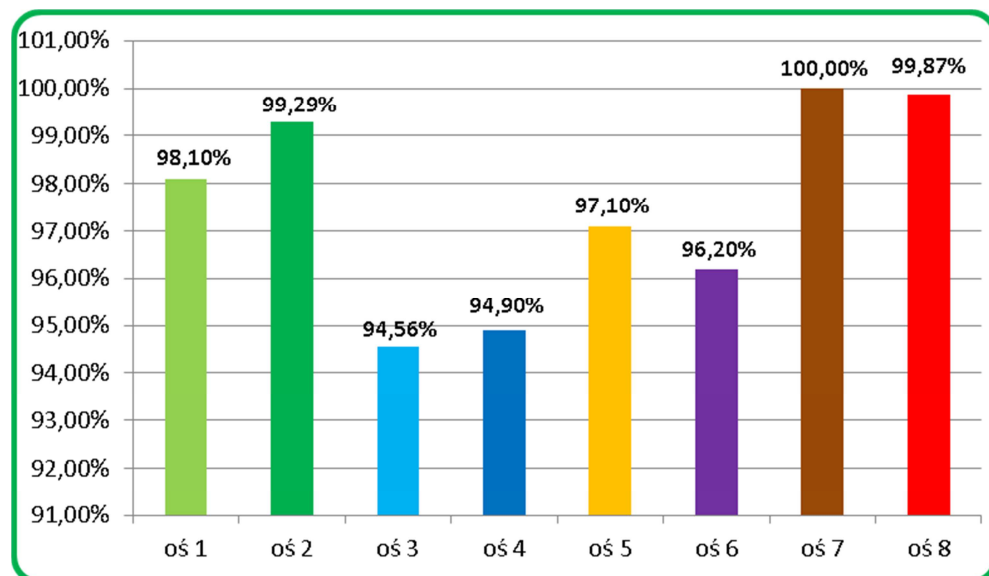

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Poniższy wykres przedstawia postęp wartościowy zakontraktowanych środków w Programie, w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym.

Wykres 5 Wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie – przyrost od poprzedniego okresu sprawozdawczego w porównaniu z alokacją przeznaczoną na Program (dofinansowanie z EFRR w PLN)

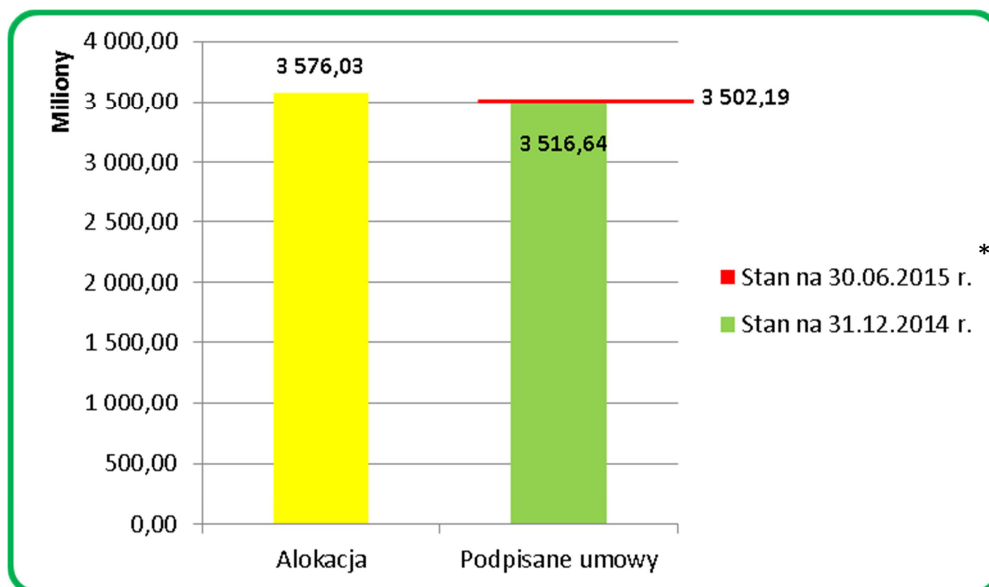


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK 2007-2013

*Wartość dofinansowania podpisanych umów do 30.06.2015 r. jest niższa niż wartość dofinansowania podpisanych umów w poprzednim okresie sprawozdawczym czyli do 31.12.2014 r. W związku z tym kolor czerwony nie jest widoczny na wykresie. Różnica ta jest spowodowana rozwiązywaniem umów w pierwszym półroczu 2015 r. Wartość dofinansowania dla podpisanych umów od uruchomienia do końca okresu sprawozdawczego, którego dotyczy powyższe sprawozdanie została zaznaczona na wykresie przy pomocy czerwonej kreski

Wnioski o płatność

Do 30 czerwca 2015 r. beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **2 894 983 364,42 PLN** dofinansowania EFRR co stanowi **80,96 %** alokacji EFRR przeznaczonej na realizację Programu. Podział na poszczególne osie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 6 Ujęcie procentowe wartości wykazanych przez beneficjentów wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu)

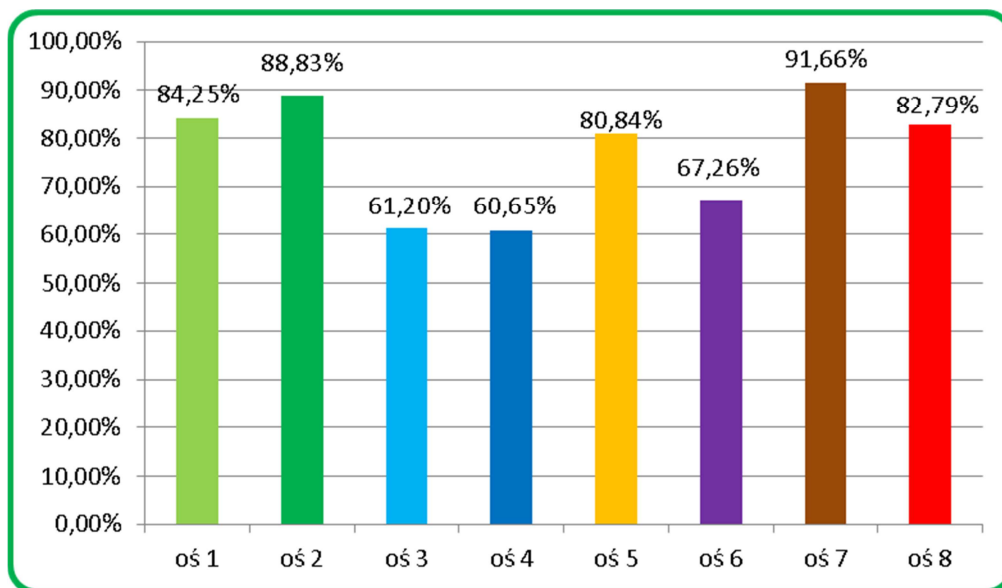


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK 2007-2013

Certyfikacja

Wydatki wykazane przez IŻ RPO WZ w deklaracjach do IC do 30 czerwca 2015 r. wyniosły **2 820 759 033,99 PLN** z EFRR, co stanowi **78,88 %** alokacji EFRR przeznaczonej na realizację Programu. Podział na poszczególne osie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 7 Ujęcie procentowe wartości wydatków wykazanych przez IŻ RPO WZ w deklaracjach do IC w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu)

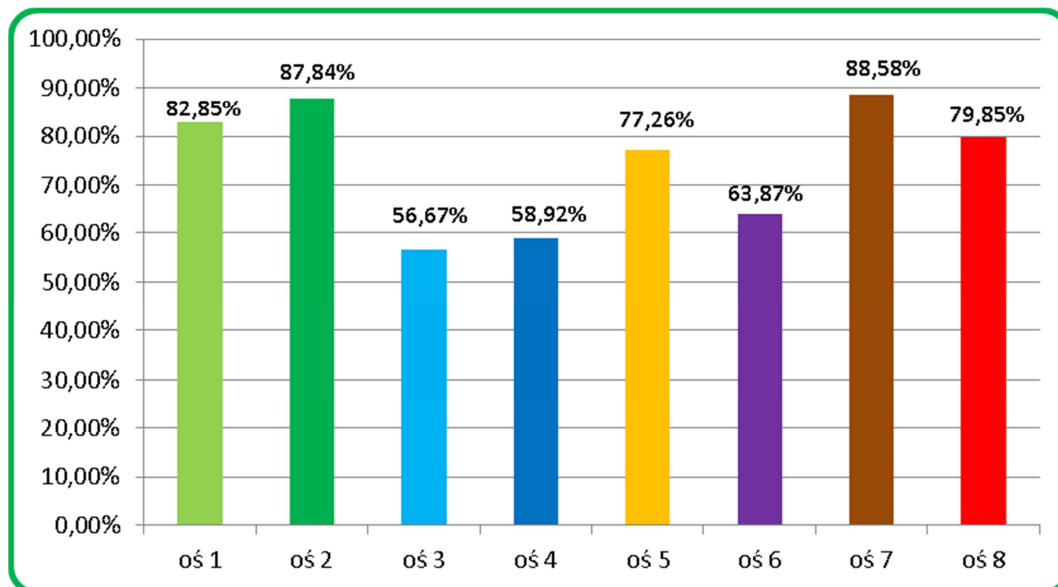


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK 2007-2013

Płatności²

Płatności EFRR przekazane na rzecz beneficjentów od uruchomienia programu na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły **2 949 253 962,35 PLN** z EFRR, co stanowi **82,47 %** alokacji EFRR przeznaczonej na realizację Programu. Podział na poszczególne osie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 8 Ujęcie procentowe wartości płatności EFRR przekazywanej na rzecz beneficjentów w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu)

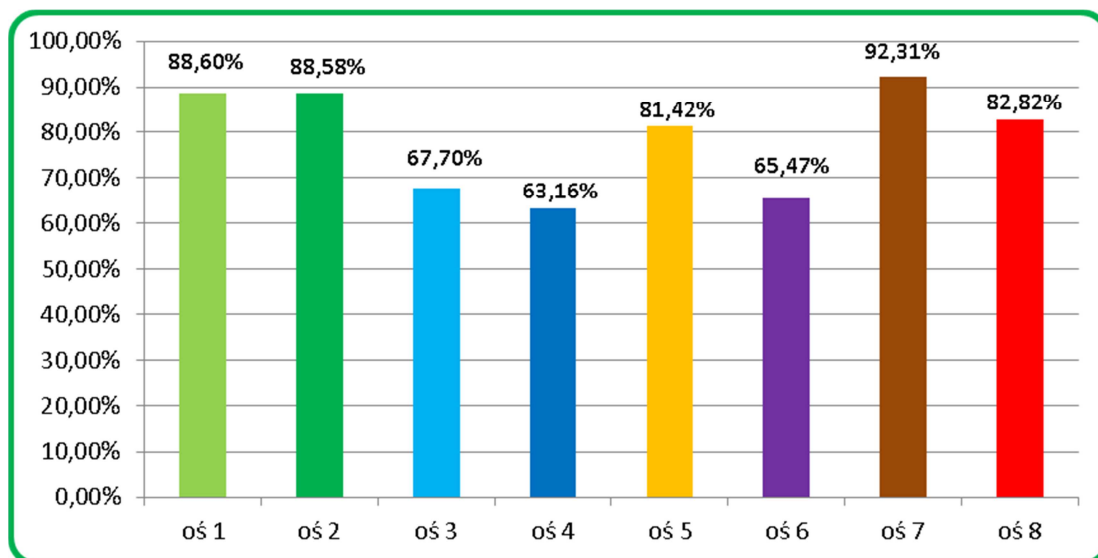


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK 2007-2013

² Dane odnoszą się do wypłaconych środków w postaci refundacji oraz zaliczek. Uwzględniają zwrócone przez beneficjentów kwoty zaliczek do końca okresu sprawozdawczego.

Projekty zakończone

Do 30 czerwca 2015 r. zostało zakończonych **1 334** projektów, ogólna wartość dofinansowania z EFRR wynosi **1 757 097 627,64 PLN**, co stanowi **49 %** alokacji EFRR przeznaczonej na realizacji Programu. Podział na poszczególne osie przedstawia wykres.

Wykres 9 Ujęcie procentowe wartości zakończonych projektów w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu)

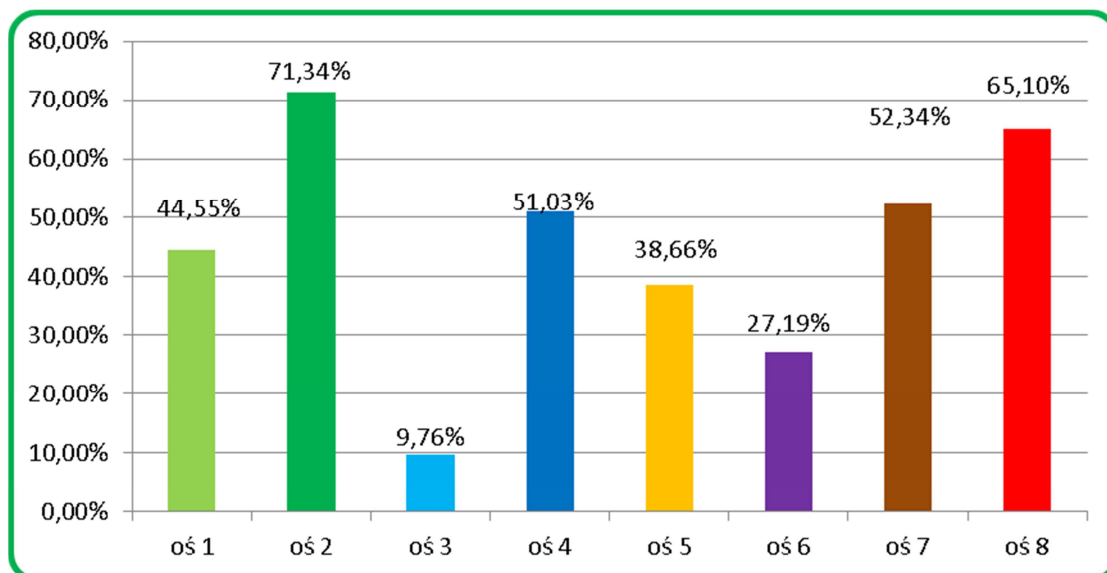

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI/SIMIK 2007-2013

1.3.3.1 Postęp wdrażania priorytetu 1 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



1 OŚ PRIORYTETOWA GOSPODARKA - INNOWACJE - TECHNOLOGIE

I półrocze 2015 r.

- **3** – liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **17 160 638,13 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **1,43%** alokacji przeznaczonej na Oś 1
- **5** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **18 442 950,34 PLN**, co stanowi **1,71 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 1
- **58 782 978,88 PLN** - kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **5,44 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 1*
- **61 308 973,93 PLN** płatności EFRR przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **5,68%** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 1

*Wartość nie jest zgodna z raportem udostępnionym w KSI SIMIK (raport nie uwzględnia kwot wycofanych). W związku z powyższym IZ RPO WZ wylicza wartość wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym odejmując *wartość od uruchomienia programu w roku 2014 od wartości od uruchomienia w I półroczu 2015*. Raporty od uruchomienia programu uwzględniają kwoty wycofane.

Kwota przeznaczona na realizację 1 osi priorytetowej wynosi **1 080 137 111,76 PLN** (z EFRR) co stanowi **30 %** alokacji przeznaczonej na Program.


Postęp finansowy

Tabela 4 Postęp finansowy dla osi 1 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)

Postęp finansowy od uruchomienia programu dla osi 1									
Oś	Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu		%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC
	Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		wartość EFRR			Wartość EFRR
1	2199	1 915 142 740,53	1066	1 059 638 549,64	98,10	909 978 061,16	84,25	894 946 240,69	82,85

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI/SIMIK 2007-2013

Wykres 10 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 1 priorytetowej od początku realizacji Programu (mln PLN)

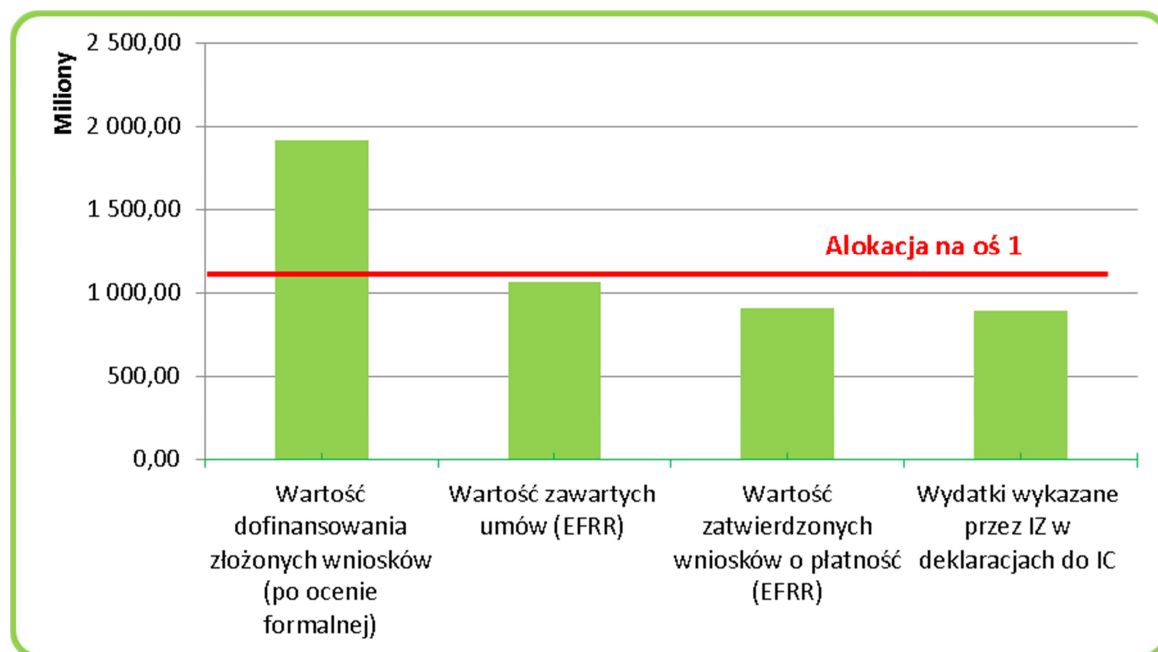

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2015 r. nie ogłoszono konkursów w ramach osi 1. W I półroczu 2015 r. nie ogłoszono również naborów w trybie systemowym i indywidualnym.

Nabory planowane:

W kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Od początku realizacji Programu w ramach 1. Osi Priorytetowej Gospodarka – Innowacje – Technologie zostało zakończonych 927 projektów (w tym 61 w I półroczu 2015 r.), co skutkuje realizacją niektórych założonych wskaźników. Poza tym IZ RPO WZ oszacowała wartości wskaźników do roku 2015 na podstawie podpisanych do końca okresu sprawozdawczego umów o dofinansowanie. Efekty realizacji I osi priorytetowej mierzone są za pomocą 7 wskaźników produktu i 5 rezultatu, w szczególności są to następujące **wskaźniki produktu**:

- *liczba projektów z zakresu B+RT* (poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie dotyczy tylko wybranych projektów w ramach poddziałania, tj. ściśle powiązanych z rozwojem sfery badawczo – rozwojowej) oraz poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R), w tym MSP (poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie),
- *liczba projektów ukierunkowanych na współpracę pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi* (poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie (bez projektów z zakresu B&RT) oraz poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu),
- *liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla sektora MSP* (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje),
- *liczba wspartych przedsiębiorstw* (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje):
 - w tym: mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw;

- w tym przez pierwsze dwa lata po rozpoczęciu działalności,
- liczba projektów z zakresu wsparcia na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje),
- liczba projektów promujących atrakcyjność regionu/wspierających międzynarodową aktywność przedsiębiorstw (poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym),
- liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych (poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP – Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE);

oraz **wskaźniki rezultatu:**

- liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&RT (poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie (dotyczy tylko wybranych projektów w ramach podziałania, tj. ściśle powiązanych z rozwojem sfery badawczo – rozwojowej) oraz poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R),
- liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw (w tym kobiety, mężczyźni) (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, średnie przedsiębiorstwa (za wyjątkiem tych miejsc pracy w ramach podziałania 1.1.3, które zostały ujęte we wskaźniku *liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&RT*)),
- liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach wiejskich (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje),
- dodatkowe inwestycje, wykreowane dzięki wsparciu (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje),
- liczba udzielonych pożyczek i poręczeń (poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP – Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE).

Wartości zrealizowane i szacowane powyższych wskaźników przedstawia Załącznik I do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2015 r. w ramach 1 osi priorytetowej zostaną zrealizowane wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu. Jednakże, w ramach wskaźnika *Liczba projektów z zakresu wsparcia na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska* oraz podwskaźnika *Liczba wspartych przedsiębiorstw przez pierwsze dwa lata po rozpoczęciu działalności* osiągnięcie wartości docelowej szacuje się, że będzie niższe niż zakładają wartości docelowe określone w Programie. Wartości wskaźników nie będą jednak stanowiły mniej niż 75% wartości docelowych. Do końca czerwca 2015 r. wspartych zostało 80 przedsiębiorstw działających na rynku krócej niż dwa lata (88,89% wartości docelowej). Ze względu na rozwiązane umowy z beneficjentami, w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, szacowana wartość wskaźnika zmniejszyła się o 3 szt. Jednakże, zauważyć należy, że aż 63 projekty do końca czerwca 2015 r. zostały już rzeczowo i finansowo zakończone. Ze względu na fakt, iż wskaźnik ten ma charakter kontekstowy, a w ramach RPO WZ nie wyodrębniono poddziałania dla przedsiębiorstw działających na rynku krócej niż dwa lata, firmy te nie były też priorytetowo traktowane w organizowanych naborach dla działania 1.1, gdzie premiowane były projekty przedsiębiorstw sektora MSP związane z wprowadzeniem innowacji produktowej lub procesowej oraz tworzeniem nowych miejsc pracy. Jak wykazało badanie ewaluacyjne³ odsetek firm młodych (działających na rynku krócej niż 4 lata) korzystających ze wsparcia dotacyjnego w ramach działania 1.1 wyniósł nieco ponad 11%, odbiorcami wsparcia były natomiast głównie firmy działające powyżej 4 lat, a ponad połowa – powyżej 12 lat. Realizacja inwestycji zwiększających konkurencyjność i innowacyjność w skali regionalnej wymaga od przedsiębiorstwa odpowiedniego potencjału i ustabilizowanej pozycji na rynku, stąd priorytetowe traktowanie w naborach firm młodych mogłoby nie sprzyjać optymalizacji działań na rzecz realizacji celu szczegółowego RPO WZ *Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania*. Z drugiej zaś strony nowopowstałe firmy mają często nieco inne potrzeby, realizują też z reguły mniejsze, krótsze i mniej złożone projekty niż firmy o ugruntowanej

³ Raport końcowy. Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020, PSDB, Warszawa, marzec 2013. Str. 29-37

pozycji na rynku, w tym celu mogą korzystać z adresowanych do nich źródeł finansowania w ramach innych programów operacyjnych (np. POKL – działanie 6.2, POIG – działania 3.1 i 8.1; PROW – działanie 312), czy też w ramach Inicjatywy JEREMIE RPO WZ (poddziałanie 1.3.4).

Od uruchomienia Programu zrealizowano 29 projektów ukierunkowanych na współpracę pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi: 25 zrealizowanych przez przedsiębiorców w ramach poddziałania 1.1.3 (w tym 6 w I półroczu 2015 r.) oraz 4 przez instytucję otoczenia biznesu w ramach poddziałania 1.2.1 (w I półroczu 2015 r. – 0 szt). IZ RPO WZ szacuje, że do 2015 r. wartość ta wzrosła do 44 (37 to projekty przedsiębiorców – poddziałanie 1.1.3, a 7 to projekty instytucji otoczenia biznesu – poddziałanie 1.2.1), w efekcie czego wskaźnik zostanie zrealizowany w prawie 1100%. Należy dodać, iż szacowana wartość w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego zmniejszyła się 21 szt. Jest to wynikiem przeprowadzonej przez IZ RPO WZ I półroczu analizy projektów po kątem możliwości agregowania projektów jako projektów BRT. W wyniku przeprowadzonej analizy 20 projektów zakwalifikowano jako projekty BRT, dlatego zostały one odjęte z przedmiotowego wskaźnika na rzecz zasilenia wskaźnika Liczba projektów z zakresu BRT. Ponadto, w ramach jednego z projektów umowa o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym została rozwiązana. Znaczne przekroczenie wartości docelowej (zakładano 4 projekty) wynika z faktu, iż ze względu na zagrożenie realizacji wskaźnika IZ RPO WZ począwszy od 2010 r. zmodyfikowała w dokumentacjach konkursowych dla działania 1.1.3 zasady punktowania w kryterium „Innowacyjny charakter projektu” premiuując współpracę wnioskodawcy z sektorem B+RT, a wprowadzona modyfikacja okazała się na tyle skuteczną zachętą dla przedsiębiorców, że przedmiotowy wskaźnik znacznie przekroczył ustalone wartości docelowe. Poza tym do wskaźnika agregowane są wartości z poddziałania skierowanego do instytucji otoczenia biznesu wdrażających proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (1.2.1).

Jak wynika z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w 2013⁴ ogólny wpływ dotacji na poziom innowacyjności beneficjentów był widoczny – dotacja podtrzymała aktywność innowacyjną beneficjentów i wpłynęła na wzrost ich poziomu innowacyjnego. Również osiągnięcia beneficjentów w zakresie wytworzenia oryginalnej wiedzy technicznej należy uznać za istotne. Jednak wpływ dotacji z RPO WZ na potencjał innowacyjny beneficjentów w zakresie prowadzenia własnych prac B+R, współpracy z jednostkami naukowymi oraz współpracy z instytucjami otoczenia biznesu jest wciąż oceniany jako niewystarczający i wymagający dalszej stymulacji. Badania przeprowadzone na próbie przedsiębiorców beneficjentów wykazały, że odsetek przedsiębiorstw prowadzących własne prace B+R wynosił ok. 14%, współpracę z jednostkami naukowymi deklarowało ok. 32% podmiotów, a nieco ponad 6% było zaangażowanych we wspólną realizację przedsięwzięć B+R. Niewielkie były również doświadczenia badanych przedsiębiorstw we współpracy z IOB w zakresie działalności innowacyjnej. W grupie beneficjentów najmniejsze doświadczenia we współpracy miały mikroprzedsiębiorstwa realizujące projekty z poddziałania 1.1.1, największe – podmioty, które uzyskały dofinansowanie z działania poddziałania 1.1.3. Jest to zgodne z oczekiwaniami, ponieważ działanie 1.1.3 zakładało wsparcie najbardziej nowatorskich projektów, które wymagały większego potencjału innowacyjnego.

Stąd IZ RPO WZ za konieczne uznała dalsze wspieranie działań sprzyjających budowie systemu wsparcia dla MSP w zakresie innowacyjnych rozwiązań (tworzenie zachęt do prowadzenia własnej działalności B+R przez przedsiębiorstwa oraz ułatwienie dostępu do środków publicznych na działalność B+R prowadzoną przez przedsiębiorców we współpracy z jednostkami naukowymi). Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, część środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego w wysokości 11 mln EUR przeznaczono na wsparcie przedsiębiorstw z sektora MSP (*kategoria interwencji 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)*), ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji zwiększając o 10,51 mln EUR pulę przeznaczoną na kategorię 07. Pozwoliło to na ogłoszenie naboru w trybie konkursowym RPOWZ/1.1.3/2012/1 dla poddziałania 1.1.3. W wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu zostało podpisanych 39 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 14

⁴ Tamże, str. 58-76

914 050,16 EUR. Ponadto, w poprzednim okresie sprawozdawczym, uruchomiono listę rezerwową w ramach ww. konkursu. Dzięki środkom pochodzącym z zastosowania m.in. mechanizmu elastyczności, zakontraktowano 15 936 579,41 mln EUR w ramach 59 projektów, co również miało wpływ na wzrost wskaźnika programowego pn.: Liczba projektów ukierunkowanych na współpracę pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi.

Do końca czerwca 2015 r. zrealizowano 17 projektów z zakresu B+RT (poddziałanie 1.1.3 – 13 szt., poddziałanie 1.2.2 – 4 szt.). IZ RPO WZ szacuje, że do końca 2015 r. zostaną zrealizowanych 40 projektów B+RT (szacowana realizacja wskaźnika na poziomie 571,43,29%), w tym 12 projektów MSP. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego znacząco wzrosła wartość szacowana wskaźnika - z 22 do 40 szt. Wśród projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.3, poprzez indywidualną ich analizę, IZ RPO WZ wyselekcjonowała te, których realizacja jest ściśle powiązana z rozwojem strefy badawczo rozwojowej w sektorze MSP. Projekty wybierane były spośród takich, które podczas oceny merytorycznej otrzymały maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium dotyczącego współpracy z sektorem B+RT. Wartości te przełożą się na wskaźnik *liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+RT* – wg szacunków do 2015 r. zostanie utworzonych 26,75 miejsc pracy, (poddziałanie 1.2.2 – 191,01% w stosunku do wartości docelowej określonej dla roku 2015). Dodatkowo w I półroczu 2015 r. IZ RPO WZ przeprowadziła analizę ww. projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.3 pod kątem realizacji wskaźnika zatrudnienia. Zapytano beneficjentów czy miejsca pracy deklarowane przez nich we wnioskach o dofinansowanie mogą być agregowane do wskaźnika programowego „Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&RT. Na poziomie osi priorytetowej zagregowano 10 miejsc pracy (etaty badawcze), które beneficjenci wskazali w ramach realizowanych przez siebie projektów. W efekcie wsparcia projektów w zakresie B+RT powstanie 36 etatów badawczych, a do końca I półrocza 2015 r. powstało ich 12.

Usługi realizowane przez instytucje otoczenia biznesu mają ostatecznie wpływać na wzrost wiedzy i kompetencji przedsiębiorstw. Jednakże sposób monitoringu projektów (poddziałanie 1.2.1) nie daje możliwości weryfikacji efektów u przedsiębiorcy. Podobnie w przypadku inwestycji w wyposażenie B+R i tworzenie specjalistycznych laboratoriów, które powinno służyć innowacyjności przedsiębiorstw (poddziałanie 1.2.2). Trudno oszacować jest, w jakim stopniu realizowane projekty przyczynią się do wzrostu innowacyjności w firmach będących ostatecznymi odbiorcami działań wspartych jednostek badawczo-rozwojowych. Dlatego też ogłoszony w ramach poddziałania 1.2.2 konkurs nr RPOWZ/1.2.2/2012/1 został skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstw. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a złożone wnioski dotyczyły zakupu wyposażenia badawczo-rozwojowego i stworzenia działów B+R przez przedsiębiorstwa w bardzo zróżnicowanych dziedzinach (przemysł chemiczny, przemysł tworzyw sztucznych, łączność, przetwarzanie danych, medycyna, elektronika, ICT), co więcej projekty te są dużo bardziej rozproszone po terenie województwa niż przedsięwzięcia zrealizowane przez uczelnie. W ramach ww. konkursu podpisanych zostało 7 umów o dofinansowanie, w ramach których zakupionych zostanie ponad 160 szt. aparatury naukowo badawczej oraz utworzone zostaną 3 laboratoria.

Ponadto w I półroczu 2015 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Akademią Sztuki w Szczecinie. W wyniku zrealizowanych działań powstaną technicznie i organizacyjnie wydzielone pomieszczenia laboratoryjne (15 laboratoriów) wyposażone w nowoczesny sprzęt, urządzenia i meble niezbędne do prowadzenia badań oraz prac badawczo-rozwojowych (ponad 260 szt. zakupionej aparatury naukowo badawczej). Prowadzona będzie niezależna działalność badawczo-rozwojowa obejmująca badania podstawowe (gdzie w efekcie powstaną publikacje i know-how) oraz badania stosowane (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe lub dowolne połączenie), gdzie w efekcie powstanie ulepszony/nowy produkt lub usługa. Będą także prowadzone prace badawczo-rozwojowe i współpraca badawcza na rzecz wymiany wiedzy i technologii.

Od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego wsparto 646 projektów z zakresu *bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla sektora MSP*, w tym 50 w I półroczu 2015 r. (działanie 1.1). IZ RPO WZ szacuje zrealizowanie do końca 2015 r. wskaźnika na poziomie 166,36% zakładanej wartości docelowej. Zaawansowana realizacja wartości wskaźnika i prognozowane przekroczenie wartości docelowej jest wynikiem intensyfikacji konkursów (od początku realizacji Programu zostało ogłoszonych 9 naborów

w ramach działania 1.1) poza tym ze względu na to, iż w 1. Osi Priorytetowej istnieje zwiększone ryzyko rozwiązywania umów o dofinansowanie celowe jest, aby przedmiotowy wskaźnik przyjmował wartości większe od pierwotnie zakładanych. Do końca okresu sprawozdawczego rozwiązano 114 umów o dofinansowanie w ramach działania 1.1 natomiast w ramach wszystkich pozostałych działań, które występują w osiach od 1-8 rozwiązano 72 umowy o dofinansowanie.

W rezultacie działań opisanych powyżej, do końca czerwca 2015 r. wsparto 543 przedsiębiorstwa, z czego 37 w okresie sprawozdawczym (wskaźnik *liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw* opisujący poziom realizacji działania 1.1). Spośród tej liczby 321 to mikroprzedsiębiorstwa, 145 – małe przedsiębiorstwa i 77 – średnie przedsiębiorstwa. Taka wartość wskaźnika ponad trzykrotnie (329,09 %) przekracza wartość docelową i szacuje się, że do roku 2015 jeszcze wzrośnie.

Od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego utworzono 1498,45 miejsc pracy, z czego 186 w okresie sprawozdawczym (wskaźnik *liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw* wykazywany dla działania 1.1). Wg podpisanych umów o dofinansowanie w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych do końca 2015 r. zatrudnienie wzrosło do 2920,38 etatów, a wskaźnik zostanie zrealizowany na poziomie 139,07%. Na chwilę obecną został on osiągnięty w 71,35% w stosunku do wielkości docelowej, trzeba jednak zaznaczyć, że realizacja wskaźnika jest przesunięta w czasie, ze względu na fakt, iż nowe miejsca pracy są generowane przez okres do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Od momentu uruchomienia Programu w ramach nowych miejsc pracy utworzono 441,64 etaty dla kobiet i 1056,81 etatów dla mężczyzn. Źródłem dla wskaźnika nowych miejsc pracy w podziale na płeć są *Sprawozdania z trwałości projektu*.

Na obszarach wiejskich utworzono do końca okresu sprawozdawczego ogółem 421,05 miejsc pracy (wskaźnik *liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach wiejskich* wykazywany dla działania 1.1), w tym w I półroczu 2015 r. 42 miejsca pracy. Szacuje się, że do 2015 r. zostanie utworzonych 847,03 miejsc pracy, co zrealizuje zakładaną wartość wskaźnika do roku 2015 w ponad 200%, natomiast na obecną chwilę wskaźnik został osiągnięty na poziomie 105,26% w stosunku do wartości docelowej. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację wskaźników na koniec 2015 r. miejsca pracy utworzone na obszarach wiejskich będą stanowiły 29% wszystkich miejsc pracy, które powstaną w wyniku realizacji projektów w ramach działania 1.1. Analizując powyższe dane liczbowe można wywnioskować, że projekty realizowane na obszarach stosunkowo słabiej rozwiniętych gospodarczo generują stosunkowo dużo miejsc pracy, co sprzyja zniwelowaniu różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi w województwie.

Od początku realizacji Programu zrealizowano 27 projektów z zakresu *bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska* (wskaźnik wykazywany w niektórych projektach działania 1.1. Wartość wskaźnika zmniejszyła się ze względu na problemy w realizacji zgłaszane przez beneficjentów. IZ RPO WZ każdorazowo analizuje wpływ nieosiągnięcia wskaźnika na cele projektu. W uzasadnionych przypadkach zgadza się na jego niewykonanie. Na chwilę obecną wskaźnik został osiągnięty na poziomie 67,50% w stosunku do wartości docelowej, natomiast szacuje się, że do 2015 r. w województwie zostanie zrealizowanych 36 projektów, co pozwoli na osiągnięcie wskaźnika na poziomie 90%.

Do końca okresu sprawozdawczego dzięki wsparciu przedsięwzięć realizowanych w ramach działania 1.1 wykreowano dodatkowe inwestycje o wartości 136,54 mln EUR (wskaźnik *dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu* mierzony jako wartość wkładu prywatnego w zrealizowanych projektach), w tym prawie 17 mln EUR w okresie sprawozdawczym. Uzyskana dotychczas wartość stanowi 248,25% zakładanego poziomu docelowego wskaźnika. Szacuje się, że do końca 2015 r. wskaźnik wzrośnie do 168,60 mln EUR, przekraczając ponad trzykrotnie wartość docelową (306,55%).

W związku z wdrażaniem poddziałania 1.3.2 do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 130 projektów *promujących atrakcyjność regionu, bądź wspierających międzynarodową aktywność przedsiębiorstw*, w tym 2 w I półroczu 2015 roku, co pozwoliło na osiągnięcie w 162,5% wartości docelowej. Wg szacunków do końca 2015 r. liczba projektów wzrosła do 153, co pozwoli zrealizować zakładaną wartość wskaźnika w 191,25%.

Tak wysoka realizacja wskaźnika jest skutkiem dużego zainteresowania beneficjentów poddziałaniem. Na popularność tę miały wpływ dogodne dla beneficjenta, trzy typy wspieranych projektów:

- udział w targach i wystawach,
- udział w misji gospodarczej,
- organizacja misji gospodarczej.

Poziom wdrażania poddziałania 1.3.4 *Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP – Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE* opisują dwa powiązane ze sobą wskaźniki: *liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz liczba udzielonych pożyczek i poręczeń*. Zgodnie z zaleceniami MIR realizacja przedmiotowych wskaźników w sprawozdaniach rocznych wykazana zostanie po złożeniu wniosku o płatność końcową. Monitoring bieżący w ramach przedmiotowej Inicjatywy odbywa się poprzez informacje kwartalne/półroczne/roczne.

1.3.3.2 Postęp wdrażania priorytetu 2 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



2 OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I ENERGETYCZNEJ

I półrocze 2015 r.

- **1** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **5 156 865,52 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **0,51 %** alokacji przeznaczonej na Oś 2
- **5** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **7 115 815,52 PLN**, co stanowi **0,77 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 2
- **8 879 515,06 PLN** - kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **0,96 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 2*
- **2 681 915,45 PLN** płatności EFRR przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **0,29 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 2

*Wartość nie jest zgodna z raportem udostępnionym w KSI SIMIK (raport nie uwzględnia kwot wycofanych). W związku z powyższym IZ RPO WZ wylicza wartość wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym odejmując *wartość od uruchomienia programu w roku 2014 od wartości od uruchomienia w I półroczu 2015*. Raporty od uruchomienia programu uwzględniają kwoty wycofane.

Kwota przeznaczona na realizację 2 osi priorytetowej wynosi **927 768 858,70 PLN** (z EFRR) co stanowi **26%** alokacji przeznaczonej na Program.


Postęp finansowy

Tabela 5 Postęp finansowy dla osi 2 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)

Postęp finansowany od uruchomienia programu dla osi 2									
Oś	Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu		%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC
	Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		wartość EFRR			Wartość EFRR
2	183	1 214 552 412,26	139	921 155 905,98	99,29	824 181 592,03	88,83		814 994 370,85
									87,84

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI/SIMIK 2007-2013

Wykres 11 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 2 priorytetowej od początku realizacji Programu (mln PLN)

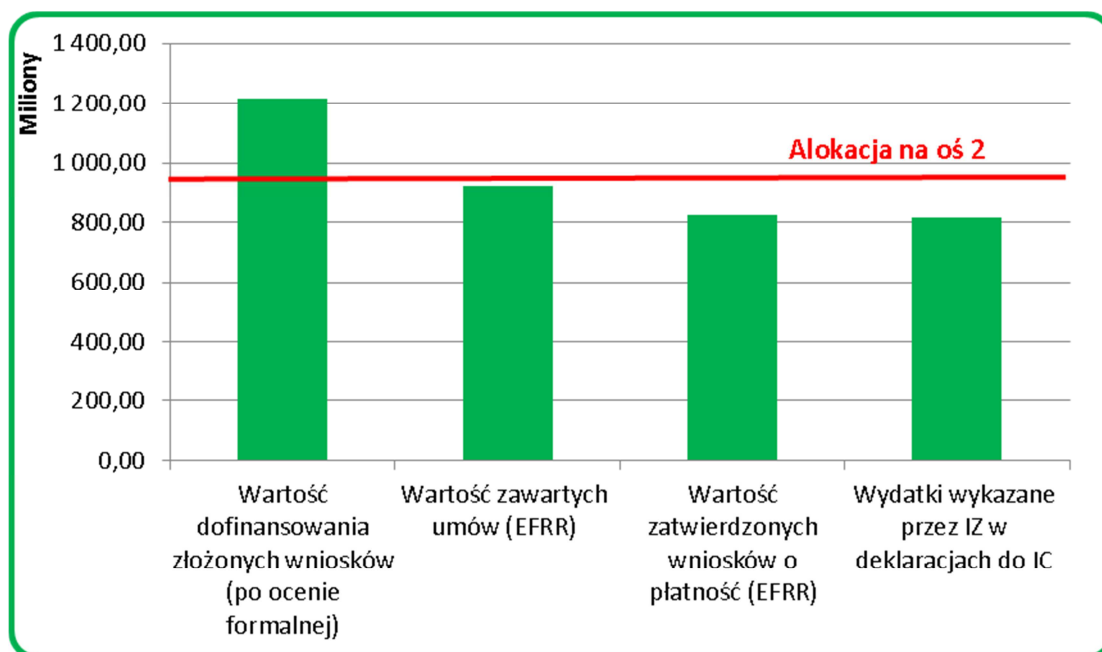

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2015 r. nie ogłoszono żadnych naborów w trybie konkursowym. W pozostałych trybach: indywidualnym i systemowym również nie ogłoszono naborów.

Nabory planowane:

w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Od początku realizacji Programu w ramach 2. Osi Priorytetowej *Rozwój Infrastruktury Transportowej i Energetycznej* zawarto 139 umowy (w tym 5 dotyczy I półroczu 2015 r.), z czego do końca okresu sprawozdawczego dla 113 projektów zostały już zatwierdzone wnioski o płatność końcową (w tym 4 w okresie sprawozdawczym), co wpłynęło na wzrost realizacji części wskaźników programowych. Ponadto na podstawie wartości wynikających z umów IZ RPO WZ oszacowała wartości wskaźników możliwe do osiągnięcia do końca 2015 r.

Efekty realizacji 2. Osi Priorytetowej na poziomie Programu mierzone są za pomocą 9 głównych wskaźników produktu i 5 wskaźników rezultatu. **Wskaźniki produktu to:**

- *liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej* (działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa),
- *liczba projektów z zakresu infrastruktury energetycznej* (działanie 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna),
- *długość wybudowanych dróg* (poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów),
 - w tym: *gminnych, powiatowych, wojewódzkich*,
- *długość wybudowanych dróg na obszarach wiejskich* (poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów),
- *długość przebudowanych dróg* (poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów),
 - w tym: *gminnych, powiatowych, wojewódzkich*,
- *długość przebudowanych dróg na obszarach wiejskich* (poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów),
- *długość przebudowanych linii kolejowych* (poddziałanie 2.1.7. Regionalny transport kolejowy),
- *liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej* (poddziałanie 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego),
- *pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej* (poddziałanie 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego);

z kolei **wskaźniki rezultatu to:**

- *oszczędność czasu (na zmodernizowanych liniach kolejowych) w przewozach pasażerskich i towarowych* (poddziałanie 2.1.7. Regionalny transport kolejowy),
- *oszczędność czasu (na nowych i zmodernizowanych drogach) w przewozach pasażerskich i towarowych* (poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów)),
- *przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego* (poddziałanie 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego),
- *liczba nowych odbiorców energii elektrycznej* (poddziałanie 2.2.1. Sieci elektroenergetyczne),
- *liczba nowych odbiorców gazu z sieci* (poddziałanie 2.2.2. Sieci dystrybucji gazu ziemnego).

Wartości zrealizowane i szacowane powyższych wskaźników przedstawia Załącznik I do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym w ramach 2. Osi priorytetowej podpisano 5 umów o wartości EFRR wynoszącej 7 115 815,52 PLN. Większość w ramach działania 2.3 (4 umowy), zaś 1 umowa została podpisana w ramach działania 2.1.

Z szacunków wynika iż, do końca 2015 r. spośród 9 głównych wskaźników produktu nie zostanie osiągnięta w 100% wartość docelowa tylko jednego wskaźnika - *Liczba projektów z zakresu infrastruktury energetycznej* (77,78% realizacji wskaźnika), a wśród podwskaźników - *Długość wybudowanych dróg powiatowych*, przy czym szacowaną realizację na poziomie 87,75% należy uznać za zadowalającą. W przypadku wskaźników rezultatu podobna sytuacja dotyczy trzech wskaźników - *Oszczędność czasu na zmodernizowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych*, *Liczba nowych odbiorców energii elektrycznej* oraz *Liczba nowych odbiorców gazu z sieci*.

Spośród 113 projektów rozliczonych do końca okresu sprawozdawczego, 108 realizuje wskaźnik *Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej*. To znacznie więcej niż zaplanowano na etapie programowania – już w tym momencie bowiem wskaźnik jest osiągnięty na poziomie 450%, a szacuje się, że do 2015 r. w ramach RPO WZ zostanie zrealizowanych aż 124 tego typu projektów. Znaczne przekroczenie

wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika (516,67% realizacji) jest związane m.in. z działaniami IZ RPO WZ zmniejszającymi maksymalne dofinansowanie projektów dotyczących dróg lokalnych, w wyniku czego zostanie zrealizowanych więcej projektów o stosunkowo mniejszej wartości. Ponadto ze względu na brak zainteresowania wsparciem w ramach działania 2.2 *Lokalna infrastruktura energetyczna*, trzykrotnie przesunięto środki o łącznej wartości ponad 10,12 mln EUR do działania 2.1. *Zintegrowany system transportowy województwa*, co umożliwiło sfinansowanie większej liczby projektów, oraz do działania 2.3. *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2*. Planuje się, że wskaźnik w kolejnych okresach sprawozdawczych wzrośnie, ponieważ z powodu wykreślenia z listy IPI w styczniu 2014 r. projektu *Uruchomienie lotniska w Żegrzu Pomorskim k. Koszalina*, przesunięto zarezerwowaną na niego w poddziałaniu 2.1.4 alokację w wielkości 9 mln EUR do poddziałań 2.1.1 i 2.1.3. Część z tych środków zostanie przeznaczona na dwa projekty indywidualne, które zostały w czerwcu 2014 dopisane do listy ILPI: *Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu* (beneficjent Gmina Miasto Świnoujście), którego planowane zakończenie realizacji powinno nastąpić w drugiej połowie 2015 r. oraz *Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap Ib* (beneficjent Gmina Miasto Szczecin), którego zakończenie również jest planowane na drugie półrocze 2015 r.

Inwestycje w zakresie rozwoju dróg regionalnych i lokalnych, realizowane w ramach działania 2.1 *Zintegrowany system transportowy województwa* (poddziałania 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3), stanowią w osi 2 dominującą pod względem liczby i wartości przyznanego dofinansowania z EFRR grupę projektów: od uruchomienia RPO WZ w ramach powyższego działania podpisano 124 umowy o wartości ogółem 1 422,98 mln PLN i wartości dofinansowania z UE w wysokości 893,41 mln PLN, co w porównaniu do wartości projektów realizowanych w ramach całej osi 2 (łącznie od uruchomienia podpisano 139 umów o wartości ogółem 1 508,16 mln PLN i wartości dofinansowania EFRR w wysokości 921,16 mln PLN) ukazuje dominujący poziom projektów realizowanych w ramach działania 2.1.

Efektom realizacji inwestycji z zakresu drogowej infrastruktury transportowej jest przebudowa 318,33 km dróg od początku realizacji Programu, z czego 6,39 km w okresie sprawozdawczym. Na podstawie analizy zawartych umów zakłada się że do końca 2015 r. zmodernizowanych zostanie 352,66 km dróg, a wskaźnik osiągnie 226,06% zakładanej wartości docelowej. Patrząc natomiast na wskaźnik w podziale na poszczególne kategorie dróg – tj. na gminne, powiatowe i wojewódzkie, szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie przebudowanych 53,35 km dróg gminnych (177,83% realizacji wskaźnika), 111,76 km dróg powiatowych (242,96% realizacji wskaźnika) oraz 187,55 km dróg wojewódzkich (234,44% realizacji wskaźnika). W przypadku dróg wybudowanych szacowana realizacja w stosunku do poprzedniego sprawozdania wzrosła i wynosi 28,64 km (106,07% realizacji wskaźnika). W porównaniu do końca 2014 r. realizacja wskaźnika wzrosła o 2,66 km i wynosi 25,20 km (93,33% realizacji wskaźnika). Największy wzrost realizacji dotyczył podwskaźnika *Długość wybudowanych dróg powiatowych* (wzrost o 1,64 km). Łącznie dzięki środkom pochodzącym z Programu szacuje się, że do końca roku 2015 zostanie wybudowanych bądź przebudowanych ponad 381 km dróg.

W związku z rozliczeniem projektów dotyczących zarówno budowy jak i przebudowy dróg zwiększyła się również realizacja wskaźników dotyczących *dróg na obszarach wiejskich*. Od uruchomienia Programu na obszarach wiejskich wybudowano 12,70 km dróg oraz przebudowano 279,60 km dróg. Już na obecną chwilę wskaźniki są zrealizowane na poziomie 254% – w przypadku nowych dróg i 699% – w przypadku dróg przebudowywanych. Szacuje się, że do 2015 r. zakładane wartości docelowe zostaną znacznie przekroczone, zwłaszcza jeżeli chodzi o drogi przebudowywane, gdzie wskaźnik osiągnie poziom 766,65% wartości docelowej (ponad 306 km przebudowanych dróg) natomiast w przypadku dróg nowych – 310,20% (ponad 15 km nowo wybudowanych dróg). Znaczne przekroczenie wartości wskaźników wynika z jednej strony z jego niedoszacowania i stosunkowo dużej liczby projektów w zakresie infrastruktury drogowej realizowanych na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji przedmiotowych inwestycji na nowych i zmodernizowanych drogach, oszczędności w przewozach pasażerskich i towarowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 173 045 EUR. Szacuje się, że do roku 2015 wartość wskaźnika wzrośnie aż do 69 103 610 EUR (345,52% wartości docelowej wskaźnika).

Realizacja wskaźnika *Długość przebudowanych linii kolejowych* nie uległa zmianie i nadal wynosi 103 km. Szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie zmodernizowanych 203,30 km tras, co pozwoli na realizację wskaźnika na poziomie 100,64%. Wskaźnik ten realizowany jest przez 2 projekty. Jeden z nich „Modernizacja regionalnej Linii kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski – Ulikowo” został już rozliczony w 2013 r. W październiku 2014 r. został złożony wniosek o płatność końcową drugiego projektu „Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów - Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów”. Obecnie trwa jego weryfikacja. W przypadku wskaźnika rezultatu *Oszczędność czasu (na zmodernizowanych liniach kolejowych) w przewozach pasażerskich i towarowych*, na którego poziom bezpośredni wpływ ma realizacja wskaźnika produktu *Długość przebudowanych linii kolejowych*, realizacja nie wzrosła i dalszym ciągu wynosi 0. Wynika to z faktu, że na wygenerowanie i zaraportowanie tej wartości przez beneficjenta potrzebny jest m.in. roczny okres czasu. Niestety ze względu na opóźnienia w realizacji projektów (o pół roku w przypadku zakończonego projektu i o ponad rok dla projektu jeszcze realizowanego) oraz czas potrzebny na pojawienie się wartości zrealizowanych, szacuje się, że do końca 2015 r. obie inwestycje wygenerują 446 070 EUR oszczędności, co pozwoli na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika jedynie na poziomie 22,30%. Zgodnie z przyjętym systemem szacowania wskaźników beneficjenci osiąga je do końca okresu trwałości, dlatego w wartości docelowej są ujęte wartości, które będą realizowane aż do 2019 r., podczas gdy w sprawozdaniu wykazana jest wartość tylko do 2015 r. Wartości wskaźnika wykazane w dokumentach programowych będą osiągnięte lecz dopiero po 5 latach trwałości dwóch projektów, które składają się na wartość realizowanego wskaźnika.

W okresie sprawozdawczym nie wzrosła wartość zrealizowana wskaźnika *Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej* i nadal wynosi 22, podobnie jest w przypadku wskaźnika *Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej* – 540 miejsc. Szacuje się, że do końca 2015 r. w województwie zostanie zakupionych 39 sztuk taboru komunikacji miejskiej co spowoduje, że wartość docelowa zostanie przekroczona niemal czterokrotnie, zaś wskaźnik *Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej* wyniesie ponad 1600 miejsc.

W przypadku wskaźnika *Przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego* szacuje się, że do końca 2015 r. realizacja wskaźnika znacząco przekroczy zakładaną wartość docelową, gdyż według szacunków wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie aż 2 194,45 % (wzrost ludności korzystającej z transportu miejskiego wyniesie aż 987 502 osoby, podczas gdy zakładana wartość docelowa wynosi 45 000 osób). Do końca okresu sprawozdawczego wskaźnik został zrealizowany na poziomie 53 283 os., co oznacza, że zakładana wartość docelowa została zrealizowana w 118,41%.

Lokalna infrastruktura energetyczna jest obszarem, którego wskaźniki są realizowane w mniejszym stopniu. W ramach działania 2.2 wdrażanych jest 7 projektów, w tym 6 w obszarze *Energia elektryczna* i tylko 1 dotyczący gazu ziemnego. Oznacza to, że wskaźnik programowy *Liczba projektów z zakresu infrastruktury energetycznej* zostanie zrealizowany na poziomie 77,78%. Nie jest to jednak wystarczające do zrealizowania na zadowalającym poziomie wskaźników rezultatu. Obecna realizacja tego wskaźnika wynosi 5 szt., zaś wartość docelowa to 9 szt. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, realizacja wzrosła o 1 szt. Szacuje się, że wskaźnik rezultatu z zakresu infrastruktury energetycznej, czyli *Liczba nowych odbiorców energii elektrycznej* do końca 2015 r. osiągnie wartość 140 osób, jest to jednak zbyt mało by osiągnąć zakładaną wartość realizacji.

Na 6 projektów zakontraktowanych w ramach poddziałania 2.2.1 *Sieci elektroenergetyczne* tylko w 3 zadeklarowano realizację wskaźnika *Liczba nowych odbiorców energii elektrycznej*. Pozostałe projekty dotyczą zwiększenia zdolności przesyłowych i bezpieczeństwa dostaw energii i wykazują jedynie odbiorców energii mających dostęp do sieci.

W zakresie poddziałania 2.2.2 *Sieci dystrybucji gazu ziemnego* w 2009 r. przeprowadzono nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla Województwa, w ramach którego wpłynęło jedno zgłoszenie. W efekcie jeden projekt pn. „Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce” został wpisany na ILPI i w 2013 IZ RPO WZ zatwierdziła dla niego płatność końcową. Z kolei w 2010 r. ogłoszono konkurs otwarty dla poddziałania 2.2.2, w odpowiedzi na który nie wpłynął żaden wniosek. Ponieważ przeprowadzone nabory nie przyniosły spodziewanych rezultatów, w ramach

renegocjacji Programu przeniesiono część niewykorzystanej alokacji z kategorii interwencji 33 *Energia elektryczna* oraz 35 *Gaz ziemny* na priorytetowe dla województwa zadania drogowe.

IZ RPO WZ nie renegocjowała jednak wartości docelowych wskaźników, które są związane z tymi kategoriami, zatem przy aktualnej alokacji i poziomie jej zaangażowania w projektach, które na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 99,68 % oraz biorąc pod uwagę szacunki w oparciu o umowy z beneficjentami, wskaźniki *Liczba nowych odbiorców energii elektrycznej*, *Liczba nowych odbiorców gazu z sieci* nie zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami.

1.3.3.3 Postęp wdrażania priorytetu 3 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



3 OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

I półrocze 2015 r.

- **1** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **535 050,00 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **0,40 %** alokacji przeznaczonej na Oś 3
- **2** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **3 196 550,78 PLN**, co stanowi **2,37 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 3
- **13 697 893,75 PLN** - kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **10,16 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 3*
- **16 354 862,23 PLN** płatności EFRR przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **12,13%** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 3

*Wartość nie jest zgodna z raportem udostępnionym w KSI SIMIK (raport nie uwzględnia kwot wycofanych). W związku z powyższym IZ RPO WZ wylicza wartość wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym odejmując *wartość od uruchomienia programu w roku 2014* od *wartości od uruchomienia w I półroczu 2015*. Raporty *od uruchomienia programu* uwzględniają kwoty wycofane.

Kwota przeznaczona na realizację 3 osi priorytetowej wynosi **134 879 646,92 PLN** (z EFRR) co stanowi **4% alokacji** przeznaczonej na Program.


Postęp finansowy

Tabela 6 Postęp finansowy dla osi 3 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)

Postęp finansowany od uruchomienia programu dla osi 3									
Oś	Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu		%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC
	Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		wartość EFRR			Wartość EFRR
3	46	305 459 909,85	33	127 546 262,53	94,56	82 547 848,87	61,20		76 436 534,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK 2007-2013

Wykres 12 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 3 priorytetowej od początku realizacji Programu (mIn PLN)

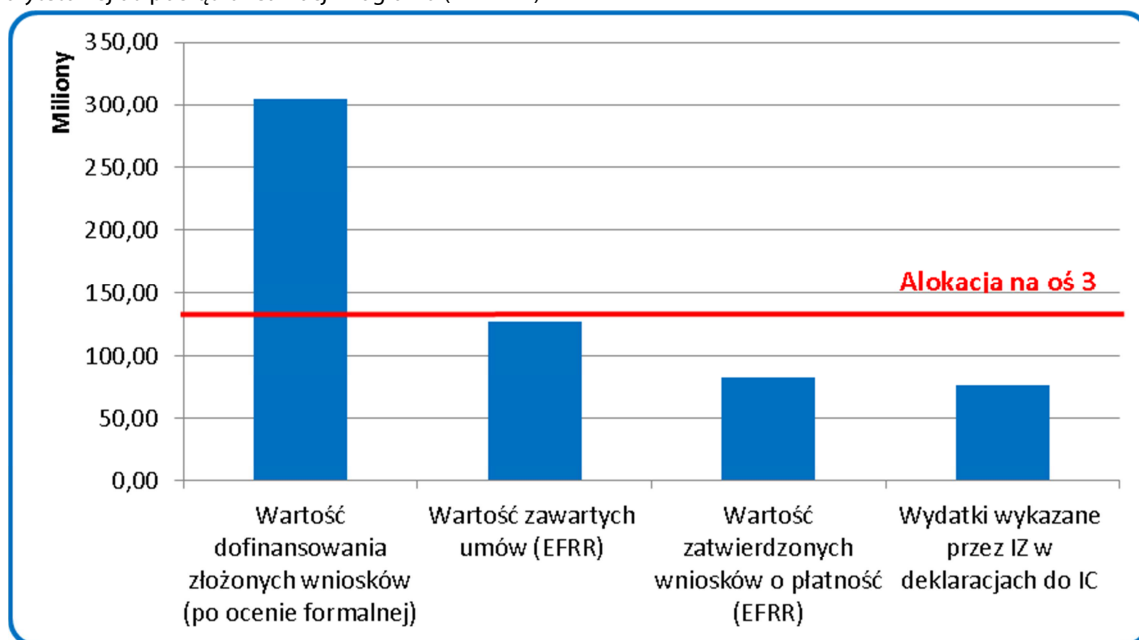

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2015 r. nie ogłoszono naboru w trybie konkursowym w ramach osi 3. W trybie indywidualnym i systemowym również nie ogłoszono naborów.

Nabory planowane:

W kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Efekty realizacji 3. Osi Priorytetowej *Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego* mierzone są poprzez 4 wskaźniki produktu i 4 rezultatu, w szczególności są to następujące **wskaźniki produktu**:

- liczba projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego (działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług),
- długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego (działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego),

- *liczba instytucji, które wdrożyły usługi on-line* (działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług).
- *liczba powstałych usług on-line* (działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług);

oraz wskaźniki rezultatu:

- *liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu* (działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego),
- *liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego* (działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego), w tym:
 - *gospodarstwa domowe,*
 - *MSP,*
 - *szkoły*
 - *podmioty administracji publicznej,*
- *liczba osób korzystających ze zbudowanych/ zmodernizowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP* (działanie 3.1, Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).
- *liczba osób korzystających z usług on-line* (działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług).

Wartości zrealizowane i szacowane powyższych wskaźników przedstawia Załącznik I do niniejszego sprawozdania.

Od uruchomienia programu w ramach 3 osi zostały podpisane 33 umowy o dofinansowanie a zakończonych zostało 7 projektów (posiadają zatwierdzony wniosek o płatność końcową). W okresie sprawozdawczym nie został zakończony żaden projekt.

W listopadzie 2014 r. uzupełniono zapisy URPO w ramach działania 3.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3 dot. klasyfikacji kategorii interwencji funduszy strukturalnych poprzez wskazanie tematu priorytetowego: *13 - Usługi i aplikacje dla obywateli* oraz określono alokację finansową w wysokości 130 000 EUR. Pozwoliło to na dofinansowanie w 2015 roku projektu *Wsparcie prac przygotowawczych do budowy projektu systemowego "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"*.

W I półroczu 2015 r. podpisane zostały 2 umowy o dofinansowanie, jednakże ze względu na jedną rozwiązana umowę oraz aneksy finansowe zawarte w okresie sprawozdawczym, ogólna kontraktacja w ramach osi nieznacznie zmniejszyła się o 147 873,02 PLN. Biorąc jednak pod uwagę alokację wyliczoną zgodnie z algorytmem, o którym mowa w wytycznych horyzontalnych, procent wykorzystania alokacji dla osi priorytetowej w stosunku do kontraktacji zwiększył się i wynosi 94,56%.

Analizując dotychczasowy poziom wykorzystania dostępnej alokacji należy dodać, że w ramach wszystkich projektów indywidualnych realizowanych w ramach w ramach 3. Osi Priorytetowej (12 projektów o wartości dofinansowania z EFRR przekraczającej 44,29 mln PLN) podpisano umowy o dofinansowanie. Dwa projekty do końca okresu sprawozdawczego zostały zakończone, w ramach 5 projektów planowana data zakończenia realizacji to rok 2015, natomiast w ramach trzech projektów trwają kontrole na zakończenie realizacji projektu – wyniki kontroli powinny być widoczne do końca 2015 r.

Na podstawie obecnie realizowanych projektów szacuje się, że do końca 2015 r. osiągnięte zostaną w ponad 100 % wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu. Zagrożone jest natomiast wykonanie dwóch z czterech podwskaźników, wskaźnika *Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego* (w tym: *MSP- 43,91%, i podmiotów administracji publicznej – 43,40%*).

IZ RPO WZ przewiduje, że do końca 2015 r. zostaną zrealizowane 32 projekty z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie (21 w ramach działania 3.1 oraz 11 w ramach działania 3.2), czyli o 24 więcej niż zakładano na etapie programowania. Sytuacja ta jest związana z tym, iż pierwotnie planowano wdrożyć tylko jeden duży projekt systemowy (Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna), ale ostatecznie realizowany jest zarówno jeden projekt systemowy (e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim) jak i 12 projektów indywidualnych oraz 19 wyłonionych w trybie konkursu otwartego.

Dzięki realizacji projektów w ramach działania 3.1 szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie wybudowanych 1 136,32 km *sieci Internetu szerokopasmowego* (1136,32% realizacji wartości docelowej wskaźnika), w wyniku czego do 2015 r. wykonanych zostanie 4967 *podłączeń do Internetu szerokopasmowego* (155,22% realizacji wartości docelowej wskaźnika), w szczególności podłączone zostaną 4310 gospodarstwa domowe (215,50% realizacji wskaźnika), 202 MSP (43,91% realizacji wskaźnika), 238 szkół (99,17% realizacji wskaźnika) oraz 217 podmiotów administracji publicznej (43,40% realizacji wskaźnika).

Szacuje się, że wdrożenie projektów zapewni dostęp do szerokopasmowego Internetu dla 284 479 osób (wskaźnik *liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu* wyznaczony dla działania 3.1), co oznacza wykonanie wskaźnika do 2015 r. na poziomie 284,48%.

Założona wartość docelowa wskaźnika *liczba osób korzystających ze zbudowanych/zmodernizowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP* (działanie 3.1) – w okresie sprawozdawczym zmniejszyła się ze 100 643 na 99 143 osoby (nastąpiło przesunięcie terminu realizacji jednego z projektów o rok). W rezultacie w ramach RPO wartość docelowa wskaźnika powinna zostać zrealizowana w 99,14%. Do końca okresu sprawozdawczego wartość zrealizowana nadal wynosiła 0 osób, lecz z danych pozyskanych od beneficjentów wynika, że wskaźnik po zakończeniu realizacji projektu osiągnął wartość 14 380 osób i nadal rośnie. Dane zostaną uzupełnione w KSI.

Wdrażanie projektów zapewniających jak największej liczbie różnych odbiorców dostęp do Internetu, a w konsekwencji upowszechnienie korzystania z technologii społeczeństwa informacyjnego – wobec wartości, jakie przybierają wskaźniki kontekstowe określające rozwój społeczny – uznawane jest za zasadnicze dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie. Przykładowo: odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer osobisty z dostępem do Internetu w ogólnej liczbie gospodarstw domowych wynosi w województwie 65,5% i jest nieco niższy od wartości wskaźnika dla kraju (68,8%)⁵, w ciągu lat systematycznie ulegał jednak poprawie – dla porównania wartość wskaźnika w województwie na koniec 2007 r. wyniosła 27,6% (kraj – 28,4%), a na koniec 2010 r. 46,4% (kraj – 45,7%, na koniec 2011 r. 61% (kraj 62,3%) a na koniec 2012 r. 64%.

Na podstawie podpisanych umów szacuje się, że dzięki projektom wdrażanym w ramach działania 3.2 do końca 2015 r. powstanie 67 usług on-line (111,67% realizacji wskaźnika *liczba powstałych usług on-line*) a z uruchomionych usług on-line będzie korzystało 525 342 osoby, co stanowi 262,67% realizacji wskaźnika *liczba osób korzystających z usług on-line*).

Usługi on-line wdroży 490 instytucji (wskaźnik *liczba instytucji, które wdrożyły usługi on-line*), co znacznie przekroczy zakładaną wartość docelową i stanowić będzie 4900%. Pierwotnie ustalona wartość docelowa na poziomie 10 szt. wynikała z innej metodologii obliczania wskaźnika znacznie różniącej się od obecnie stosowanej, opracowanej dla potrzeb wskaźników kluczowych KSI.

Funkcjonowanie administracji publicznej w Internecie jest jednym z zasadniczych elementów przyczyniających się do budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej. Jest to szczególnie istotne na poziomie powiatów i gmin. Usprawnienie procesów administracyjnych ma zasadniczy wpływ na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, z uwagi na łatwość i szybkość przeprowadzania procedur oraz uzyskiwania odpowiednich decyzji administracyjnych. Stąd takie duże znaczenie ma realizowany w tym obszarze projekt systemowy *e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim*. Środki EFRR skierowane na wdrożenie projektu (14 968 778,07 PLN) stanowią 33,54% alokacji EFRR przeznaczonej na działanie 3.2. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny, kompleksowy i jednolity sposób świadczenia usług elektronicznych przez Samorząd Województwa, gminy i powiaty oraz szeroki dostęp do treści elektronicznych, także z zakresu turystyki oraz map cyfrowych. Wdrożenie projektu pozwoli na udostępnienie aplikacji i usług teleinformatycznych dla 75 jednostek sektora publicznego w 2016 roku, a docelowo z utworzonych aplikacji będzie korzystało 100 jednostek sektora publicznego. Projekt jest komplementarny do już zrealizowanych projektów ICT na poziomie samorządowym – w szczególności uwzględnia zamierzenia innych projektów przewidzianych do realizacji w ramach

⁵ Dane według stanu w 2013 roku

projektów indywidualnych działania 3.2. Jest także zgodny z projektami realizowanymi na szczeblu centralnym w ramach PO IG OŚ 7. (m.in. pl.ID – polska ID Karta – wdrożenie elektronicznego dowodu tożsamości z funkcją uwierzytelnienia w systemach IT jednostek sektora publicznego; Budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP2). Wdrożenie *e-Administracji i e-Turystyki w województwie zachodniopomorskim* w proponowanym zakresie zaspokoi potrzeby mieszkańców związane ze wzrostem dostępności wysokiej jakości usług elektronicznych.

Pomimo optymistycznych szacunków dla postępu rzeczowego, wartości zrealizowane odnotowano w ramach dwóch z ośmiu wskaźników w ramach 3 osi priorytetowej. Wynika to bezpośrednio z poziomu zaawansowania poszczególnych projektów – tylko 7 z 32 projektów jest zakończonych. Wynika to z wielu wyzwań realizacyjnych, przed którymi stoją beneficjenci wdrażający inwestycje zwłaszcza infrastrukturalne. IZ RPO WZ dokłada wszelkich starań (w zakresie swoich kompetencji) dla zbudowania odpowiednich warunków do osiągnięcia przez poszczególnych beneficjentów założonych w projektach celów. Poniżej przedstawiono główne problemy dotyczące wdrażania projektów w ramach osi 3 oraz podejmowane środki zaradcze:

1. Trudności w uzyskiwaniu przez beneficjentów pełnej dokumentacji w wyznaczonych w umowie o dofinansowanie terminach

IZ RPO WZ w stosownych przypadkach wydaje decyzje o wydłużeniu terminu realizacji projektu w celu umożliwienia beneficjentowi zrealizowania inwestycji. Niestety nie zawsze beneficjent dotrzymuje nowo wyznaczonych terminów. W przypadku gdy IZ RPO WZ widzi zagrożenie dla zrealizowania inwestycji do końca 2015 roku zmuszona jest podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie z beneficjentem.

2. Specyfika projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz w podziale na etapy

Wypłata środków w tego rodzaju projektach jest uzależniona od dostarczenia kompletu dokumentów dotyczących danego etapu, w tym dokumentów środowiskowych. Opóźnienie jednego z etapów powoduje wydłużenie realizacji całego projektu co z kolei przekłada się na przesunięcie terminu realizacji wskaźników.

3. Późne rozpoczęcie realizacji projektów – w ramach umów zawartych w 2014 r.

Konkurs ogłoszony w roku 2013 oraz nowe projekty, wprowadzone na indykatywną listę projektów indywidualnych w 2014 r., stanowić miały mechanizm zapewniający realizację celów osi 3. Niestety dla wielu projektów, w ramach których podpisane zostały umowy o dofinansowanie w roku 2014, terminem zakończenia ich realizacji jest rok 2015. Z tego względu efekt realizacji projektów pojawiać się będzie w II połowie 2015 r. IZ RPO WZ na bieżąco monitoruje postęp w realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

4. Problemy beneficjentów w realizowaniu projektów nie objętych zasadami pomocy publicznej

W ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO, dopuszczono możliwość realizacji projektów, które nie są objęte pomocą publiczną. Beneficjenci decydujący się na realizację projektów w takiej formule w największej liczbie przypadków zaplanowali mechanizm wyłaniania w konkurencyjnym postępowaniu operatora dla zrealizowanej w ramach projektu infrastruktury teleinformatycznej, napotykają na problemy związane z wdrożeniem zaplanowanych we wnioskach procedur. Pojawiają się wątpliwości wynikające z możliwości przeniesienia zapisów wniosków o dofinansowanie na poziom realizacji projektów w sposób, który nie generowałby wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej. Problem w różnej skali dotyczy wszystkich projektów, które swoim zakresem obejmowały zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego – beneficjentów RPO WZ.

IZ RPO WZ w II kwartale 2015 r. przedstawiła beneficjentom warianty postępowania, które pozwalają na mogą rokować pod kątem zbudowania formuły dla zapewnienia osiągnięcia celów projektów.

5. Rozwiązywanie umów o dofinansowanie na wniosek beneficjenta

W I półroczu 2015 r. w przypadku trzech projektów beneficjenci złożyli wnioski do IZ RPO WZ o rozwiązanie umowy o dofinansowanie, uzasadniając je:

- ✓ niekorzystnymi ofertami złożonymi w postępowaniach przetargowych, które przekraczały kwotę jaką beneficjent mógł przeznaczyć na realizację zadania,

- ✓ brakiem możliwości realizacji projektu w terminie i kształcie określonym w zapisach umowy.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w lipcu 2015 r. podjął decyzję o rozwiązaniu z beneficjentami przedmiotowych umów o dofinansowanie.

Powyższe problemy (od 1 do 4) były również przedmiotem rozmów podczas spotkania rocznego z przedstawicielami KE, które odbyło się w lutym 2015 r.

1.3.3.4 Postęp wdrażania priorytetu 4 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



4 OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

I półrocze 2015 r.

- **1** – liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **4 197 346,06 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **1,76%** alokacji przeznaczonej na Oś 4
- **12** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **8 733 299,61 PLN**, co stanowi **3,77%** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 4
- **15 228 749,69 PLN** - kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **6,57%** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 4*
- **17 650 453,53 PLN** płatności EFRR przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **7,62%** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 4

*Wartość nie jest zgodna z raportem udostępnionym w KSI SIMIK (raport nie uwzględnia kwot wycofanych). W związku z powyższym IZ RPO WZ wylicza wartość wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym odejmując *wartość od uruchomienia programu w roku 2014* od *wartości od uruchomienia w I półroczu 2015*. Raporty od uruchomienia programu uwzględniają kwoty wycofane.

Kwota przeznaczona na realizację 4 osi priorytetowej wynosi **231 652 227,09 PLN** (z EFRR) co stanowi **6%** alokacji przeznaczonej na Program.


Postęp finansowy

Tabela 7 Postęp finansowy dla osi 4 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)

Postęp finansowany od uruchomienia programu dla osi 4									
Oś	Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
	Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		wartość EFRR		Wartość EFRR	
4	220	506 590 831,31	155	219 833 831,18	94,90	140 489 211,51	60,65	136 492 885,63	58,92

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK 2007-2013

Wykres 13 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 4 priorytetowej od początku realizacji Programu (mIn PLN)

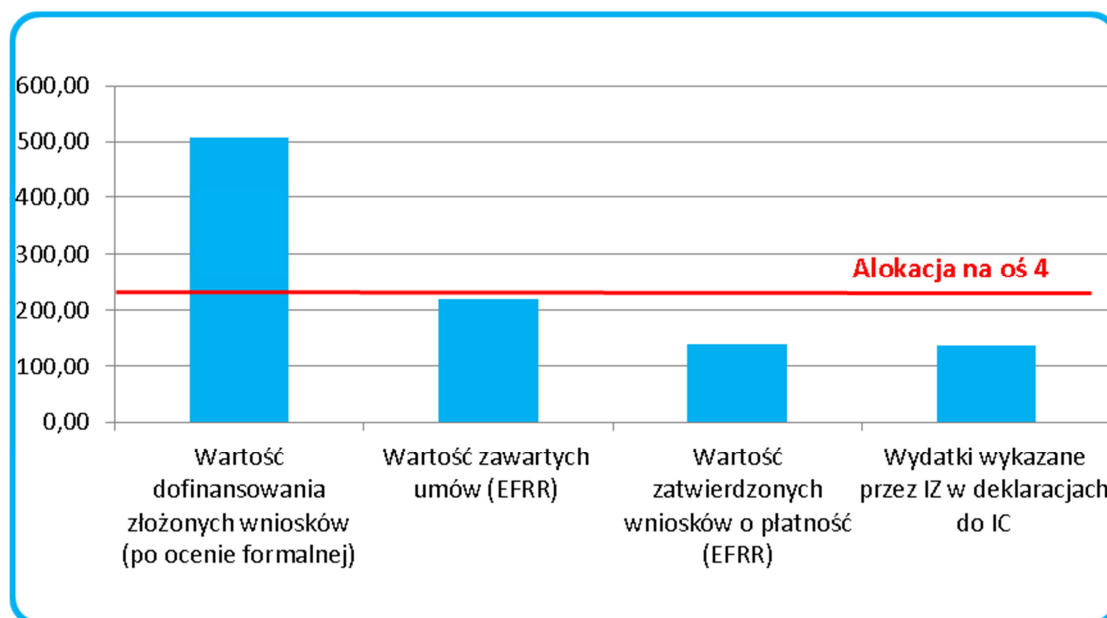

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2015 r. nie ogłoszono naborów w trybie konkursowym. W pozostałych trybach, systemowym i indywidualnym również nie zostały ogłoszone nabory.

Nabory planowane:

W kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Od uruchomienia programu do końca okresu sprawozdawczego w ramach 4. Osi Priorytetowej Infrastruktura Ochrony Środowiska zawarto 155 umów o dofinansowanie (w tym 12 w I półroczu 2015 r.), z czego 74 projekty uzyskały końcowe rozliczenie, w tym 9 w I półroczu 2015 r., co wpływa na wzrost realizacji niektórych wskaźników.

Efekty realizacji 4. Osi Priorytetowej mierzone są za pomocą 6 wskaźników produktu i 6 rezultatu. **Wskaźniki produktu** to:

- liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
- długość sieci kanalizacyjnej (działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
- liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (działanie 4.2 Gospodarka odpadami),
- liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza (działanie 4.4 Ochrona powietrza),
- liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom),
- liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią).

natomiast **wskaźniki rezultatu** to:

- liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej (działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
- liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnych (działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
- liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów (działanie 4.2 Gospodarka odpadami),
- liczba osób zabezpieczonych przed powodzią (poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom),
- liczba osób zabezpieczonych przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami (poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom),
- ilość wytworzonej energii (działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią).

Wartości zrealizowane i szacowane powyższych wskaźników przedstawia Załącznik I do niniejszego sprawozdania.

Na podstawie zawartych umów IZ RPO WZ szacuje, że do końca 2015 r. uda się osiągnąć wartości docelowe dla wszystkich wskaźników. Jednocześnie szacuje się, że wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu osiągną zakładane poziomy docelowe, a niektóre z nich znacznie je przekroczą. Stanie się to pomimo opóźnień w realizacji projektu wynikających ze zgłaszanych przez beneficjentów problemów np. z przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

Dotychczas zakończono realizację 8. projektów z zakresu energii odnawialnej (działanie 4.1), w tym jednego w I półroczu 2015 r. Na podstawie liczby zawartych umów przewiduje się, że do końca 2015 r. zostanie zrealizowane na terenie województwa łącznie 30 projektów, co pozwoli na wykonanie wskaźnika na wysokim poziomie (250% wartość docelowej). Jednocześnie znaczący będzie szacowany na podstawie podpisanych umów rezultat wyrażony wskaźnikiem *ilość wytworzonej energii*. Przewiduje się bowiem, że do końca 2015 r. zostanie wytworzone 231 970,28 MWh energii, co przy zakładanej wartości docelowej na poziomie 17 000 MWh oznacza przekroczenie realizacji wartości docelowej wskaźnika (1 364,53%). Jedną z przyczyn znacznej nadrealizacji wskaźnika jest odstępianie w konkursie z 2011 roku od zapisów linii demarkacyjnej. Umożliwiło to dofinansowanie projektów (w szczególności biogazowni), o wartości powyżej 10 mln PLN. Biogazownie są źródłem charakteryzującym się stosunkowo dużo większą ilością wytwarzanej energii w skali roku. Jest to spowodowane procesem wytwarzania energii nie uzależnionej od warunków środowiska, tak jak w przypadku produkcji energii z siły wiatru lub odpowiedniego nasłonecznienia. Dodatkowo w stosunkowo dużych instalacjach nastąpił efekt skali, który nie był wcześniej kalkulowany przy określeniu wartości docelowej wskaźnika rezultatu.

Realizacja wskaźnika osiągnęła 6 127,53 MWh (36,04% wartości docelowej). Opóźnienia w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która została uchwalona przez Sejm 26 czerwca 2014 r., a od 1 sierpnia 2014 r. weszła w życie, mogły spowodować opóźnienia w realizacji wskaźnika. Dodatkowo w przypadku projektów dotyczących działalności koncesyjnej mogły się pojawić opóźnienia, gdyż środki wypłacane są dopiero po dostarczeniu do IZ RPO dokumentów potwierdzających ważność koncesji. Beneficjent ma na to czas najpóźniej do trzech miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się idealnymi warunkami dla rozwoju energetyki odnawialnej, co potwierdzają liczne analizy, jak również duże zainteresowanie wśród wnioskodawców naborami w ramach działania 4.1. Rozwój tej gałęzi energetyki w województwie potwierdza również

wskaźnik *Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem* wzrasta znacząco z roku na rok. Według danych z 2011 wynosił 16,4%, zaś wg danych z 2012 już 27% a w 2014 r. wzrósł aż do 30,4%.

Do końca czerwca 2015 r. zakończono realizację 15 projektów z zakresu gospodarki odpadami (działanie 4.2), a na podstawie liczby zawartych umów szacuje się, że do 2015 r. zostanie zrealizowanych łącznie 19 projektów, co pozwoli na realizację wskaźnika na poziomie 190,0%. Do końca I półrocza 2015 selektywną zbiórką odpadów zostało objętych 25 130 osób, wg danych pozyskanych od beneficjentów po zakończeniu realizacji projektów wartość wskaźnika wzrosła do 48 807 osób, co realizuje prawie 50% wartości docelowej wskaźnika. Dane te zostaną uzupełnione w KSI. Ponadto, z analizy zawartych umów wynika, że do końca 2015 roku selektywną zbiórką odpadów zostanie objętych 205 337 osób (205,3% realizacji wskaźnika).

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działania 4.3 zakończono realizację 14 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (1 zakończono w I półroczu 2015 r.), zgodnie z szacunkami do końca 2015 r. zostanie zrealizowanych 15 projektów, co pozwoli na osiągnięcie 100% zakładanej wartości docelowej wskaźnika *liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej*. Dzięki tym projektom wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie 142,22 km sieci kanalizacji sanitarnej (na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 131,45 km), w związku z czym wskaźnik *długość sieci kanalizacyjnej* wykonany zostanie w 316,04%, przekraczając poziom zakładany na 2015 rok. W efekcie realizacji przedmiotowych projektów do sieci wodociągowej przyłączono 3 618 osób, a szacuje się, że do końca 2015 r. liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej wzrośnie do 3 750, co pozwoli na wykonanie wskaźnika na poziomie 100,0%. Natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączono 9 741 osób, w wyniku czego już na obecną chwilę wskaźnik *liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej* ponad czterokrotnie przekroczył zakładany poziom docelowy (432,93%). Na podstawie realizowanych umów szacuje się, że do końca 2015 r. do sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie 20 930 osób, to jest ponad dziewięciokrotnie więcej (930,22%) od zakładanego poziomu docelowego. Znaczne niedoszacowanie wartości wskaźników wynika z obiektywnych problemów na etapie wyznaczania wartości docelowych (brak pełnej wiedzy na temat linii demarkacyjnej⁶), z drugiej zaś strony nie przewidziano aż tak dużego zainteresowania konkursami na projekty z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej. Realizacja projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przyniosła widoczne efekty. Systematycznie wzrasta liczba ludności (w tym również na wsi) korzystającej z kanalizacji i wodociągów, jak również obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków. Co więcej, wg stanu na koniec 2014 r., województwo zachodniopomorskie w porównaniu z innymi województwami ma jedno z najwyższych wskaźników dotyczących: odsetka ludności korzystającej z kanalizacji (77,50%), korzystających z wodociągów (93,7%) oraz obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków (81,9%)⁷.

Od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektów realizowanych w ramach działania 4.4. podpisano 8 umów (w I półroczu rozwiązano jedną umowę o dofinansowanie – w wyniku kontroli wykryto nieprawidłowości oraz stwierdzono niezrealizowanie wskaźników – rozwiązana umowa nie wpływa na realizację wskaźnika programowego). Szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie wdrożonych 8 projektów mających na celu poprawę jakości powietrza (133,33% wartości docelowej wskaźnika zakładanej na etapie Programowania). Natomiast do końca okresu sprawozdawczego zakończonych zostało już 7 projektów z zakresu ochrony powietrza, co realizuje wartość docelową wskaźnika w ponad 100%. W porównaniu z innymi województwami i danymi dla kraju, emisja zanieczyszczeń powietrza w województwie zachodniopomorskim utrzymuje się na dość niskim poziomie, jednak realizacja projektów mających na celu rozwój infrastruktury, urządzeń i technologii służących do ograniczania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych jest niezbędna, zwłaszcza w kontekście poprawy warunków życia mieszkańców związanych z zachowaniem i ochroną środowiska.

⁶ Linia demarkacyjna nałożyła na IZ obowiązek finansowania projektów w zakresie kanalizacji w obrębie granic aglomeracji. Minimalna gęstość zaludnienia w aglomeracji to 120 Mk/km. W związku z tym w RPO do dofinansowania wybrano projekty, których wskaźnik rezultatu jest wyższy od zakładanego.

Do końca czerwca 2015 r. r. zrealizowanych zostało 28 projektów z zakresu prewencji zagrożeń (działanie 4.5), z czego 6 zostało wykazanych w okresie sprawozdawczym. Skutkuje to realizacją wskaźnika na poziomie 280%, a do końca 2015 r. jego wykonanie (73 projekty) ponad siedmiokrotnie przekroczy wartość docelową (730%). Dzięki wdrożonym projektom przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami zostało zabezpieczonych 1 690 969 osób. Należy zauważyć, iż wartość szacowana jest nieco niższa niż zrealizowana (wartość szacowana: 1 658 238 osób) gdyż od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do momentu złożenia wniosku o płatność końcową liczba ludności w woj. zachodniopomorskim zwiększyła się i taka też została wykazana przez beneficjenta. W związku tym, iż jeden z projektów pn.: Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego zadeklarował w wartości docelowej wskaźnika osiągnięcie go na poziomie 1 685 238 (ludność w województwie stan na 31.2014 r. – 1 717 970 osób) to w sprawozdaniu ujęto wartość najwyższą ze wszystkich projektów jakie są realizowane w ramach RPO WZ. Znaczne przekroczenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika wynika także ze specyfiki złożonych projektów – celem każdego z nich jest zabezpieczenie przed pożarami lasów mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, stąd jedna osoba objęta kilkoma systemami wykazywana jest kilkukrotnie. Rezultatem projektów z zakresu prewencji zagrożeń jest również liczba osób zabezpieczonych przed powodzią. Szacuje się, że do końca 2015 roku wartość wskaźnika osiągnie 7 299 osób (200,3% zakładanego poziomu docelowego).

Przyczyny opóźnień w realizacji projektów

1. Wydłużanie okresu realizacji projektów – ze względu na problemy zgłaszane przez beneficjentów (np. związane z przedłużającymi się procedurami przetargowymi) IZ RPO WZ wyrażała zgodę na wydłużanie okresu realizacji poszczególnych projektów.

2. Realizacja projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Wyplata środków w tego rodzaju projektach jest uzależniona od dostarczenia kompletu dokumentów dotyczących danego etapu, w tym dokumentów środowiskowych. Opóźnienie jednego z etapów powoduje wydłużenie realizacji całego projektu, co z kolei przekłada się na przesunięcie terminu realizacji wskaźników.

3. Regulacje prawne w zakresie OZE –przesunięcie w czasie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne wpłynęło na opóźnienia w realizacji projektów, objętych wsparciem w ramach działania 4.1.

4. Projekty dotyczące działalności koncesjonowanej – wypłata środków jest uzależniona od dostarczenia ważnej koncesji (beneficjent ma na to czas do trzech miesięcy od zakończenia realizacji projektu).

Celem zwiększenia poziomu kontraktacji IZ RPO WZ w 2013 i 2014 r. ogłosiła konkursy w ramach działania 4.1 (2 konkursy) oraz poddziałania 4.5.2. Konkursy zostały rozstrzygnięte w 2014 r. Umowy o dofinansowanie podpisywane były w 2014 oraz 2015 r.

W ramach 4 osi priorytetowej ogłoszonych zostało w toku realizacji RPO WZ 12 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Wszystkim wnioskodawcom, których projekty zostały pozytywnie ocenione, zaproponowano dofinansowanie, tym samym w w/w konkursach nie istnieją listy rezerwowe projektów. Z wnioskodawcami, którzy pozytywnie przeszli etap weryfikacji formalno-prawnej (przeprowadzanej już po uchwale Zarządu Województwa o przyznaniu dofinansowania) podpisano umowy o dofinansowanie. 8 wnioskodawców zrezygnowało z podpisania umowy o dofinansowanie, 11 wnioskodawców zrezygnowało z realizacji projektu przed podjęciem uchwały o dofinansowaniu, zaś w przypadku 10 beneficjentów umowy o dofinansowanie zostały rozwiązane (w tym 7 z inicjatywy beneficjenta i 3 z inicjatywy IZ RPO WZ).

1.3.3.5 Postęp wdrażania priorytetu 5 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



5 OŚ PRIORYTETOWA TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA

I półrocze 2015 r.

- **2** – liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **2 425 954,07 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **0,72%** alokacji przeznaczonej na Oś 5
- **8** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **5 310 958,90 PLN**, co stanowi **1,67 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 5
- **18 082 514,73 PLN** – kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **5,68%** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 5*
- **12 146 247,12 PLN** płatności EFRR przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **3,81%** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 5

*Wartość nie jest zgodna z raportem udostępnionym w KSI SIMIK (raport nie uwzględnia kwot wycofanych). W związku z powyższym IZ RPO WZ wylicza wartość wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym odejmując *wartość od uruchomienia programu w roku 2014 od wartości od uruchomienia w I półroczu 2015*. Raporty od uruchomienia programu uwzględniają kwoty wycofane.

Kwota przeznaczona na realizację 5 osi priorytetowej wynosi **318 493 670,00 PLN** (z EFRR) co stanowi **9% alokacji** przeznaczonej na Program.


Postęp finansowy

Tabela 8 Postęp finansowy dla osi 5 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)

Postęp finansowany od uruchomienia programu dla osi 5									
Oś	Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
	Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		wartość EFRR		Wartość EFRR	
5	205	472 494 695,74	124	309 269 855,97	97,01	257 482 378,63	80,84	246 060 623,76	77,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK2007-2014

Wykres 14 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 5 priorytetowej od początku realizacji Programu (mln PLN)

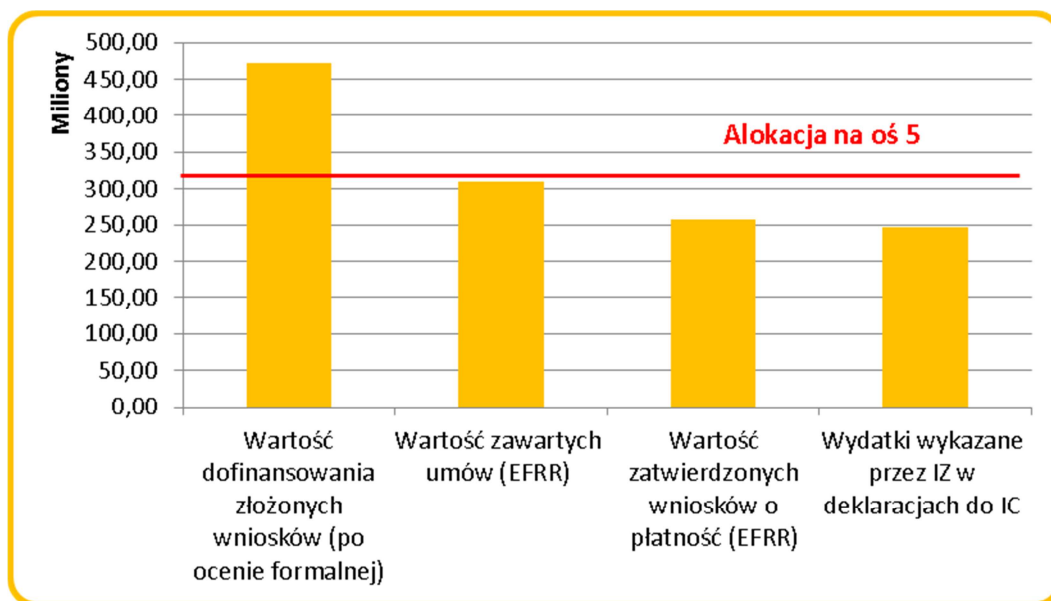

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2015 r. nie ogłoszono żadnego naboru w trybie konkursowym. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku trybu systemowego i indywidualnego.

Nabory planowane:

W kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Efekty realizacji 5. Osi Priorytetowej *Turystyka, kultura i rewitalizacja* mierzone są za pomocą 5 wskaźników produktu i 4 rezultatu, są to następujące **wskaźniki produktu**:

- *liczba projektów z zakresu turystyki* (działania: 5.1 Infrastruktura turystyczna, 5.3 Ścieżki rowerowe oraz 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego),
- *liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej* (działania: 5.1 Infrastruktura turystyczna oraz 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego),
- *liczba projektów z zakresu kultury* (działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz działanie 5.6 Wsparcie wydarzeń kulturalnych),
- *liczba nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych* (działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego),
- *liczba projektów z zakresu rewitalizacji* (działanie 5.5 Rewitalizacja);

oraz **wskaźniki rezultatu**:

- *liczba utworzonych miejsc pracy* (działania: 5.1 Infrastruktura turystyczna, 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 5.3 Ścieżki rowerowe, 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego),
- *liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej* (działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna),
- *liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury* (działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz działanie 5.6 Wsparcie wydarzeń kulturalnych),
- *powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji* (działanie 5.5 Rewitalizacja).

Od uruchomienia Programu do czerwca 2015 r. w ramach 5. Osi Priorytetowej *Turystyka, kultura i rewitalizacja* zrealizowano 75 projektów⁸ (z czego 12 w I półroczu 2015 r.), co skutkuje wykonaniem dużej części z założonych wskaźników. Z analizy zawartych umów wynika, że do końca 2015 r. zostaną zrealizowane wartości docelowe wszystkich wskaźników produktu i rezultatu, a niektóre z nich znacznie przekroczone. Na tej podstawie można stwierdzić, że wdrożenie poszczególnych projektów przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu, a w efekcie wzrostu znaczenia turystyki jako czynnika pobudzającego rozwój społeczno-gospodarczy województwa.

W ramach 5. Osi Priorytetowej od początku realizacji Programu zakończono 29 projektów z zakresu *turystyki*, w tym 5 w I półroczu 2015 roku. Już na obecną chwilę wskaźnik ten zrealizowany jest na poziomie 290,0%, a na podstawie liczby zawartych umów szacuje się że do końca roku zostaną wdrożone 54 projekty, tym samym wskaźnik ponad pięciokrotnie przekroczy wartość docelową (540,0%).

Zakończone projekty dotyczyły głównie poddziałania 5.1.1 *Infrastruktura turystyki*, w ramach którego od uruchomienia Programu zrealizowano 21 projektów (zawarto 39 umów o dofinansowanie). Projekty zostały zakończone również w ramach poddziałania 5.1.2 *Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych* (2 zakończone projekty, 6 podpisanych umów), działania 5.3 *Ścieżki rowerowe* (5 zakończonych projektów, 8 podpisanych umów) oraz działania 5.4 *Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego*, w którym w ramach dostępnej alokacji został zrealizowany jeden zakontraktowany projekt indywidualny.

Znaczne przekroczenie szacowanej wartości w zakresie turystyki wynika z decyzji IZ RPO WZ o zmniejszeniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu z dopuszczalnych 85% do 50% (60% w zakresie gmin objętych załącznikiem 6 do RPO) wydatków kwalifikowalnych, co automatycznie pozwoliło na dofinansowanie większej liczby złożonych projektów.

W wyniku realizacji powyższych projektów *wybudowano (lub zmodernizowano) 59 obiektów infrastruktury turystycznej* (w tym 12 w 2015 r.), co już na obecnym etapie wdrażania 5. Osi Priorytetowej pozwoliło na prawie dziesięciokrotne przekroczenie zakładanej na 2015 r. wartości docelowej wskaźnika ustalonej na poziomie 6 szt. Na podstawie danych zawartych we wnioskach aplikacyjnych, szacuje się, że do końca roku zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych aż 99 obiektów. Jednak to przekroczenie szacowanej realizacji wynika z błędnego zinterpretowania przez wnioskodawcę definicji obiektu infrastruktury turystycznej i wliczenia do deklarowanej wartości wskaźnika również turystycznych i rekreacyjnych obiektów użytkowych należących do tzw. obiektów małej architektury.

Wskaźnik *Liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej* jest nadal na poziomie zerowym (wg danych IZ RPO WZ na koniec okresu sprawozdawczego z systemu informacji turystycznej skorzystało 94 575 a więc wskaźnik został zrealizowany w 52,54% - IZ RPO WZ uzupełni dane w systemie). Jednakże na podstawie podpisanych umów szacuje się, że do końca 2015 r. z systemu informacji turystycznej, jaki powstanie dzięki przedmiotowym projektom skorzystają 1 218 529 osoby, w związku z czym zakładana wartość docelowa wskaźnika *Liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej* (180 000 osób) zostanie przekroczona ponad sześciokrotnie. Przyczyną przeszacowania wartości wskaźnika, jest fakt, iż na etapie opracowywania RPO WZ nie wiedziano, jakie konkretnie projekty będą realizowane w ramach przedmiotowego poddziałania. Tymczasem w wyniku konkursu nr RPOWZ/5.1.2/2010/1 zostały wyłonione projekty dotyczące ważnych z punktu widzenia ruchu turystycznego miast. Do końca czerwca 2015 r. podpisano trzy umowy o dofinansowanie (na ich podstawie dokonano obliczeń wartości szacowanej wskaźnika): *Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie*, *Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu oraz Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego*. Wg szacunków tylko Świnoujście odwiedza rocznie ok 2,5 mln osób (informacje wskazane przez władze miasta Świnoujście), z których duża część korzysta z systemu informacji turystycznej. W ramach niniejszego projektu bowiem planuje się m. in. zakup i instalację 3 szt. informatów

⁸ W tym 6 umów o dofinansowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji

(czynnych całą dobę). Lokalizacja przedmiotowych urządzeń została wybrana w taki sposób, aby zoptymalizować ich wykorzystanie i ułatwić uzyskanie informacji osobom przybywającym z zagranicy:

- hol Terminala Promowego Świnoujście - największy w Polsce i najnowocześniejszy terminal nad Bałtykiem, obsługujący głównie turystów podróżujących ze/do Skandynawii. Rokrocznie obsługuje ok. 750 000 pasażerów,
- stacja „Centrum” niemieckiej kolejki UBB - dla turystów podróżujących koleją z/do Niemiec, jak również turystów rowerowych,
- przed Informacją Turystyczną - na potrzeby pozyskania informacji poza godzinami funkcjonowania Informacji Turystycznej.

Wszystkie opisane powyżej projekty mają wpływ na poziom wykonania wskaźnika kluczowego, jakim jest *Liczba utworzonych miejsc pracy*. Do końca okresu sprawozdawczego dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom z zakresu turystyki, zatrudnienie znalazło 8 osób. W związku z powyższym wskaźnik został osiągnięty w 42,11%. Analizując zawarte umowy o dofinansowanie w ramach wszystkich działań z zakresu turystyki (5.1, 5.3 oraz 5.4), szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie utworzonych 90,17 miejsc pracy, co oznacza ponad czterokrotne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika (na etapie opracowywania RPO WZ zakładano utworzenie 19 miejsc pracy).

Mimo znacznego przekroczenia wartości wskaźników, działania na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej i przyciągnięcia turystów spoza regionu wciąż pozostają kluczowe dla stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. W ramach rozwoju infrastruktury turystycznej (działanie 5.1) wspierane są projekty związane z budową oraz rozbudową infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym w szczególności turystyki wodnej, jak również związane z budową markowych produktów turystycznych w tym zakresie.

Wyznacznikiem potencjału i atrakcyjności turystycznej regionu jest wielkość ruchu turystycznego wyrażona m.in. *Liczbą udzielonych noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 tys. mieszkańców*. Według danych GUS w 2014 wartość wskaźnika w województwie zachodniopomorskim wyniosła 6 526 osoby - była najwyższa wśród województw. Skala realizowanych przedsięwzięć z pewnością przyczyniła się i na pewno przyczyni się do poprawy tempa tego wzrostu w przyszłości.

Od początku realizacji Programu do końca czerwca 2015 r. zrealizowano 22 projekty z zakresu kultury (z czego 3 w 2015 r.). Już na obecną chwilę wskaźnik ten jest wykonany w 550%, a biorąc pod uwagę, że w ramach działania 5.2 *Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego* w okresie od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego podpisano 32 umowy, zrealizowana wartość wskaźnika w 2015 r. przekroczy ośmiokrotnie zakładaną wartość docelową (ustaloną na poziomie 4 szt.). Dzięki wdrożonym projektom udało się *wybudować bądź zmodernizować 26 obiektów kulturalnych* (z czego w 2015 r. zakończono inwestycje w 5 obiektach), a to z kolei sprawiło, że już teraz osiągnięty został zakładany poziom docelowy (371,43% wartości wskaźnika). Szacuje się, że do końca 2015 r. dzięki środkom z RPO WZ w ramach 5. Osi Priorytetowej powstanie bądź zostanie zmodernizowanych 46 obiektów kulturalnych, a wartość docelowa wskaźnika (wyznaczona na poziomie 7 szt.) zostanie przekroczona sześciokrotnie (657,14%). W 2015 r. z *efektów realizacji projektów z zakresu kultury skorzysta 2 021 704 osób*, co przy założonej wartości docelowej wskaźnika wynoszącej 540 000 osób, oznacza realizację na poziomie 374,39%. W 2015 r. wskaźnik ten osiągnął wartość 55 875 osób wg zatwierdzonych Wniosków o płatność końcową, natomiast wg danych IZ RPO WZ z efektów realizacji projektów z zakresu kultury skorzystało 139 514 osób (IZ RPO WZ uzupełni dane w systemie).

Znaczne przekroczenie wartości docelowych przedmiotowych wskaźników wynika ze zwiększenia dostępnej alokacji przeznaczonej na działanie 5.2 o 25,7%, co automatycznie pozwoliło na dofinansowanie większej liczby złożonych projektów.

Jednocześnie w ramach 5. Osi Priorytetowej rozszerzono zakres wsparcia o możliwość dofinansowania organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym, gwarantujących zwiększenie udziału lokalnych społeczności w życiu kulturalnym – wprowadzono dodatkowe działanie 5.6 *Wsparcie wydarzeń kulturalnych*, co pozwoli, na bardziej kompleksowe wsparcie obszaru kultury. Dodano również działanie 5.7 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 5*,

które umożliwi usprawnienie prac na najwcześniejszym etapie związanym z realizacją projektu, jak również poprawę efektywności całego dalszego procesu.

Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2015 r. dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom z zakresu kultury (działanie 5.2), utworzono 15,5 miejsc pracy (w tym 4 w 2015 r.). Biorąc pod uwagę zawarte umowy o dofinansowanie szacuje się, że do końca 2015 r. w wyniku realizacji przedmiotowych projektów przybędzie 35,5 *miejsc pracy*, podczas gdy na etapie opracowywania RPO WZ zakładano utworzenie 19 szt., co oznacza wykonanie na poziomie 186,84% zakładanej wartości docelowej. Znaczne przekroczenie wartości docelowej wynika z faktu, iż dzięki środkom pochodzącym z Programu zostanie zrealizowanych więcej projektów z zakresu kultury, co wprost przekłada się na mierzalne efekty, jakimi są nowe miejsca pracy dla mieszkańców województwa.

Wszystkie opisane powyżej projekty zarówno z zakresu turystyki (działania 5.1, 5.3 oraz 5.4) jak i kultury (działanie 5.2) mają wpływ na poziom wykonania wskaźnika kluczowego *Liczba utworzonych miejsc pracy*. Wyżej opisano wartości wskaźnika osobno dla tych dwóch grup projektów, natomiast łącznie w ramach wymienionych działań od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego utworzono 23,5 miejsc pracy (w tym 6 w 2015 r.). Na podstawie analizy zawartych umów o dofinansowanie szacuje się, że do końca 2015 r. w rezultacie zrealizowanych projektów powstanie 120567 nowych miejsc pracy, podczas gdy na etapie opracowywania RPO WZ zakładano utworzenie 38, co oznacza wykonanie na poziomie 330,71% zakładanej wartości docelowej.

Realizowane w ramach 5. Osi Priorytetowej projekty mają również przyczynić się do podniesienia atrakcyjności województwa poprzez rewitalizację i pobudzenie gospodarcze obszarów problemowych. Działania związane z rewitalizacją opisują dwa wskaźniki: *Liczba projektów z zakresu rewitalizacji* oraz *Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji*. Wsparcie procesu rewitalizacji ze środków RPO WZ jest prowadzone w ramach bezzwrotnego systemu dotacyjnego (5.5.1) oraz Inicjatywy JESSICA (5.5.2). Niezależnie od źródeł finansowania, inwestycje realizowane w ramach działania 5.5 muszą być ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji (LPR). Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2015 r. w ramach działania 5.5 podpisano 39 umów o dofinansowanie (w tym w ramach poddziałania 5.5.2 umowa na Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA oraz 6 umów związanych z refundacją kosztów poniesionych przez beneficjentów na przygotowanie LPR-ów), w 2015 r. podpisano 2 umowy (w ramach poddziałania 5.5.1.). Od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego zakończono realizację 24 projektów (w tym 6 dotyczących refundacji wydatków poniesionych na przygotowanie LPR-ów). W wartości wskaźnika *Liczba projektów z zakresu rewitalizacji* wykazywane są wyłącznie projekty infrastrukturalne realizowane w ramach poddziałania 5.5.1⁹. Na podstawie liczby zawartych umów szacuje się, że do końca 2015 roku zostanie zrealizowanych 32 projekty z zakresu rewitalizacji, co oznacza wykonanie na poziomie 400% zakładanej wartości docelowej. W wyniku realizacji projektów *zrewitalizowano obszar o powierzchni 7,91 ha* (z czego 4,4 ha w 2015 r.), co oznacza, że wskaźnik został zrealizowany w 617,97%. Szacuje się, że do końca 2015 r. *powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji* wyniesie 16,98 ha, tj. ponad trzynastokrotnie więcej niż zakładano (wartość docelowa została ustalona na poziomie 1,28 ha). Znaczne przekroczenie wartości docelowej wynika w głównej mierze z faktu, iż na etapie opracowywania RPO WZ nie przewidziano takiej aktywności podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie m.in. wspólnot mieszkaniowych.

Wśród projektów realizowanych w ramach poddziałania 5.5.1 *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych* znajdują się projekty z zakresu termomodernizacji budynków, przebudowy i renowacji budynków mieszkalnych, rewitalizacji przestrzeni publicznej, często w połączeniu z budową ogólnodostępnych urządzeń i obiektów rekreacyjnych, jak również związane z adaptacją budynków na cele społeczne np. świetlice środowiskowe.

Projekty rewitalizacyjne mają charakter wielowymiarowy – wpływają zarówno na poprawę jakości zdegradowanej przestrzeni publicznej, jak też na poprawę warunków życia ludności zamieszkującej obszary zdegradowane, niwelując różnice w możliwości rozwoju ludności zamieszkującej obszar zdegradowany

⁹ Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA (poddziałanie 5.5.2) zawarte są w podrozdziale 1.3.5 Inicjatywa Wspólnotowa Jessica

względem innych obszarów a także tworząc fundament dla dalszego rozwoju tych obszarów, w tym aktywizacji lokalnej społeczności i powstawania nowych miejsc pracy.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego alokacja przeznaczona na działanie 5.5 została wykorzystana w 98,77%

1.3.3.6 Postęp wdrażania priorytetu 6 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



6 OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITALNYCH

I półrocze 2015 r.

- **2** – liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **3 429 105,69 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **0,68 %** alokacji przeznaczonej na Oś 6
- **6** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **6 819 373,06 PLN**, co stanowi **1,42 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 6
- **32 424 804,33 PLN** – kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **6,77 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 6*
- **28 383 775,46 PLN** płatności EFRR przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **5,93 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 6

*Wartość nie jest zgodna z raportem udostępnionym w KSI SIMIK (raport nie uwzględnia kwot wycofanych). W związku z powyższym IZ RPO WZ wylicza wartość wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym odejmując *wartość od uruchomienia programu w roku 2014 od wartości od uruchomienia w I półroczu 2015*. Raporty od uruchomienia programu uwzględniają kwoty wycofane.

Kwota przeznaczona na realizację 6 osi priorytetowej wynosi **478 671 247,80 PLN** (z EFRR) co stanowi **13% alokacji** przeznaczonej na Program.


Postęp finansowy

Tabela 9 Postęp finansowy dla osi 6 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)

Postęp finansowy od uruchomienia programu dla osi 6									
Oś	Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
	Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		wartość EFRR		Wartość EFRR	
6	145	606 515 076,92	117	460 499 457,89	96,20	321 941 202,04	67,26	305 726 579,36	63,87

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK 2007-2013

Wykres 15 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 6 priorytetowej od początku realizacji Programu (mln PLN)

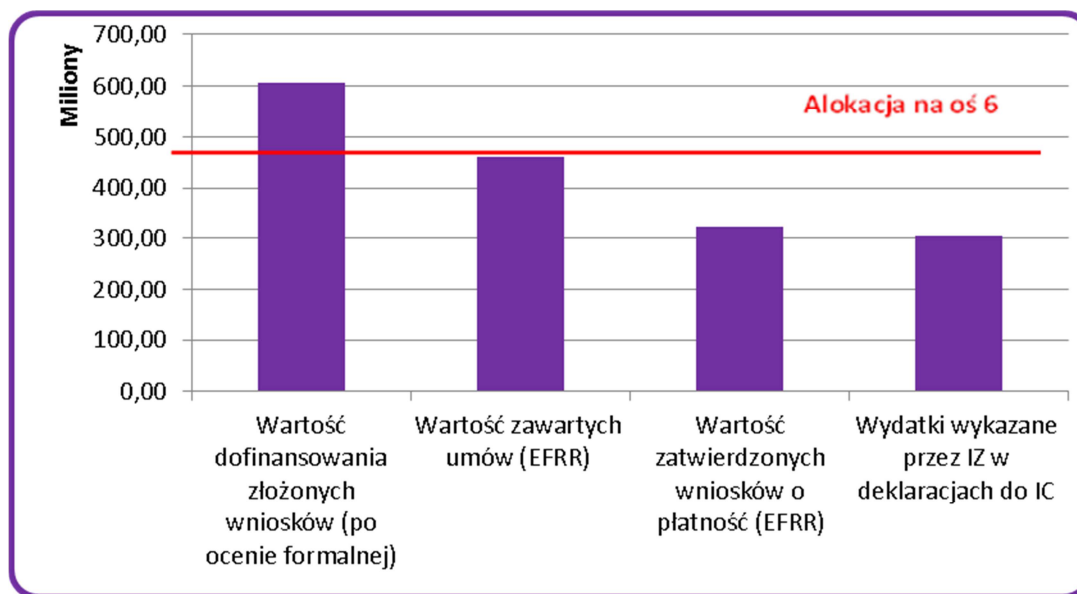

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2015 r. nie ogłoszono naborów w trybie konkursowym oraz w trybie indywidualnym i systemowym.

Nabory planowane:

W kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Od uruchomienia programu do końca czerwca 2015 r. w ramach 6. Osi Priorytetowej *Rozwój Funkcji Metropolitalnych* z beneficjentami podpisano 117 umów o dofinansowanie¹⁰ (w tym 6 w 2015 r.), zakończono realizację 60 projektów (12 w 2015 r.), w tym 58 infrastrukturalnych oraz 2 związanych z refundacją kosztów poniesionych przez beneficjentów na przygotowanie LPR-ów. Na tej podstawie dokonano oszacowania realizacji wskaźników do 2015 roku, a także oceniono bieżący postęp rzeczowy.

Efekty realizacji 6. Osi Priorytetowej *Rozwój Funkcji Metropolitalnych* są mierzone poprzez 4 wskaźniki produktu i 5 wskaźników rezultatu. Są to następujące **wskaźniki produktu**:

- *liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej* (działania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym i 6.5 Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym),
- *pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej* (działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym),
- *liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast*, w tym:
 - z zakresu *turystyki* (działania 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym i 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym),
 - z zakresu *kultury* (działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym oraz działanie 6.7 Wsparcie wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolitalnym),
 - z zakresu *rewitalizacji* (działanie 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym),

¹⁰ W tym 2 umowy o dofinansowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji

- *liczba nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych* (działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym);

oraz **wskaźniki rezultatu:**

- *liczba utworzonych miejsc pracy* (działania 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym, 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym, 6.5 Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym),
- *liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej* (działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym),
- *liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury* (działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym oraz działanie 6.7 Wsparcie wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolitalnym),
- *przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego* (działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym),
- *powierzchnia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poddana rewitalizacji* (działanie 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym).

Z analizy zawartych umów wynika, że zostaną osiągnięte wartości docelowe wszystkich wskaźników produktu i rezultatu, a niektóre z nich znacznie przekroczone.

Od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego ukończono realizację 7 projektów z zakresu infrastruktury transportowej (wskaźnik *Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej* agreguje przedsięwzięcia realizowane w ramach działań 6.4 i 6.5). Zakończone projekty dotyczyły przede wszystkim działania 6.4, w którym podpisano 7 umów o dofinansowanie (wszystkie projekty wyłonione w trybie konkursowym). Natomiast w działaniu 6.5 realizowany jest jeden projekt indywidualny *Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie*, w ramach którego w 2014 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową.

Biorąc pod uwagę, że w ramach 6. Osi przewidywano realizację 5 projektów transportowych, na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik został zrealizowany w 140%. Biorąc pod uwagę wszystkie podpisane umowy o dofinansowanie, szacuje się wykonanie wskaźnika do końca 2015 r. wzrośnie do poziomu 9 sztuk, co w rezultacie spowoduje wykonanie założonych wartości docelowych w 180%.

W wyniku realizacji przedmiotowych projektów *zakupiono tabor komunikacji miejskiej o pojemności 8 491 miejsc*, podczas gdy na etapie programowania zakładano pojemność na poziomie 3 000 osób. W rezultacie już teraz wartość docelowa wskaźnika została przekroczona prawie trzykrotnie (283,03%). Dalsze pozytywne konsekwencje, to wzrost liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej – do końca czerwca 2015 roku to 500 osób. Na podstawie zawartych umów o dofinansowanie IZ RPO WZ szacuje się, że do końca 2015 r. przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego wyniesie 386 362 osoby, podczas gdy wartość docelową wyznaczono na poziomie 100 000). Przekroczenie docelowych wartości wskaźników dla projektów z zakresu transportu miejskiego wynika z faktu, iż w ramach działania 6.4 pięć spośród siedmiu projektów dotyczy zakupu bądź modernizacji taboru komunikacji miejskiej (5 z nich dotyczy inwestycji w Szczecinie) a dwa – infrastruktury. Na etapie tworzenia RPO WZ nie przewidywano tak dużej aktywności przewoźników. Jednakże należy zauważyć, że wartości szacowane zostały określone głównie w 2010 r. (6 z 7 umów o dofinansowanie w ramach działania 6.4 zostało podpisanych w 2010 r.). Na przestrzeni lat w Polsce i w województwie (w tym głównie w Szczecinie) odnotowuje się spadek ludności korzystającej z transportu miejskiego. Malejący trend w przewozach pasażerskich komunikacją miejską z jednej strony może być wynikiem stałego wzbogacania się społeczeństwa, co wiąże się między innymi z liczbą posiadanych samochodów w gospodarstwie domowym. Z drugiej strony ciągle niska świadomość ekologiczna mieszkańców oraz nadal niezbyt wysoka atrakcyjność transportu publicznego (przestarzały tabor, brak udogodnień systemowych jak np. wspólny bilet, centra przesiadkowe) mogą wpływać na rezygnację z transportu publicznego na rzecz indywidualnego transportu samochodowego. Należy również też zwrócić uwagę na trendy demograficzne, które również nie sprzyjają utrzymaniu wskaźnika przewozów pasażerskich na przynajmniej stałym poziomie.

Beneficjenci dodatkowo wskazują na liczne remonty na trasach komunikacji miejskiej, uzasadniając nimi problemy w realizacji przedmiotowego wskaźnika w składanych do IZ RPO WZ sprawozdaniach z trwałości. Beneficjenci zwracają jednocześnie uwagę na to, że planowane uruchomienie nowych tras komunikacji miejskiej w Szczecinie, w tym Szybkiego Tramwaju Szczecińskiego, pozwoli na osiągnięcie wskaźnika.

6. Oś Priorytetowa *Rozwój Funkcji Metropolitalnych* obejmuje również projekty mające na celu wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Od uruchomienia Programu ukończono realizację 25 projektów *zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast z zakresu turystyki* (działania 6.1 i 6.3), w tym 4 w 2015 roku. IZ RPO WZ szacuje, że do 2015 r. wartość ta wzrosła do 54 szt. (41 projektów w ramach działania 6.1 oraz 13 projektów w ramach działania 6.3), co zapewni sześciokrotne wykonanie założonej wartości wskaźnika. W efekcie realizacji przedmiotowych projektów z systemu informacji turystycznej skorzysta w 2015 r. 325 500 osób, a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 217%. Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu, wyznaczonej na poziomie 150 000 osób, wynika z faktu, iż 2 spośród 7 projektów realizowanych w ramach poddziałania 6.1.2. *Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym* to projekty w zakresie rozwoju informacji turystycznej w województwie, z których jeden dotyczy systemu informacji turystycznej w stolicy regionu – Szczecinie. Potencjał turystyczny Szczecina generuje znaczny ruch turystyczny oraz duże potrzeby związane z jego obsługą. Przekłada to się wprost na liczbę osób korzystających z systemu informacji turystycznej, która przekroczy założoną na etapie konstruowania RPO WZ wartość.

Mimo przekroczenia wartości wskaźników, działania na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) wciąż pozostają kluczowe dla budowania potencjału obszaru. W ramach rozwoju infrastruktury turystycznej (działanie 6.1) wspierane są projekty, które przyciągną turystów spoza regionu i wpisują się w szersze ramy planów rozwoju turystyki w SOM, w tym m.in. związane z budową oraz rozbudową infrastruktury służącej rozwojowi turystyki wodnej. Służyło temu 6 naborów ogłoszonych od początku realizacji Programu w ramach poddziałania 6.1.1. (łącznie tryb indywidualny i konkursowy), w tym 1 (konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2014/) w okresie sprawozdawczym. W związku z powyższym alokacja w przedmiotowym działaniu została wykorzystana 98,29%.

W okresie wdrażania Programu zakończono realizację 13 projektów *zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast z zakresu kultury* (z czego 1 w 2015 r.), z wyniku realizacji których skorzystało już 41 717 osób. Mimo, że wskaźnik został zrealizowany w 8,34%, IZ RPO WZ na podstawie podpisanych dotychczas umów szacuje się, że do 2015 r. zrealizowanych zostanie aż 28 takich projektów, tj. siedmiokrotnie więcej niż zakładano na etapie tworzenia RPO WZ. Dzięki realizacji opisanych wyżej projektów zostanie wybudowanych bądź zmodernizowanych 28 obiektów kulturalnych (700% realizacji wskaźnika), a 907 430 osób skorzysta z efektów tych projektów (181,49% realizacji wskaźnika). Ponadto wg danych uzyskanych przez IZ RPO WZ z efektów projektów z zakresu kultury skorzystało już 58 966 osób (IZ RPO WZ uzupełni dane w systemie). Warto jednocześnie podkreślić, że zakontraktowano już 97,74% alokacji z EFRR dostępnej dla działania 6.2. Przekroczenie wartości docelowych wskaźników wynika z dużej aktywności potencjalnych beneficjentów - w naborach przeprowadzonych w trybie konkursowym przeważały mniejsze projekty, co pozwoliło na wsparcie większej ich liczby. Poza tym od początku realizacji Programu zwiększono dostępną na przedmiotowe działanie alokację o 38,9%, co pozwoliło na sfinansowanie większej ilości projektów.

Jednocześnie w ramach 6. Osi Priorytetowej już w 2012 r. rozszerzono zakres wsparcia o możliwość realizacji działań z zakresu promocji regionu jako atrakcyjnego turystycznie oraz dofinansowania organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym, gwarantujących zwiększenie udziału mieszkańców w życiu kulturalnym – wprowadzono dodatkowe działanie 6.7 *Wsparcie wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolitalnym*, co pozwoli, na bardziej kompleksowe wsparcie obszaru kultury. Dodano również działanie 6.8 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6*, które umożliwi usprawnienie prac na najwcześniejszym etapie związanym z realizacją projektów, jak również poprawę efektywności całego dalszego procesu.

Wszystkie opisane projekty (działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) mają wpływ na realizację wskaźnika kluczowego – *Liczba utworzonych miejsc pracy*. Mimo zakończenia do końca czerwca 2015 r. 45 projektów infrastrukturalnych, wskaźnik ten wynosi 1. Szacuje się jednak, że do końca 2015 r. dzięki projektom realizowanym w ramach 6. Osi ma powstać 86,5 etatów, a to oznacza przekroczenie zakładanego poziomu wskaźnika (48 etatów) o 80,21%. Na podstawie umów podpisanych w okresie od uruchomienia Programu do końca czerwca 2015 r. szacuje się, że projekty z zakresu turystyki wygenerują 56,5 dodatkowych miejsc pracy (171,21% docelowej wartości wskaźnika), z zakresu kultury – 28 etatów (200% docelowej wartości wskaźnika) i z zakresu transportu – 2 etaty (200%). Znaczne przekroczenie wartości docelowej wynika z faktu, iż dzięki środkom pochodzącym z Programu zostanie zrealizowanych więcej projektów z zakresu, co wprost przekłada się na mierzalne efekty, jakimi są nowe miejsca pracy dla mieszkańców województwa.

Wsparcie procesu rewitalizacji ze środków RPO WZ jest prowadzone w ramach bezzwrotnego systemu dotacyjnego (6.6.1) oraz Inicjatywy JESSICA (6.6.2). Niezależnie od źródeł finansowania, inwestycje realizowane w ramach działania muszą być ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji (LPR). Od uruchomienia programu do końca czerwca 2015 r. w ramach działania 6.6 podpisano 25 umów o dofinansowanie, w tym umowę na utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA (poddziałanie 6.6.2) i dwie umowy związane z refundacją kosztów poniesionych przez beneficjentów na przygotowanie LPR-ów.

Działanie 6.6 związane z rewitalizacją na obszarze metropolitalnym opisują dwa wskaźniki: (1) *Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast z zakresu rewitalizacji* a także (2) *Powierzchnia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poddana rewitalizacji*. W wartości wskaźnika dotyczącego liczby projektów wykazywane są wyłącznie projekty infrastrukturalne realizowane w ramach poddziałania 6.6.¹¹. Na podstawie dotychczas podpisanych umów szacuje się, że do końca 2015 roku zostanie zrealizowanych 22 projekty z zakresu rewitalizacji, podczas gdy na etapie konstruowania Programu zakładano 5 szt. (440% docelowej wartości wskaźnika). Dzięki tym projektom w *obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego rewitalizacji zostanie poddany teren o powierzchni 9,55 ha*, tj. dwukrotnie większy niż zakładano (191% realizacji wskaźnika). Przekroczenie wartości docelowych wynika w głównej mierze z faktu, iż na etapie programowania nie przewidziano takiej aktywności podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie, w tym m.in. TBS-ów oraz wspólnot mieszkaniowych.

Projekty rewitalizacyjne mają charakter wielowymiarowy – wpływają zarówno na poprawę jakości zdegradowanej przestrzeni publicznej, jak też na poprawę warunków życia ludności zamieszkującej obszary zdegradowane, niwelując różnice w możliwości rozwoju ludności zamieszkującej obszar zdegradowany względem innych obszarów a także tworząc fundament dla dalszego rozwoju tych obszarów, w tym aktywizacji lokalnej społeczności i powstawania nowych miejsc pracy.

Wśród projektów realizowanych w ramach poddziałania 6.6.1 znajdują się m.in. projekty z zakresu renowacji budynków mieszkalnych, rewitalizacji przestrzeni publicznej, również w połączeniu z budową ogólnodostępnych urządzeń i obiektów rekreacyjnych jak również związane z adaptacją budynków na cele społeczne np. świetlice środowiskowe.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego alokacja przeznaczona na działanie 6.6 została wykorzystana w 98,16%.

¹¹Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA (poddziałanie 5.5.2) zawarte są w podrozdziale 1.3.5 Inicjatywa Wspólnotowa Jessica

1.3.3.7 Postęp wdrażania priorytetu 7 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



7 OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

I półrocze 2015 r.

- **0** – liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **0,00 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **0%** alokacji przeznaczonej na Oś 7
- **0** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **0,00 PLN**, co stanowi **0 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 7
- **10 312 874,27 PLN** – kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **3,89%** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 7*
- **11 733 705,69 PLN** płatności EFRR przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **4,42%** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 7

*Wartość nie jest zgodna z raportem udostępnionym w KSI SIMIK (raport nie uwzględnia kwot wycofanych). W związku z powyższym IZ RPO WZ wylicza wartość wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym odejmując wartość od uruchomienia programu w roku 2014 od wartości od uruchomienia w I półroczu 2015. Raporty od uruchomienia programu uwzględniają kwoty wycofane.

Kwota przeznaczona na realizację 7 osi priorytetowej wynosi **265 349 830,07 PLN** (z EFRR) co stanowi **7% alokacji** przeznaczonej na Program.


Postęp finansowy

Tabela 10 Postęp finansowy dla osi 7 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)

Postęp finansowany od uruchomienia programu dla osi 7									
Oś	Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
	Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		wartość EFRR		Wartość EFRR	
7	89	318 945 831,46	67	265 353 844,22	100,00	243 219 839,19	91,66	235 044 386,88	88,58

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI/SIMIK 2007-2013

Wykres 16 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 7 priorytetowej od początku realizacji Programu (mln PLN)

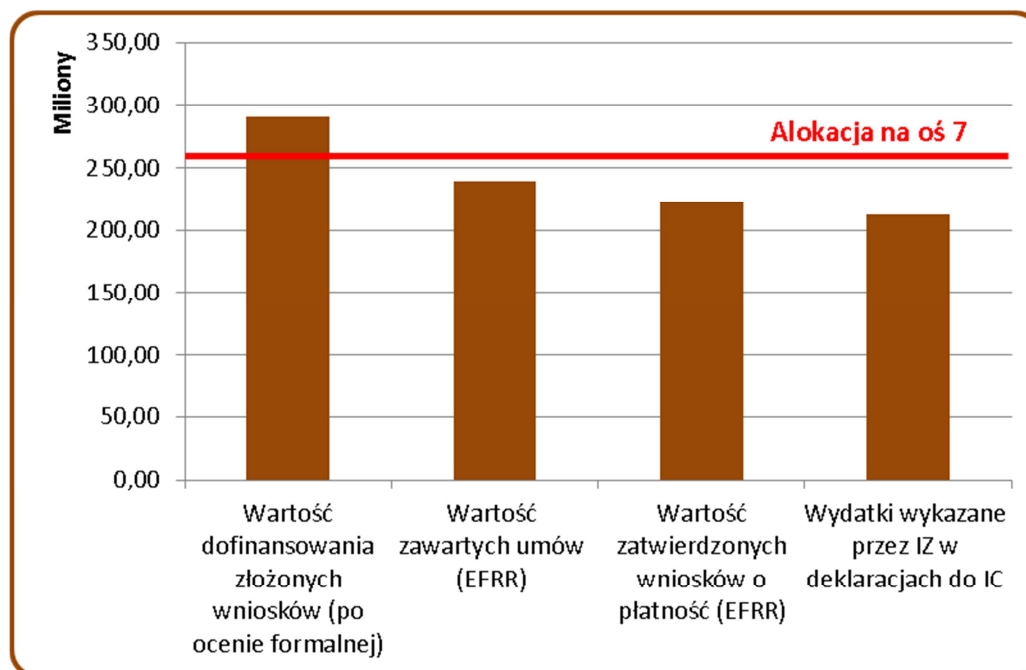

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2015 r. nie ogłoszono naborów w trybie konkursowym w ramach osi 7. Nie ogłoszono ich także w trybie systemowym i indywidualnym.

Nabory planowane:

W kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2015 r. w ramach 7. Osi Priorytetowej *Rozwój Infrastruktury Społecznej i Ochrony Zdrowia* z beneficjentami podpisano 67 umów o dofinansowanie, zakończono realizację 57 projektów (3 w 2015 r.). Na tej podstawie dokonano oszacowania realizacji wskaźników do końca 2015 roku, a także oceniono bieżący postęp rzeczowy.

Efekty realizacji 7. Osi Priorytetowej mierzone są za pomocą 6 wskaźników produktu i 4 rezultatu, w szczególności są to następujące **wskaźniki produktu**:

- liczba projektów z zakresu infrastruktury oświaty (działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna),
- liczba zmodernizowanych szpitali (działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- ilość zakupionego sprzętu medycznego (działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia (działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej (działanie 7.2 Infrastruktura sportowa),
- liczba projektów z zakresu infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych (działanie 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych);

oraz **wskaźniki rezultatu**:

- liczba studentów korzystających z efektów projektów (działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna),
- potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej pozostałej powstałej w wyniku realizacji projektów (działanie 7.2 Infrastruktura sportowa),

- *liczba osób korzystających z infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych* (działanie 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych).

Na podstawie analizy zawartych umów szacuje się, że wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu osiągną wartości docelowe założone do końca 2015 r., a większość z nich znacznie je przekroczy. To z jednej strony efekt wysokiego poziomu kontraktacji – przewidziana na 7. Oś Priorytetową alokacja została wykorzystana w 100%, z drugiej zaś - zmniejszenia maksymalnego poziomu dofinansowania projektu, co pozwoliło na dofinansowanie większej liczby projektów, a to z kolei wpłynęło pozytywnie na efektywność realizacji zamierzeń RPO.

Projekty realizowane w ramach poszczególnych działań 7. Osi Priorytetowej *Rozwój Infrastruktury Społecznej i Ochrony Zdrowia* dotyczą w szczególności poprawy jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej (działanie 7.1), sportowej (działanie 7.2), ochrony zdrowia (działanie 7.3), a także specjalistycznej infrastruktury przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych (działanie 7.4).

Od uruchomienia Programu w ramach 7. Osi zrealizowano 30 projektów z zakresu *infrastruktury oświaty*, z czego 3 w 2015 roku. Taka liczba przedsięwzięć inwestycyjnych, to znacznie więcej niż zaplanowano na etapie programowania (10 szt.), już w tym momencie bowiem wskaźnik osiągnął 300% wartości docelowej, a na podstawie liczby zawartych umów w ramach działania 7.1 szacuje się, że do końca 2015 r. w województwie zostaną zrealizowane aż 32 tego typu projekty. Znaczne przekroczenie zakładanej na etapie konstruowania Programu wartości docelowej w zakresie infrastruktury oświaty wynika przede wszystkim z ustalenia maksymalnego dofinansowania projektu w ramach działania 7.1 na poziomie 50% (60% w zakresie gmin objętych załącznikiem 6 do RPO WZ) wydatków kwalifikowalnych, co pozwoliło na dofinansowanie większej liczby przedsięwzięć i wykorzystanie dostępnej alokacji przeznaczonej na działanie 7.1 w 98,29%. Taki wysoki poziom kontraktacji i postęp w realizacji ma wpływ na wskaźnik rezultatu – według stanu na koniec czerwca 2015 r. z efektów ukończonych już projektów korzysta 5 729 studentów, a szacuje się, że do końca 2015 r. wartość ta znacznie wzrośnie i wyniesie 48 668 (243,34% wartości docelowej wskaźnika). Spośród 32 projektów realizowanych w ramach działania 7.1 *Infrastruktura edukacyjna* (wszystkie zakończone) dotyczy infrastruktury szkolnictwa wyższego (poddziałanie 7.1.1), 23 (w tym 21 zakończonych) infrastruktury gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (poddziałanie 7.1.2 oraz 7.1.3). W ramach poddziałania 7.1.2 zakłada się stworzenie odpowiednich warunków dla systematycznego podnoszenia jakości i standardów kształcenia uczniów, przede wszystkim zaś umożliwienie im doskonalenia i rozwijania kwalifikacji zawodowych. Stąd zdecydowana większość, bo 14 projektów dotyczy poprawy jakości specjalistycznej bazy edukacyjnej szkół zawodowych, w tym budowy specjalistycznych pracowni do praktycznej nauki zawodu, 1 – modernizacji bądź doposażenia placówek kształcenia specjalnego przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a pozostałe 8 – budowy, przebudowy i wyposażenia placówek.

Od uruchomienia Programu zrealizowano 15 projektów infrastrukturalnych z zakresu *ochrony zdrowia*, w efekcie czego już teraz została ponad dwukrotnie przekroczona wartość wskaźnika założona dla roku 2015 (6 szt.), natomiast liczba zawartych dotychczas umów wskazuje, że do końca 2015 r. na terenie województwa zrealizowanych będzie aż 22 tego typu projektów inwestycyjnych. Działanie 7.3 jest realizowane poprzez projekty wyłonione w trybie konkursowym i indywidualnym. W związku z naborami prowadzonymi w ramach tych dwóch trybów zakontraktowano 100% dostępnej dla działania 7.3. alokacji.

Dzięki środkom z RPO WZ wydatkowanym w ramach działania 7.3 udało się zmodernizować 12 szpitali – ponad dwukrotnie przekroczono zatem wartość wskaźnika założoną dla 2015 r. (5 obiektów), a przewiduje się, że do końca 2015 r. zmodernizowane zostaną kolejne 3 szpitale (ogółem 300% wartości docelowej wskaźnika). Dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia pozwoliło także na doposażenie placówek w specjalistyczny sprzęt. Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2015 r. zakupiono 488 sztuk sprzętu medycznego (wskaźnik *Ilość zakupionego sprzętu medycznego*). Umożliwiło to z kolei wykonanie 131 729 badań medycznych (wskaźnik *Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów*). Na podstawie analizy zawartych umów szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie zakupionych aż 2 714 sztuk sprzętu, co znacznie przekroczy wartość docelową ustaloną na poziomie 6 szt. Zakup tych urządzeń z kolei zwiększy dostępność do usług medycznych, szacuje się bowiem, że do końca 2015 r. za pomocą zakupionego sprzętu zostanie

przeprowadzonych 991 087 badań medycznych (zakładano 11 000 badań). Znaczne przekroczenie założonych na etapie konstruowania Programu wartości wskaźników w działaniu 7.3 wynika przede wszystkim z ustalenia maksymalnego dofinansowania projektu na poziomie 55% wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania 7.3.2 *Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia*, co pozwoliło na dofinansowanie większej liczby przedsięwzięć. Decyzja ta w widoczny sposób przełożyła się na ilość zakupionego sprzętu medycznego oraz potencjalną liczbę badań medycznych przeprowadzanych tym sprzętem. Ponadto pierwotnie ustalone wartości obu tych wskaźników dla roku 2015 wynikały z innej metodologii ich obliczania. Obecnie IZ RPO WZ w tym zakresie stosuje metodologię opracowaną dla potrzeb wskaźników kluczowych KSI – stąd szacowane wartości wskaźników znacznie przekraczają założone wartości docelowe.

Wzrost powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych wraz z rosnącą jakością opieki są niezbędnymi elementami rozwoju społeczno-gospodarczego i decydują w dużej mierze o poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców. Stąd, z uwagi na deficyty w zakresie dostępności do podstawowych i specjalistycznych usług ochrony zdrowia na terenie województwa zachodniopomorskiego, a jednocześnie demograficzne starzenie się społeczeństwa, konieczna jest realizacja przedsięwzięć, które poprawią dostęp do diagnostyki i usług specjalistycznych. Projekty realizowane w ramach działania 7.3 w istotny sposób wpłyną na jakość i dostępność infrastruktury służby zdrowia, a w efekcie lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 11 projektów z zakresu *infrastruktury sportowej*, co oznacza, że przekroczono oczekiwaną wartość wskaźnika o 10%. W związku z powyższym wszystkie projekty, dla których w ramach przedmiotowego działania zawarto umowy o dofinansowanie zostały zrealizowane. W rezultacie z powstałej w wyniku tych projektów *infrastruktury społecznej skorzystało* 118 525 osób, co już w chwili obecnej ponad pięciokrotnie przewyższa założoną wartość docelową dla 2015 r. ustaloną na poziomie 20 000 osób. Co więcej szacuje się, że do 2015 roku wskaźnik osiągnie wartość na poziomie 1 727 060 osób (jako, że jest to wskaźnik rezultatu wartości zostaną wykazane również w okresie trwałości projektów). Znaczne przekroczenie wartości docelowej wynika z przyjętej metodologii obliczania wskaźnika. Na etapie programowania przewidywano, że w ramach RPO WZ zostaną wsparte boiska przyszkolne, w trakcie wdrażania dominującymi okazały się być projekty dotyczące obiektów ogólnie dostępnych – boisk sportowych, czy stadionów miejskich, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, jak również turyści. W obiektach tych odbywają się również różnego rodzaju imprezy masowe, które także wpływają na wartość przedmiotowego wskaźnika. Zatem infrastruktura jaka powstanie w wyniku realizacji projektów przyczyni się nie tylko do rozpowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, ale też wśród osób w wieku poprodukcyjnym, co jest niezwykle ważne w kontekście spadku aktywności i zdrowotności młodzieży, a z drugiej strony wzrostu przeciętnej długości życia.

Wskaźniki dotyczące infrastruktury dla osób niepełnosprawnych (działanie 7.4) są realizowane przez dwa projekty indywidualne: (1) *Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych Na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia, nowe możliwości* oraz (2) *Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej*, które zaabsorbowały całą alokację przeznaczoną dla działania 7.4., zatem wskaźnik *liczba projektów z zakresu infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych* zostanie zrealizowany w 100,0%. Pierwszy z projektów został zakończony w 2011 r. Realizacja drugiego projektu została zakończona w I półroczu 2015 r. – w drugiej połowie roku zakończy się weryfikacja wniosku o płatność końcową, na podstawie którego IZ RPO WZ będzie mogła podać zrealizowaną wartość wskaźnika *Liczba osób korzystających z infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych*. IZ RPO WZ szacuje się, że do 2015 r. z infrastruktury wybudowanej w wyniku realizacji projektów będą korzystały 1 581 osoby (wartość docelową ustalono na poziomie 100 osób). Znaczne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika w głównej mierze z faktu, iż zrealizowano więcej projektów, niż zakładano na etapie opracowywania RPO WZ, w tym ważny z punktu widzenia osób niepełnosprawnych projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie pn. *Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej*. Celem projektu jest bowiem poprawa jakości i dostępności infrastruktury rynku pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Tym samym poprawa deficytu w zakresie infrastruktury rynku pracy dla osób niepełnosprawnych przyczyni się do pełniejszego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.


1.3.4 Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE

Z uwagi na fakt, iż 100% alokacji przeznaczonej na inicjatywę JEREMIE w województwie zachodniopomorskim zostało przekazane ostatecznym odbiorcom w roku 2014, konkursy i wsparcie dla sektora MŚP udzielane w od początku roku 2015 r to środki pochodzące ze spłat pożyczek oraz uwalniane z poręczeń.

W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone 3 konkursy tj.: nr 1.5/2015/ZFPJ – Reporęczenie, nr 4.2/2015/ZFPJ - Pożyczka Globalna i nr 5.2/2015/ZFPJ – Fundusz Kapitałowy. Do pierwszego konkursu przystąpiło dwóch wnioskodawców, którzy zostali pozytywnie ocenieni przez Menadżera, a podpisanie Umów Operacyjnych z pośrednikami finansowymi planowane jest na III kwartał 2015 r. W przypadku konkursu na Pożyczkę Globalną złożonych zostało 6 wniosków, z czego pozytywną ocenę uzyskało czterech z nich. W ramach konkursu na Fundusz Kapitałowy złożony został jeden wniosek, który został pozytywnie oceniony przez Menadżera, a Umowa Operacyjna zostanie podpisana w III kwartale 2015 r.

W pierwszym półroczu 2015r. zostały podpisane 3 Umowy Operacyjne z pośrednikami finansowymi w ramach ww. konkursu nr 2.4/2014/ZFPJ - Reporęczenie. Łącznie do końca czerwca 2015 roku zawartych zostało 40 Umów Operacyjnych z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 470 924 068 PLN, co stanowi 168,19% alokacji przeznaczonej na inicjatywę JEREMIE. Poniższy wykres prezentuje wartości Umów Operacyjnych w podziale na produkty.

Wykres 17 Wartość podpisanych Umów Operacyjnych z pośrednikami finansowymi w podziale na typy produktów

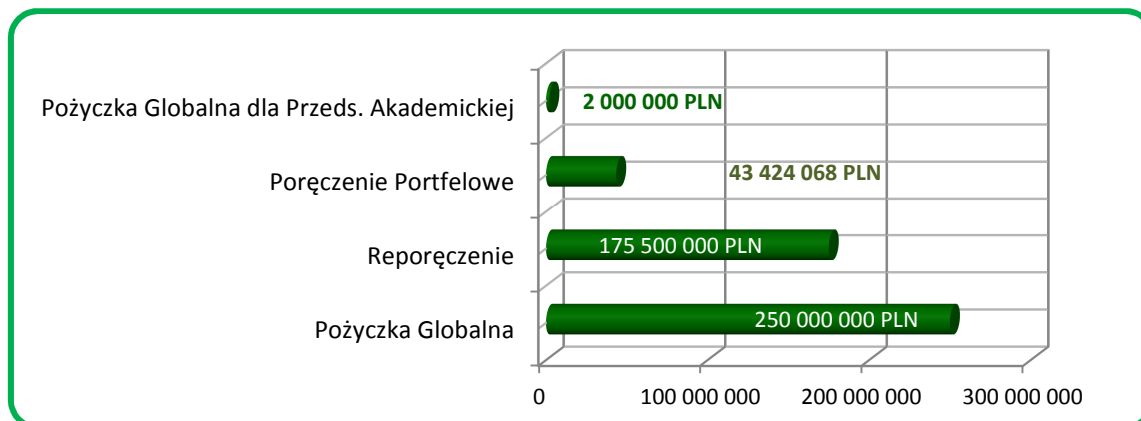

Źródło: opracowanie własne

W I półroczu br. pośrednicy finansowi wsparli 552 przedsiębiorców, a łącznie wg. stanu na koniec czerwca od początku realizacji inicjatywy aż 4 666 firmy, z czego 86 % stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Poniższa tabela prezentuje ilość wspartych przedsiębiorstw w podziale na wielkość przedsiębiorstwa.


Tabela 11 Liczba wspartych przedsiębiorstw w podziale na ich wielkość

Przedsiębiorstwo	I półrocze 2015r.	na koniec czerwca 2015 roku
Mikro	444	3 993
Małe	75	633
Średnie	3	40
Łącznie	552	4666

Źródło: opracowanie własne

Spośród wszystkich wspartych MŚP 935 to start-upy co stanowi 20% całego wsparcia udzielonego ze środków inicjatywy JEREMIE.

Wykres 18 Liczba wspartych MŚP w podziale na produkty z wyszczególnieniem start-up

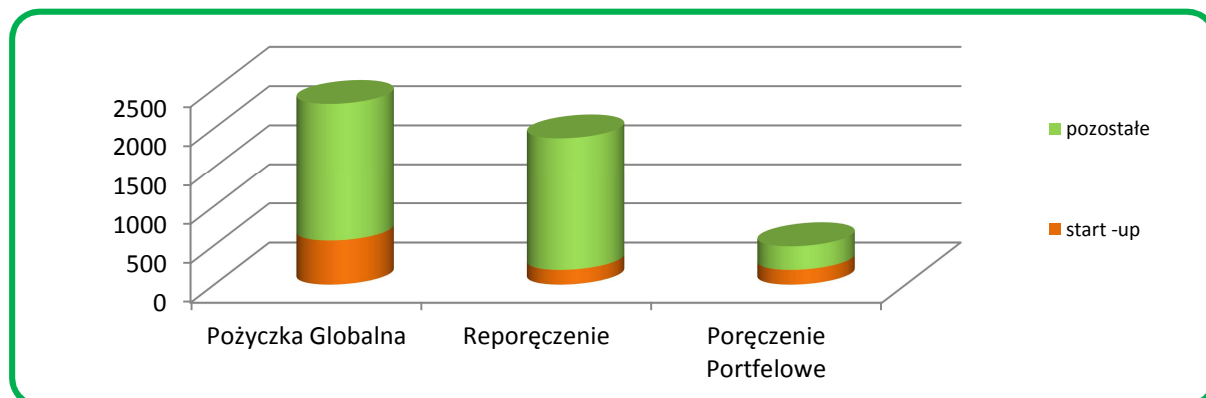


Źródło: opracowanie własne

Od początku realizacji projektu do końca okresu sprawozdawczego dzięki środkom inicjatywy JEREMIE przedsiębiorcy pozyskali wsparcie w wysokości ponad 705 mln PLN. Powyższa wartość jest znacznie większa w zestawieniu z kwotą wsparcia samymi środkami JEREMIE tj. 419,3 mln PLN.

Zatem należy stwierdzić, że każda złotówka pochodząca ze środków Inicjatywy JEREMIE generuje 1,68 PLN realnego wsparcia dla firm.

Istotną rolę w ramach instrumentów finansowych odgrywa tzw. dźwignia finansowa, której największe efekty można zauważyć w produkcie Reporęczenie, co widać na poniższym wykresie.


Wykres 19 Dźwignia finansowa produktu Reporęczenie

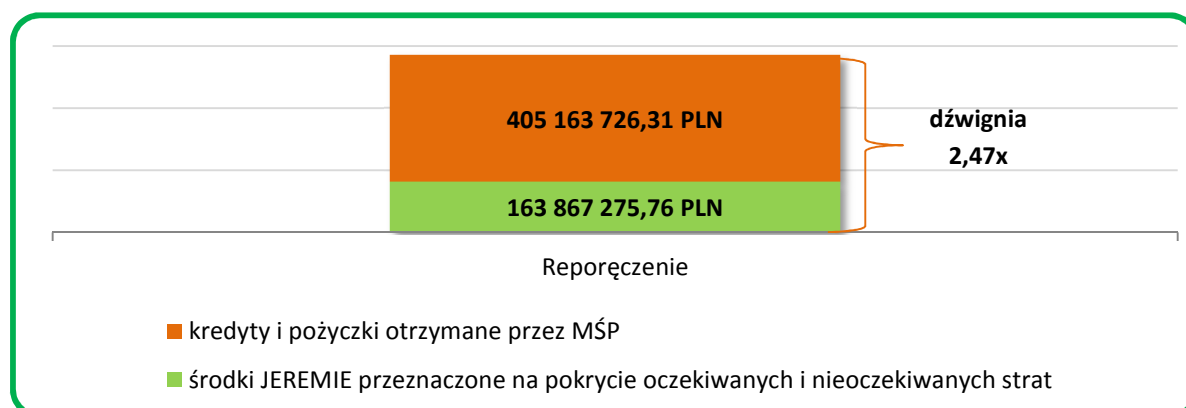

Źródło: opracowanie własne


Dotychczasowy przebieg wdrażania Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa zachodniopomorskiego sprawił, że tego typu instrument finansowania zwrotnego spotkał się z dużym zainteresowaniem, co widać na poniższych wykresach. Dzięki produktom odpowiadającym na zapotrzebowanie przedsiębiorców, alokacja inicjatywy JEREMIE została w 100% przekazana do MŚP w 2014 r. a obecne wsparcie udzielane jest z tzw. rewolwingu.

Wykres 20 Poziom wydatkowania środków Inicjatywy JEREMIE kumulatywnie w poszczególnych latach w okresie od 2010 r. do końca okresu sprawozdawczego

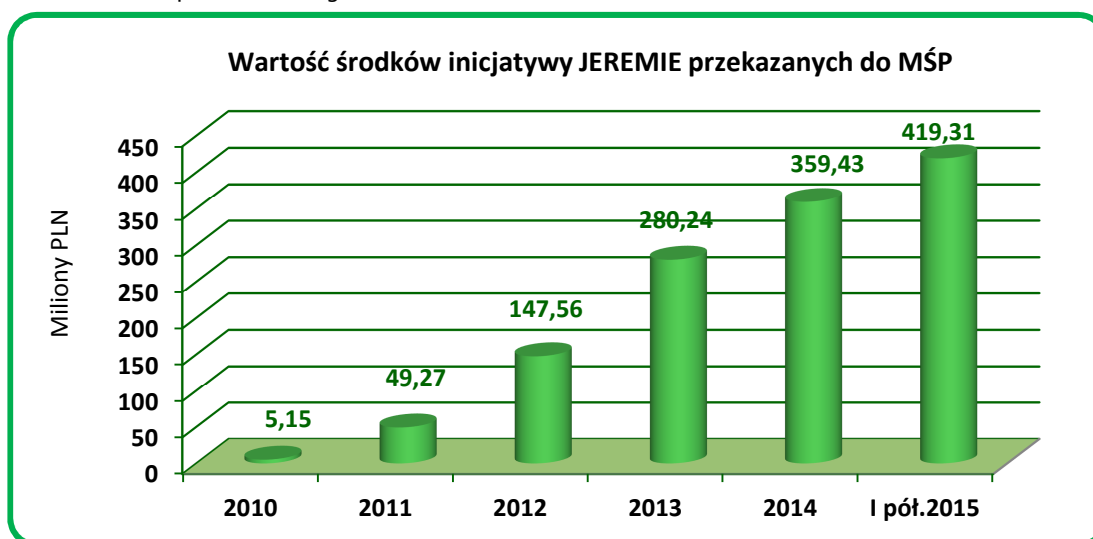

Źródło: opracowanie własne

Wykres 21 Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim w poszczególnych latach w okresie od 2010 r. do końca okresu sprawozdawczego

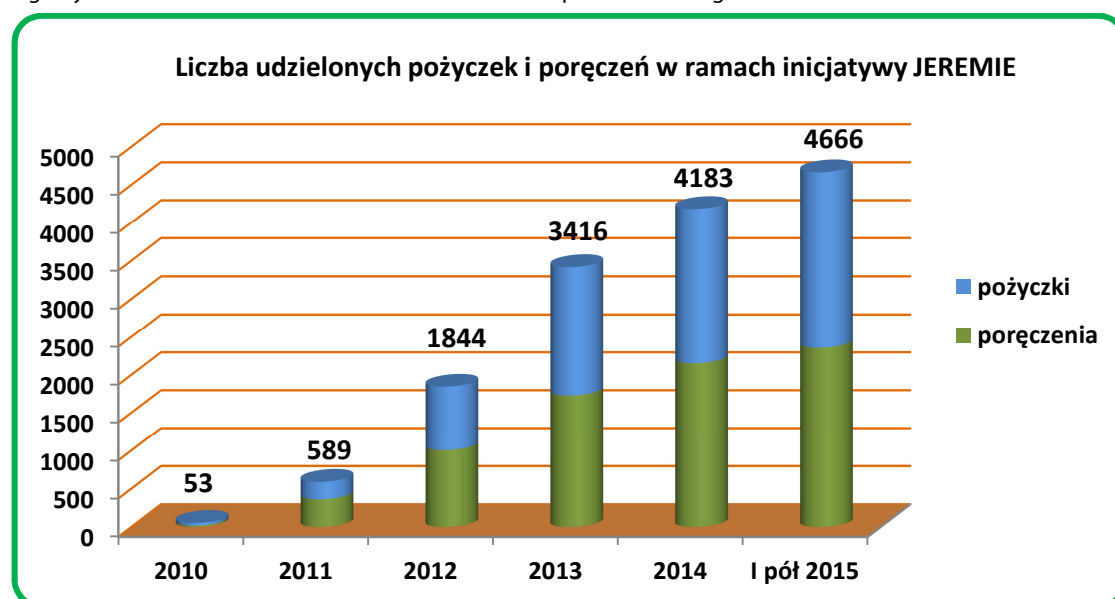

Źródło: opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. Opis omawianych kwestii został wskazany w poniższej tabeli.

Tabela 12 Posiedzenia Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE przeprowadzone w I półroczu 2015 r.

Lp.	Posiedzenie Rady Inwestycyjnej	Omawiane kwestie
1.	XXXI posiedzenie 13-14 stycznia 2015 r.	Podczas XXXI posiedzenia Rady Inwestycyjnej omówiono m.in. szanse produktów kapitałowych w priorytetach inwestycyjnych I III RPO WZ w perspektywie 2014-2020, stan wdrażania inicjatywy JEREMIE w woj. zachodniopomorskim i w Polsce, przygotowanie koncepcji Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej, analizę dokumentacji konkursowej na pożyczkę globalną – produkt dedykowany 4.2/2015/ZFPJ, analizę założeń ponownego uruchomienia konkursu na fundusz kapitałowy, informacje na temat struktury należności przedterminowych i występujących problemów ze spłatami u poszczególnych PF i zatwierdzono Roczny Plan Działań na rok 2015.
2.	XXXII posiedzenie 12 marca 2015 r.	Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim omówieniu m.in. stanu wdrażania inicjatywy JEREMIE oraz informacji na temat struktury należności przeterminowanych i problemów ze spłatami występującymi u poszczególnych Pośredników Finansowych, analizie dokumentacji konkursowej na pożyczkę globalną – produkt dedykowany 4.2/2015/ZFPJ, Reporęczenie (Konkurs 1.5/2015/ZFPJ) – analizie warunków biznesowych oraz wolnym wnioskom.
3.	XXXIII posiedzenie 19 czerwca 2015 r.	W trakcie XXXIII Posiedzenia Rady Inwestycyjnej omówiono m.in. stan wdrażania inicjatywy JEREMIE oraz informację na temat struktury należności przeterminowanych i problemów ze spłatami występującymi u poszczególnych Pośredników Finansowych, analizę poziomu szkodowości w Szczecińskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o., zainteresowanie konkursem na Produkt Kapitałowy 5.2/2015/ZFPJ, informację o stanie Konkursu 4.2/2015/ZFPJ – oraz założenia do Produktu dedykowanego (nowy produkt 4.3/2015/ZFPJ).

Źródło: opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym zarówno Menadżer, IZ RPO WZ, jak i pośrednicy finansowi organizowali i współorganizowali szereg działań w zakresie promocji i informacji inicjatywy JEREMIE m.in.:

- 12 marca 2015r. - spotkanie informacyjne w ramach nowego produktu Fundusz Kapitałowy, Szczecin
- 19 marca 2015r. - konferencję pt.: „Kapitał na rozwój – nowe możliwości”, Szczecin
- 30 marca 2015r. – spotkanie informacyjne w ramach nowego produktu Fundusz Kapitałowy, Warszawa
- 13-14 kwietnia 2015r. - konferencję pt. „Instrumenty inżynierii finansowej jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych dla MSP”, Ustronie Morskie
- 16-17 kwietnia 2015r. - konferencję pt. „Sprzedaż i wsparcie w sprzedaży w bankach Spółdzielczych SGB”, Ustka
- 27 maja 2015r.- konferencję „Giełda Produktów Finansowych”, Szczecin
- I kw. 2015 r. - kontynuowano akcję promującą inicjatywę JEREMIE na terenie poszczególnych powiatów województwa zachodniopomorskiego. Akcja polega na promocji inicjatywy podczas indywidualnych spotkań członków zespołu Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE z przedstawicielami urzędów i instytucji. W ramach kampanii odwiedzane były urzędy miast, gmin, powiatów, powiatowe urzędy pracy, urzędy skarbowe, uczelnie wyższe.

W kolejnym okresie sprawozdawczym Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE planuje organizować/współorganizować kolejne spotkania i konferencje, zwłaszcza te o charakterze cyklicznym dla Pośredników Finansowych oraz przedsiębiorstw, a także prowadzić działania mające na celu dalszą promocję Inicjatywy JEREMIE.

1.3.5 Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA

Od 29 lipca 2014 roku inicjatywa JESSICA w województwie zachodniopomorskim wdrażana jest w modelu bez Menadżera Funduszu Powierniczego.

Taki model wdrażania wynika z faktu, iż w dniu 29 stycznia 2014 roku uchwałą nr 122/14 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję w sprawie **wypowiedzenia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu Umowy o finansowaniu** zawartej w dniu 30 lipca 2009 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) .

W tym samym dniu Instytucja Zarządzająca RPO WZ wysłała do EBI pismo w powyższej sprawie, w związku z czym Umowa o finansowaniu **uległa rozwiązaniu z dniem 29 lipca 2014 roku.**

W związku z powyższym, w celu likwidacji Funduszu Powierniczego JESSICA i przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ obowiązków realizowanych dotychczas przez EBI, podpisane zostały stosowne trójporozumienia z poszczególnymi Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich.

Stan wdrażania inicjatywy JESSICA

W ramach inicjatywy JESSICA na terenie województwa zachodniopomorskiego działają dwa Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich, które zarządzają poniższymi kwotami:

1. Bank Ochrony Środowiska S.A. pełniący funkcję FROM poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym: **64 916 78, 52 zł** (kwota umowna 63 085 959 PLN plus narosłe odsetki)
2. Bank Zachodni WBK S.A., pełniący funkcję FROM na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym: **80 643 107,64 zł** (kwota umowna 77 349 389 PLN).

Od początku realizacji Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim dwa FROMy zawarły **18** umów inwestycyjnych z ostatecznymi beneficjentami na łączną kwotę środków Inicjatywy JESSICA w wysokości **149 458 412,27 PLN.**

Bank Ochrony Środowiska S.A. pełniący funkcję FROM poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym zawarł łącznie **10 umów** na kwotę ze środków Inicjatywy JESSICA w wysokości **67 964 770,23 PLN.** Dwie umowy zostały zawarte w okresie sprawozdawczym: jedna ze spółką Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna na realizację drugiego etapu inwestycji pn. „Rewitalizacja dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu poprzez budowę ultranowoczesnego zespołu hotelowo-apartamentowo-usługowego Baltic Park Molo” na kwotę z JESSICA 2 350 000 PLN, druga ze spółką Winston sp. z o.o. na inwestycję pn. „Projekt rewitalizacyjny ”Zespół handlowo-usługowy przy ul. Dąbrowskiego w Świnoujściu” na kwotę JESSICA 5 500 048 PLN.

Drugi z FROMów – Bank Zachodni WBK S.A od początku realizacji przedsięwzięcia zawarł łącznie **8 umów** z ostatecznymi beneficjentami na kwotę ze środków Inicjatywy JESSICA **81 493 642,04 PLN.**

Do końca okresu sprawozdawczego w trzynastu projektach środki zostały w 100% przekazane do ostatecznych beneficjentów. W pozostałych 5 projektach nie ma zagrożenia aby środki nie zostały w pełni wydatkowane. Szczegółowy wykaz wszystkich projektów według stanu na 30 czerwca 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13 Wykaz podpisanych umów na realizację projektów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA zgodnie ze stanem na 30.06.2015 r.

Lp.	FROM	Beneficjent	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu (PLN)	Wartość pożyczki JESSICA (PLN)	Data podpisania umowy	Poziom wypłaconych środków
1	BOŚ S.A.	Lech Investment Sp. z o.o.	Przebudowa, nadbudowa trzech kondygnacji oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na budynek usługowy z poradnią medycyny rodzinnej i specjalistycznej, wraz z pracownikami diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej, blokiem operacyjnym, apteką oraz oddziałem rehabilitacyjnym i oddziałem opieki długoterminowej.	11 065 928,87	5 000 000,00	30.10.2012	100%
2	BOŚ S.A.	Techagra Sp. z o.o.	Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego szpitala miejskiego w Świnoujściu na potrzeby Hotelu Wypoczynkowo- Konferencyjnego z usługami Medical SPA pn. „WEST BALTIC RESORT SPA & WELLNESS”.	21 722 969,07	4 028 000,00	28.12.2012	100%
3	BOŚ S.A.	Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Rewitalizacja zespołu kamienic z XIX w. i odtworzenie historycznej zabudowy Kamienia Pomorskiego poprzez utworzenie kwartału handlowo-usługowego w kwartale ulic Żwirki i Wigury - Żeromskiego – Obrońców Warszawy - Okrzei.	11 707 870,65	4 870 875,56	31.12.2012	87%
4	BOŚ S.A.	Zdrojowa Invest Spółka zo.o. Projekt 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna	Rewitalizacja dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu poprzez budowę ultranowoczesnego kompleksu hotelowo-usługowego Baltic Park Molo	201 507 830,00	25 000 000,00	25.04.2013	100%
5	BOŚ S.A.	Dom Inwest T. i E. Japtok Sp. Jawna	Budowa zespołu budynków hotelowo-pensjonatowych z bazą zabiegową i usługami towarzyszącymi przy ulicach: Trendowskiego, Cieszkowskiego i Słowackiego	43 189 097,00	12 000 000,00	16.05.2013	100%
6	BOŚ S.A.	Urząd Miasta Świnoujście	Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą ul. Kołłątaja dz. Nr 381, 385, 384, 275: obręb 0008 Świnoujście	4 095 093,12	2 452 598,67	18.02.2013	100%
7	BOŚ S.A.	Gmina Połczyn Zdrój	Przebudowa dawnego kina Goplana na Centrum Kultury w Połczynie Zdroju	5 317 410,00	3 240 000,00	01.07.2013	95%
8	BOŚ S.A.	Uzdrowisko Połczyn S.A.	Przebudowa i rozbudowa budynku bazy zabiegowej w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego "Borkowo", na działce nr 2/4 przy ul. Sobieskiego (Obr. 007) a także przebudowa części gastronomicznej w punkcie żywienia "Gryf" w Połczynie Zdroju.	5 567 205,98	3 523 248,00	8.07.2013	99%
9	BOŚ S.A.	Zdrojowa Invest Spółka zo.o. Projekt 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna	„Rewitalizacja dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu poprzez budowę ultranowoczesnego zespołu hotelowo-apartamentowo-usługowego Baltic Park Molo” cz. II	201 507 830,00	2 350 000,00	09.04.2015	100%

Lp.	FROM	Beneficjent	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu (PLN)	Wartość pożyczki JESSICA (PLN)	Data podpisania umowy	Poziom wypłaconych środków
10	BOŚ S.A.	Winston Sp. z o.o.	Projekt rewitalizacyjny "Zespół handlowo-usługowy przy ul. Dąbrowskiego w Świnoujściu"	83 697 365,88	5 500 048,00	14.05.2015	100%
11	BZ WBK	„Apis” Spółka Jawna Henryk Andrzej Fijałkowski, Piotr Bloch	Rewitalizacja funkcji przemysłowych terenów miejskich Szczecin-Skolwin poprzez budowę zakładu produkcji papieru/tekstury.	7 526 211,33	4 577 903,20	10.04.2013	100%
12	BZ WBK	CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.	Renowacja oraz adaptacja zabytkowego budynku STAREJ RZEŻNI mieszczącego się na Łasztowni pod działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną	12 377 944,49	7 777 232,62	10.04.2013	100%
13	BZ WBK	Przedsiębiorstwo Handlowe „SZACH” Krzysztof Dybowski	Rewitalizacja – rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Pogotowia i WKU na funkcję usługowo – handlowo – biurową położonego na działkach nr 285, 286 obręb 11 w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego 30-31	3 087 493,58	1 873 618,04	10.04.2013	100%
14	BZ WBK	„Gryf” Strojny Spółka Jawna	Przebudowa i rozbudowa części kwartału ulic Storrady - Świętosławy i Jana z Kolna w Szczecinie	36 392 321,97	19 323 795,79	7.06.2013	100%
15	BZ WBK	MARK INVEST Sp. z o.o.	Rewitalizacja budynku dawnego kina Kosmos na cele kulturowo-oświatowe oraz odtworzenie historycznej zabudowy pierzei ul. Wojska Polskiego poprzez wybudowanie energooszczędnego budynku biurowo-usługowo-naukowego wraz z zagospodarowaniem terenu	25 054 000,00	16 366 737,99	09.08.2013	94,6%
16	BZ WBK	BOOIM ALKON Sp. z o.o.	Rewitalizacja terenów postoczniovych w Szczecinie poprzez budowę budynku o funkcji biurowo-usługowo-handlowej	9 253 000,00	5 634 318,03	30.10.2013	100%
17	BZ WBK	Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa „MODEHPOLMO” Sp. z o.o.	Rewitalizacja terenu przemysłowego po dawnej fabryce POLMO	18 931 000,00	11 911 548,61	16.12.2013	100%
18	BZ WBK	Dana Invest Sp. z o.o.	Modernizacja i wykończenie budynku Stara Dana w Szczecinie z przeznaczeniem budynku na hotel	32 763 300,00	14 028 487,76	30.12.2013	62,2%
SUMA					149 458 412,27		

Źródło: Opracowanie własne


W okresie sprawozdawczym Bank Ochrony Środowiska SA poinformował Instytucję Zarządzającą, że w trakcie realizacji trzech inwestycji:

- Przebudowa dawnego kina Goplana na Centrum Kultury w Połczynie Zdroju,
- Przebudowa i rozbudowa budynku bazy zabiegowej w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego "Borkowo", a także przebudowa części gastronomicznej w punkcie żywienia "Gryf" w Połczynie Zdroju,
- Rewitalizacja zespołu kamienic z XIX w. i odtworzenie historycznej zabudowy Kamienia Pomorskiego poprzez utworzenie kwartału handlowo-usługowego w kwartale ulic Żwirki i Wigury – Żeromskiego;

pojawiały się oszczędności, które wraz z odsetkami na rachunku Banku powodują, że nadal do wykorzystania pozostaje kwota w wysokości 851 258,9 PLN.


Z uwagi na ponowne dysponowanie wolnymi środkami, FROM prowadzi aktualnie działania zmierzające do ponownego zakontraktowania środków. Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawione zostało na poniższym wykresie:

Wykres 22 Wykorzystanie alokacji przez BOŚ S.A. wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

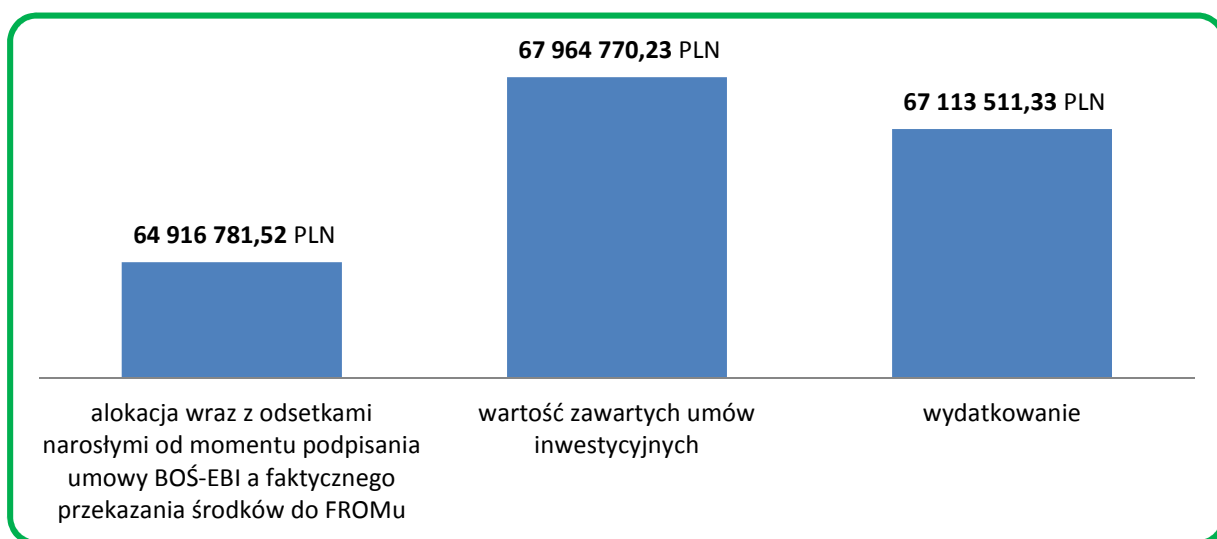

Źródło: opracowanie własne

Wykres 23 Wykorzystanie alokacji przez BZ WBK S.A. wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

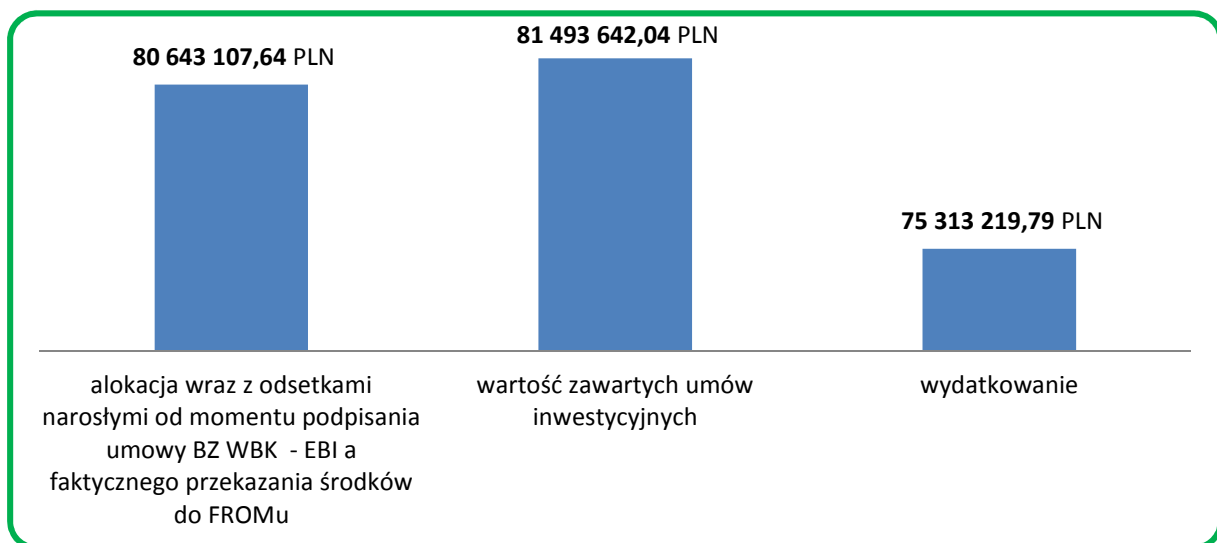

Źródło: opracowanie własne

Po rozwiązaniu umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, pojawiły się oszczędności z tytułu niewykorzystanych kosztów zarządzania w łącznej wysokości 310 413,72 PLN, z czego na działanie 5.5.2 przypada 139 475,66 PLN a na działanie 6.6.2 kwota 170 938,06 PLN. Środki te, zostaną przekazane FROMom w celu dalszego ich zainwestowania w projekty. W tym celu w czerwcu 2015 r. Bank Zachodni WBK SA i Województwo Zachodniopomorskie zawarło stosowny aneks, a w przypadku Banku Ochrony Środowiska SA aktualnie trwają prace nad sfinalizowaniem zawarcia aneksu. Ponadto, planowane jest aby w przyszłym okresie sprawozdawczym, zawrzeć z obecnymi FROMami aneksy umożliwiające, ponowne wykorzystywanie środków systematycznie zwracanych z obecnych projektów Inicjatywy JESSICA.

1.3.6 Zmiany wytycznych oraz procedur w ramach programu

W I półroczu 2015 r. nie dokonano zmian w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ.

Tabela 14 Informacja dotycząca zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WZ w I półroczu 2015 r.

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja 13.0)	Uchwała nr 98/15 z dnia 28.01.2015 r.	Dokonane zmiany: <ul style="list-style-type: none"> • Zmodyfikowano dane teleadresowe instytucji zaangażowanych w system kontroli i zarządzania RPO WZ 2007-2013 • zaktualizowano Wytyczne MliR • zaktualizowano datę przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego UM WZ • zmieniono informacje w zakresie zadań IZ RPO WZ wynikających z Regulaminu Organizacyjnego UM WZ (komórka odpowiedzialna za promocję RPO WZ została przeniesiona w struktury Biura Promocji w Gabiniecie Marszałka). • zostały zaktualizowane informacje z zakresu Inicjatywy Jeremie i Jessica
--	---------------------------------------	---

Źródło: opracowanie własne

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

Problemy występujące we wdrażaniu RPO WZ oraz podjęte środki zaradcze opisane są (jeśli dotyczy) w podziale na osie priorytetowe w punkcie 1.3.3 Postęp wdrażania RPO WZ 07-13 (punktu od 1.3.3.1 do 1.3.3.7) niniejszego sprawozdania.

Pozostałe działania podjęte przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ i Zachodniopomorski Komitet Monitorujący

Zmiany w RPO WZ na lata 2007-2013

1. Uchwała nr 82/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

W związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na poddziałanie 1.2.2 *Infrastruktura B+R* oraz poddziałanie 5.1.1 *Infrastruktura turystyki* przesunięto środki z kategorii interwencji 7 *Inwestowanie w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie nowych przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki badań i rozwoju technologicznego i przedsiębiorstwa* i 8 *Inne inwestycje w przedsiębiorstwa* do kategorii interwencji 2 *Infrastruktura związana z badaniami i rozwojem technologicznym (w tym instalacje, oprzyrządowanie i szybkie sieci komputerowe łączące ośrodki badawcze) oraz ośrodki kompetencji w zakresie konkretnych technologii* oraz z kategorii interwencji 57 *Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych* do kategorii interwencji 58 *Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego*.

26 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 2074/14 w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013 umieszczając tym samym na podstawowej Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 1.2.2 projekt Akademii Sztuki w Szczecinie Akademia ZMIENIA Szczecin – Centrum Przemysłów Kreatywnych.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1736/14 podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej, będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/5.2.2/2010/1 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

W związku z powyższym modyfikacji uległ Załącznik nr 3 *Indykatywny podział wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji* oraz załącznik nr 4 *Indykatywny podział środków EFRR na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w RPO WZ (w euro)* do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2. Uchwała nr 434/15 z dnia 26 marca 2015 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 434/15 przyjął zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W związku wyczerpaniem środków przeznaczonych na działanie 8.1. *Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ* oraz poddziałanie 7.3.1. *Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia* przesunięto 54 506 EUR z kategorii interwencji 86. do kategorii interwencji 85. oraz 280 117 EUR z 75. kategorii interwencji do 76. kategorii interwencji.

W związku z powyższym niezbędna była aktualizacja załącznika 3. *Indykatywny podział wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji*.

Zmiany URPO WZ:

1. Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 83/15 z 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia URPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 8.5)

W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

- a) przesunięto 2 071 782 EUR z poddziałania 1.1.3 *Inwestycje MSP w nowe technologie* oraz 835 209 EUR z poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa* do poddziałania 1.2.2 *Infrastruktura B+R*.

26 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 2074/14 w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013 umieszczając tym samym na podstawowej Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 1.2.2 projekt Akademii Sztuki w Szczecinie Akademia ZMIENIA Szczecin – Centrum Przemysłów Kreatywnych.

- b) przesunięto 34 870 EUR z poddziałania 5.1.1 *Infrastruktura turystyki* do poddziałania 5.2.2 *Zachowanie dziedzictwa kulturowego*. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1736/14 podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej, będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/5.2.2/2010/1 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

2. Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 298/15 z 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia URPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 8.6)

W ramach aktualizacji przedmiotowego dokumentu przesunięto 130 000 EUR z działania 3.2 *Rozwój systemów informatycznych i e-usług* do działania 3.3 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3*.

10 lutego 2015 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę 148/15 w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Wsparcie prac przygotowawczych do budowy projektu systemowego „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach działania 3.3 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W związku z powyższym, niezbędna była aktualizacja załącznika nr 1 do URPO WZ Indykatorywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing celem zapewnienia środków niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu.

3. Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 435/15 z 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia URPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 8.7)

W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

- a) przesunięto 54 506 EUR z działania 8.2. *Wsparcie działań informacyjno - promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ* do działania 8.1. *Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ*,
- b) przesunięto 280 117 EUR z poddziałania 7.1.2. *Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne* do poddziałania 7.3.1. *Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia*. W związku z powyższym niezbędna jest aktualizacja załącznika nr 1 do URPO WZ Indykatorywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing celem zapewnienia środków niezbędnych do realizacji przedmiotowych działań.

4. Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 483/15 z 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 8.7 URPO WZ na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o przeniesieniu projektu pn. *Przeprawa przez jezioro Jamno - budowa infrastruktury służącej turystyce wodnej* z listy rezerwowej na listę podstawową ILPI RPO WZ na lata 2007-2013.

5. uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 814/15 z 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 8.7 URPO WZ na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o umieszczeniu na Indykatorywnej Liście Projektów Indywidualnych projektu: *Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze.

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans. 	Data i miejsce:
	31 sierpnia 2015 r., Szczecin
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	<p>Marcin Szmyt</p> <p>Marek Orszewski</p>
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

System realizacji RPO WZ zakłada, że weryfikacja prawidłowości stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez beneficjentów Programu jest dokonywana na etapie wniosków o płatność oraz na etapie kontroli projektów.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WZ nie stwierdziła problemów o charakterze systemowym, związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

Jednocześnie w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem stwierdzono 25 nieprawidłowości dotyczących naruszeń prawa zamówień publicznych.

Naruszenia te dotyczyły:

- art. 7 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 1 poprzez nieuprawnioną zmianę istotnych warunków umowy z wykonawcą, które prowadziły do naruszenia zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców;
- art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 PZP poprzez dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;
- art. 24 ust. 1 i 2 poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę z przyczyn innych niż określone w przepisach;
- art. 25 ust. 1 PZP poprzez żądanie dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
- art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP poprzez niewezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów żądanych w zakresie wykazania niepodlegania wykluczeniu;
- art. 29 ust. 3 PZP poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu nazwy własnej oraz braku możliwości dopuszczenia rozwiązań równoważnych;
- art. 32 ust. 2 i 4 PZP poprzez dzielenie zamówienia na części w celu ominięcia wymogu stosowania ustawy PZP;
- art. 38 ust. 4a poprzez brak publikacji w BZP ogłoszenia o zmianie ogłoszenia wynikających z treści SIWZ a mających wpływ na treść ogłoszenia o zamówieniu;
- art. 41 pkt 7 i 9 w zw. z art. 22 ust. 3 oraz art. 36 ust. 1 pkt 5, poprzez brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu;
- art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych poprzez dokonanie wydatków z naruszeniem zasady wydatkowania środków w sposób celowy i oszczędny;
- art. 67 ust. 1 pkt 3 poprzez udzielenie zamówienia z wolnej ręki bez zachowania obligatoryjnych przesłanek wyboru tego trybu;
- art. 67 ust. 1 pkt 5 poprzez bezprawne udzielenie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe;
- art. 67 ust. 1 pkt 6 poprzez udzielenie zamówienia z wolnej ręki bez zaistnienia przesłanek zawartych w tym przepisie;
- art. 89 poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty najkorzystniejszej;
- art. 140 ust. 1 poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do treści oferty;
- art. 144 ust. 1 poprzez nieuprawnioną zmianę istotnych warunków umowy z wykonawcą.

Łączna kwota nieprawidłowości, wykrytych w okresie I półrocza 2015 r. dotyczących naruszeń prawa zamówień publicznych wyniosła 17 786 856,08 PLN (kwota odpowiadająca wydatkom kwalifikowanym).

Poniższa tabela przedstawia podział w/w kwoty ze względu na oś priorytetową, w ramach której nieprawidłowość została wykryta.

Tabela 15 Podział nieprawidłowości dot. naruszeń PZP wg osi priorytetowych w PLN

Oś priorytetowa	Wartość stwierdzonych nieprawidłowości	Część odpowiadająca wkładowi z EFRR
1 oś	3 545 623,07	2 012 243,52
2 oś	435 393,98	435 393,98
3 oś	0,00	0,00
4 oś	7 442 873,82	2 175 334,35
5 oś	3 022 526,56	1 490 640,40
6 oś	3 296 884,94	1 545 255,01
7 oś	43 553,71	21 776,86
Razem	17 786 856,08	7 680 644,12

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru Nieprawidłowości za rok 2015

IZ RPO WZ zgodnie z dokumentem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie „Wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE” za tego typu naruszenia nałożyła na Beneficjentów pomocy korektę finansową.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ posiadała i posiada umowę z zewnętrzną kancelarią prawną na świadczenie usług doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych. Kancelaria opracowała i aktualizuje *Podręcznik dla beneficjentów RPO WZ 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień*.

Kancelaria w ramach umowy, w minionych latach realizowała również szereg szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych. Celem tych działań było zwiększenie świadomości beneficjentów w zakresie poprawnego stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, a tym samym zmniejszenie liczby popełnianych nieprawidłowości w przeprowadzanych przez nich postępowaniach.

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

W ramach RPO WZ na lata 2007-2013 pomoc przyznano zgodnie z programami pomocowymi oraz na podstawie wytycznych i rozporządzeń, które umieszczone są w Tabeli 3 (*Załącznik 3 do niniejszego sprawozdania*) wraz z wielkością zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia Programu.

5. Informacja o realizacji dużych projektów

W ramach RPO WZ nie są realizowane duże projekty.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Alokacja przeznaczona na realizację 8 Osi priorytetowej wynosi **139 074 160,92 PLN** ze środków EFRR, co stanowi **3,89%** alokacji przeznaczonej na Program. Wszelkie wydatki w ramach Pomocy Technicznej RPO realizowane są w oparciu o Roczne Plany Działań (RPD) stanowiące wykaz i szczegółowy opis wydatków planowanych do realizacji. RPD przedstawiany jest Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego wraz z projektem uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

W Krajowym Systemie Informatycznym są wykazywane tylko decyzje, gdyż RPD nie odzwierciedla swą strukturą wniosków aplikacyjnych, które w ramach pozostałych priorytetów w RPO WZ wprowadzane są do KSI.

Postęp finansowy w ramach 8 osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu pokazuje poniższa tabela.

Tabela 16 Postęp finansowy w ramach 8 osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym (I półrocze 2015 r.) oraz od uruchomienia programu

	Okres sprawozdawczy			Od uruchomienia programu		
	Liczba	Wartość dofinansowania	Procent w stosunku do alokacji na oś	Liczba	Wartość dofinansowania	Procent w stosunku do alokacji na oś
Roczne plany działań	0	0,00	0,00%	29	138 888 450,84	99,87
Decyzje	0	0,00	0,00%	29	138 888 450,84	99,87
Wnioski o płatność	19	9 215 698,43	6,63%	243	115 143 230,99	82,79

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013, wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Ze środków z Pomocy Technicznej RPO WZ w I półroczu 2015 r. sfinansowane zostało:

- ✓ Wynagrodzenie pracowników IZ RPO WZ (Liczba pracowników (stan na dzień 30/06/2015) –200 osób w tym: 136 kobiety, 64 mężczyźni);
- ✓ Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, którzy wykonują zadania związane z realizacją wdrażania Programu;
- ✓ Opłaty za najem powierzchni biurowej wraz z mediami (koszty związane z adaptacją i utrzymaniem)
- ✓ Rozwój i doskonalenie zatrudnionych kadr poprzez szkolenia, kursy, w tym specjalistyczne szkolenia, kursy językowe, kursy specjalistyczne podejmowane indywidualnie, studia podyplomowe itp.;
- ✓ Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników (w tym: udział w szkoleniach, konferencjach, koszty związane z wyjazdami na kontrole projektów na miejscu ich realizacji, wizyty monitorujące itp.);
- ✓ Zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych;
- ✓ zakup nośników promocyjnych typu winder
- ✓ Zakup sprzętu i wyposażenia tj. zakup akcesoriów komputerowych, mebli, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, papieru, tonerów, pieczętek imiennych oraz literatury fachowej itp.;
- ✓ organizacja dwóch posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020 i jednego posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego RPO WZ 2007-2013;
- ✓ organizacja akcji promujących RPO WZ, w tym m.in. promocja RPO WZ podczas Biegu na 5 i 10 km z okazji Święta Konstytucji 3 maja; w trakcie Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Szczecinie; podczas Regat Polish Match Tour; podczas Dni Narodowego Centrum Nauki;
- ✓ organizacja Gali podsumowującej perspektywę finansową 2007-2013 i inaugurującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
- ✓ Usługi prawne i doradcze;
- ✓ Wsparcie eksperckie realizowane przez niezależnych ekspertów zatrudnionych w ramach Komisji Oceniających Projekty. Eksperci dokonują weryfikacji projektów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania lub projektów, które uzyskały dofinansowanie, a które na podstawie wprowadzonych zmian lub pojawienia się nowych okoliczności przy realizacji projektu wymagają ponownej oceny; eksperci oceniają projekty pod kątem wpływu projektu na środowisko, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, oceny ekonomiczno-finansowej (lub merytoryczno-finansowej) oraz merytoryczno-technicznej w różnych dziedzinach w zależności od typu przedsięwzięcia; rolą ekspertów jest zapewnienie niezależnej i profesjonalnej oceny projektów, gwarantując tym samym bezstronność oraz wybór najbardziej zasadnych projektów do dofinansowania ze środków unijnych;
- ✓ Zakup dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem IZ RPO WZ oraz z realizacją zadań związanych z wdrażaniem RPO WZ w tym zakup usług remontowych tj. naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, kserokopiarek oraz innych urządzeń zakupionych na potrzeby funkcjonowania IZ RPO WZ;
- ✓ Koszty ponoszone w związku z podejmowaniem działań mających na celu odzyskanie wypłaconych środków pieniężnych od Beneficjentów Programu. (koszty sądowe, komornicze itp.). W związku z faktem, iż część środków przekazanych przez IZ RPO WZ na realizację projektów zostało wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur bądź zostały pobrane nienależnie lub

w nadmiernej wysokości oraz mając na uwadze, iż do zadań IZ RPO WZ należy m.in. w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 15 i 15 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 tekst jednolity) ustalanie i nakładanie korekt finansowych, a także odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 t.j. ze zm.), IZ RPO WZ na bieżąco podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych kwot.

Wydatki wymienione wyżej przekładają się na wartość projektów wykazanych w poniższej tabeli.

Tabela 17 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE)
1.	Szkolenia (w tym dla pracowników, dla beneficjentów, system motywacyjny)	25	2 996 913,07
2.	Promocja i informacja	10	10 230 060,45
3.	Zatrudnienie	18	86 869 372,84
4.	Sprzęt komputerowy	16	2 098 389,52
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	18	14 850 155,22
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	9	4 778 300,47
7.	Ewaluacje	8	3 985 979,88
8.	Kontrola/ audyt	0	0,00
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	0	0,00
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	9	158 504,54
11.	Inne (m.in. rozbudowa LSI, delegacje krajowe i zagraniczne oraz wyjazdy studyjne pracowników, tłumaczenia, usługi doradcze, sprzęt telekomunikacyjny)	27	12 920 774,85
12.	Razem	29	138 888 450,84

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wydanych decyzji o dofinansowanie zamieszczonych w KSI SIMIK 07-13.

Procesy zarządzania i wdrażania RPO są w 100% wspierane finansowo ze środków pomocy technicznej RPO WZ na lata 2007-2013. Zatem wszystkie działania IZ RPO WZ, od zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji pracowników, poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy i biurowy, a na doradztwie i działaniach promocyjno-informacyjnych kończąc, są możliwe dzięki środkom z EFRR w ramach osi 8 RPO WZ na lata 2007-2013.

W I półroczu 2015 r. wydatki poniesione w ramach poszczególnych kategorii nie przekraczają kwot na nie zarezerwowanych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. roku nie stwierdzono problemów dotyczących wykorzystania środków przeznaczonych na pomoc techniczną.

Postęp rzeczowy

Oś priorytetowa 8 realizowana jest poprzez wskaźniki produktu i rezultatu w ramach działań 8.1 oraz 8.2. W ramach 8 osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym został zatwierdzony jeden wniosek o płatność końcową w ramach działania 8.2 oraz zaktualizowane zostały 3 decyzje o dofinansowanie (2. w ramach działania 8.2 oraz 1. w ramach działania 8.1).

Wskaźniki produktu:

- **Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu - wyłącznie umowy o pracę** (8.1). Wskaźnik w I półroczu 2015 r. osiągnął wartość 2200 etatomiesięcy. W związku z tym, iż w dokumentach programowych przedmiotowy wskaźnik wykazywany jest w szt., wartość powyższa podzielona została przez 12, co w rezultacie ukształtowało wskaźnik na poziomie 183,33 szt. Wskaźnik został osiągnięty w stosunku do wartości docelowej określonej na 2015 r. (68 szt.) w 2669,60%. Przewiduje się w dalszym ciągu jego wzrost do 200 szt. (tj.: ponad 290 % w stosunku do wartości docelowej określonej w dokumentach programowych dla roku 2015). Wysoka wartość osiągniętego wskaźnika wynika z rosnących potrzeb zatrudnienia w trakcie wdrażania programu.
- **Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych itp.** (8.1, 8.2) Wartość wskaźnika w I półroczu 2015 r. osiągnęła **951 szt.** co stanowi 95,10 % w stosunku do wartości docelowej (1 000 szt.) określonej na 2015 r. w dokumentach programowych. Do końca 2015 r., na podstawie do tej pory ustanowionych decyzji, przewiduje się wzrost realizacji wskaźnika do 1 270 szt. (tj.: 127% w stosunku do wartości docelowej określonej w dokumentach programowych dla roku 2015).
 - W ramach poddziałania 8.1 wartość zrealizowanego wskaźnika to **596 szt.** na 800 planowanych do osiągnięcia w 2015 r. Na wartość ww. wskaźnika składa się 22 posiedzenia ZKM, 207 szkoleń dla pracowników, 261 kursów językowych oraz 106 wykupionych studiów podyplomowych oraz).
 - W ramach poddziałania 8.2 wartość zrealizowanego wskaźnika to **355 szt.** na 200 planowanych do osiągnięcia w roku 2015. Na wartość ww. wskaźnika składa się 308 szkoleń dla beneficjentów, 11 posiedzeń ZGSE, 36 konferencji i seminariów.
- **Liczba zakupionych zestawów komputerowych - laptopy, serwery, komputery** (8.1) Wskaźnik jest osiągnięty na poziomie 119 szt. Na podstawie do tej pory uchwalonych decyzji, przewiduje się wzrost zakupu zestawów komputerowych do 165 szt. (tj.: 110% w stosunku do wartości docelowej określonej w dokumentach programowych dla roku 2015).
- **Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych** (8.2) Wartość przedmiotowego wskaźnika w I półroczu 2015 r. kształtuje się na poziomie **129** szt. W stosunku do wartości docelowej planowanej do osiągnięcia w roku 2015 - (70 szt.) zrealizowany jest on w 184,29%. Tak wysoka realizacja wynika z faktu, iż w ramach tego wskaźnika agregowane są opinie prawne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko wykonywane przez zewnętrzne kancelarie prawne.

Wskaźniki rezultatu:

- **Liczba przeszkolonych potencjalnych beneficjentów** (8.2) Wartość przedmiotowego wskaźnika w I półroczu 2015 r. (5736 osób) w stosunku do wartości docelowej określonej na 2015 r. [w dokumentach programowych (3000 osób) została zrealizowana w prawie 191,20%. W związku z powyższym zakładana wartość docelowa została już zrealizowana. Tak wysoka realizacja wynika z faktu, iż było duże zapotrzebowanie na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Przedmiotowe informacje zawarte są w *Załączniku nr 4 oraz 4A* do niniejszego sprawozdania.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

<p>Dane osoby sporządzającej sprawozdanie</p>	<p>Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:</p>
	<p>Alicja Ostaszewska Danuta Gureczna Magdalena Boć <u>Promocja i informacja:</u> Magdalena Mętel</p>
	<p>Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):</p>
	<p>Wydział Zarządzania Strategicznego Biuro ds. Inicjatyw Wspólnotowych i Monitoringu: aostaszewska@wzp.pl nr tel. 091/44 11 630 dgureczna@wzp.pl nr tel. 091/44 11 188 mboc@wzp.pl nr tel. 091/44 11 681 <u>Promocja i informacja:</u> mmetel@wzp.pl nr tel. 091/44 19 138</p>
<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą</p>	<p>Data i miejsce:</p>
	<p>1 października 2015 r., Szczecin</p>
	<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</p>
	<p>Marcin Szmyt Marek Orszewski</p>
	<p>Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):</p>
	<p>Tel. 091/44 11 171 E – mail: wzs@wzp.pl Fax. 091/48 81 015</p>
<p>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</p>	
<p>.....</p>	

SPIS TABEL

Tabela 1 Alokacja RPO WZ w podziale na Osie Priorytetowe w PLN	4
Tabela 2 Ogłoszone nabory w trybie konkursowym w podziale na osie priorytetowe	4
Tabela 3 Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 1-8	6
Tabela 4 Postęp finansowy dla osi 1 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)	11
Tabela 5 Postęp finansowy dla osi 2 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)	18
Tabela 6 Postęp finansowy dla osi 3 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)	23
Tabela 7 Postęp finansowy dla osi 4 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)	28
Tabela 8 Postęp finansowy dla osi 5 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)	32
Tabela 9 Postęp finansowy dla osi 6 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)	37
Tabela 10 Postęp finansowy dla osi 7 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2015 r. (PLN)	42
Tabela 11 Liczba wspartych przedsiębiorstw w podziale na ich wielkość	46
Tabela 12 Posiedzenia Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE przeprowadzone w I półroczu 2015 r.	49
Tabela 13 Wykaz podpisanych umów na realizację projektów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA zgodnie ze stanem na 30.06.2015 r.	51
Tabela 14 Informacja dotycząca zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WZ w I półroczu 2015 r.	54
Tabela 15 Podział nieprawidłowości dot. naruszeń PZP wg osi priorytetowych w PLN	58
Tabela 16 Postęp finansowy w ramach 8 osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym (I półrocze 2015 r.) oraz od uruchomienia programu	59
Tabela 17 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie).....	60

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 Procentowy podział podpisanych umów w ramach poszczególnych osi RPO WZ według wartości dofinansowania z EFRR od uruchomienia Programu	5
Wykres 2 Wartość dofinansowania umów podpisanych w ramach RPO WZ w I półroczu 2015 r. w podziale na poszczególne osie priorytetowe (środki EFRR w PLN).....	5
Wykres 3 Ujęcie procentowe wartości wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR + BP; od uruchomienia Programu)	7
Wykres 4 Ujęcie procentowe wartości podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu)	7
Wykres 5 Wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie – przyrost od poprzedniego okresu sprawozdawczego w porównaniu z alokacją przeznaczoną na Program (dofinansowanie z EFRR w PLN).....	8
Wykres 6 Ujęcie procentowe wartości wykazanych przez beneficjentów wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu) .	8
Wykres 7 Ujęcie procentowe wartości wydatków wykazanych przez IŻ RPO WZ w deklaracjach do IC w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu).....	9
Wykres 8 Ujęcie procentowe wartości płatności EFRR przekazywanej na rzecz beneficjentów w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu).....	9
Wykres 9 Ujęcie procentowe wartości zakończonych projektów w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu)	10
Wykres 10 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IŻ w deklaracjach do IC w ramach osi 1 priorytetowej od początku realizacji Programu (mln PLN).....	12
Wykres 11 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IŻ w deklaracjach do IC w ramach osi 2 priorytetowej od początku realizacji Programu (mln PLN).....	18
Wykres 12 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IŻ w deklaracjach do IC w ramach osi 3 priorytetowej od początku realizacji Programu (mln PLN).....	23
Wykres 13 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IŻ w deklaracjach do IC w ramach osi 4 priorytetowej od początku realizacji Programu (mln PLN).....	28
Wykres 14 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IŻ w deklaracjach do IC w ramach osi 5 priorytetowej od początku realizacji Programu (mln PLN).....	33
Wykres 15 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IŻ w deklaracjach do IC w ramach osi 6 priorytetowej od początku realizacji Programu (mln PLN).....	38
Wykres 16 Wartość dofinansowania złożonych wniosków po ocenie formalnej, wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazywane przez IŻ w deklaracjach do IC w ramach osi 7 priorytetowej od początku realizacji Programu (mln PLN).....	43

Wykres 17 Wartość podpisanych Umów Operacyjnych z pośrednikami finansowymi w podziale na typy produktów	46
Wykres 18 Liczba wspartych MŚP w podziale na produkty z wyszczególnieniem start-up.....	47
Wykres 19 Dźwignia finansowa produktu Reporęczenie	47
Wykres 20 Poziom wydatkowania środków Inicjatywy JEREMIE kumulatywnie w poszczególnych latach w okresie od 2010 r. do końca okresu sprawozdawczego	48
Wykres 21 Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim w poszczególnych latach w okresie od 2010 r. do końca okresu sprawozdawczego	48
Wykres 22 Wykorzystanie alokacji przez BOŚ S.A. wg stanu na 30 czerwca 2015 r.....	53
Wykres 23 Wykorzystanie alokacji przez BZ WBK S.A. wg stanu na 30 czerwca 2015 r.	53

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik I Tabela 1 Postęp rzeczowy programu operacyjnego	
Załącznik II Tabela finansowa 1 Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2014 r. oraz Tabela finansowa 3 Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE	
Załącznik III Tabela 3 Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy	
Załącznik IV Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji	
Załącznik IVA Tabela 2 Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (informacja i promocja)	
